

거버넌스 구조와 RACI 초안

Governance Structure & RACI

온담F&B 특강 워크북 · Day1
산출물 4/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
거버넌스 구조와 RACI 초안	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v1.0 / G0 2026-01-05	P1 PM	정미란 CFO (현장 항목 12 승인자)

1. 의사결정체 (Decision Bodies)

이사회·스폰서·운영위·CCB·계약상 협의체·기준선 재확인 절차까지 모두. 구성은 실명, 정족수와 반대의견 기록 방식, 무엇을 결정하는가. 사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계를 한 줄로.


의사결정체	구성(실명)	의장	주기	정족수 · 의결	결정 권한 (무엇을 결정하는가)	기록
프로그램 이사회	김선호 CEO, 정미란 CFO, 오정근·박세연·한동석·나영선 본부장, 사 외이사 1	김선호	분기 1회 + 게이트(G0~G5)	과반 출석, 의장 결정	게이트 판정(Go/Hold/재정의), 관리예비비 24억 집행, 프로그램 재정의·중단	이사회 의사록, 게이트 판정서
프로그램 스폰서 (Executive)	정미란	—	상시 (주간 1:1)	단독	P1 예산 총 간 이동, 프로젝트 계층 허용범위 초과 승인, 관리예비비 12억(P1 유보분) 집행, 예외 보고 결정(10영업일), 중단 부의	결재 문서, 예외 보고 회신
프로그램 운영위	스폰서 + 프로그램 PMO장 + 5개 프로젝트 PM	정미란	월 1회	과반	프로젝트 간 일정·자원 조정, 게이트 준비 상태 확인, 프로그램 리스크	운영위 회의록
변경통제위원회 (CCB)	정미란(위원장), 박세연, 오정근, 나영선, 최영주, 프로그램 PMO장, 재경팀장 (7인)	정미란	월 1회 셋째 목요일 + 임시	정족수 5, 반대의견 실명 기재 의무	사내 변경 승인(범위·원가·일정 기준선 변경), 컨틴전시 집행 사후 심의, 요구사항 베이스라인 동결 확인	CCB 의결서
변경협의체 (계약)	발주사 3(P1 PM, PMO장, 강현도 구매팀장) + 수행사 3(이재현 PM 외 2)	공동	격주 수요일 14:00	양측 합의	변경대가 산정, FP 재산정 트리거 판정, 발주사 결정 지연 대기 비용 판정	변경협의 합의서
기준선 재확인	P1 PM, 이재현 PM, 발주사 형상관리 담당	—	분기 1회 또는 FP 누적 변동 ±3% 초과 시	3인 서명	FP 기준선 확인서, RTM 대조 결과, 미해결 변경 목록 3종 확정	기준선 확인서
운영 CAB (이관 후)	박준영 서비스운영팀장 주관	박준영	주 1회 수요일	—	이관 후 운영 변경	P5 소관, G4 이후

사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계 (어느 쪽이 선행하는가, 무엇 없이 무엇을 하지 않는가)

변경 요청은 ① 변경협의체에서 변경대가·FP 영향 합의 → ② 허용범위 내면 P1 PM 승인·CCB 사후 보고, 초과면 CCB 승인 → ③ 계약 변경 서면. 변경협의체 합의 없이 CCB에 올리지 않고, CCB 승인 없이 계약 변경을 서명하지 않는다.

2. 3역할과 핵심 직위 (Executive / Senior User / Senior Supplier / PM / PMO)

PRINCE2 3역할의 실명과 책무 한 줄, PM·PMO·수행사 PM의 위치를 조직도와 표로. 검임과 이해 충돌을 기록한다. Senior Supplier가 발주사 IT본부장인지 수행사 PM인지 분명히 할 것(수행사 PM은 Senior Supplier 아래의 공급자).

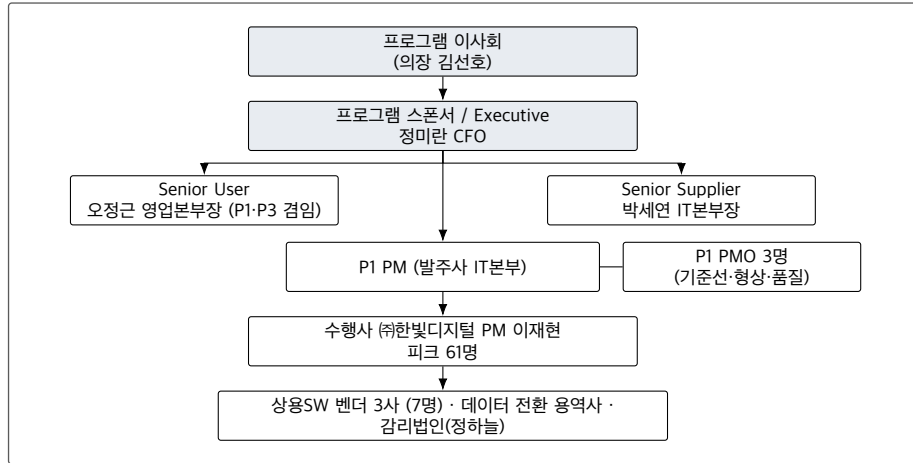

역할	직책·실명	책무 한 줄	검임·이해충돌
Executive	정미란 CFO	사업 정당성 유지(66% 손익분기 감시), 허용 범위 초과 승인, 관리예비비	CCB 위원장 검임 — 변경 승인과 예산 통제 가 한 사람에게 집중되나 프로그램 규정상 의 도된 구조
Senior User	오정근 영업본부장	요구사항(StRS 214건) 대표, 편익 118억 중 5개 항목 실현 책임, 가맹 협상	P3 Senior User 검임 — 교육과 시스템의 정합에 유리, 가맹 재계약을 KPI와 P1 배포 범위 사이의 이해 충돌은 기록
Senior Supplier	박세연 IT본부장	아키텍처·인터페이스 최종 승인, 발주사 인력 14명 배정, 소스·형상 인수	OD-POS 원 설계자 — 레거시 평가에 대한 이해 충돌 가능성 기록, 데이터 전환 정보 판정에는 감리 확인 병행
P1 PM	발주사 IT본부	허용범위 내 일상 관리, 예외 보고, 컨틴전시 10.2억 집행	—
P1 PMO (3명)	기준선·형상·품질 담당	FP 기준선, RTM, 형상관리, 감리 대응	—
수행사 PM	이재현	작업패키지 계층 허용범위 내 관리, 61명 자원	손익률 6.5% 목표 — 변경대가 유인 기록

3. 에스컬레이션 경로와 시한 (Escalation Path & Timelines)

사다리 3~4단계(작업패키지 → PM → 스폰서 → 프로그램 이사회)와 단계별 제출·응답 시한(영업일). 결정 지연이 변경대가 대상인 계약이면 발주사 결정 시한을 명시. 수행사의 경로와 통제 밖 협상(3PL·가맹·벤더)의 경로도 적는다. “필요 시 보고”는 경로가 아니다.

단계	누가 → 누구에게	조건	제출 시한	응답 시한
1	수행사 PM → P1 PM	작업패키지 허용범위(원가 +2%, 일정 +5영업일) 초과 예상	인지 후 2영업일	3영업일
2	P1 PM → 스폰서 정미란	프로젝트 허용범위 초과 예상 (예외 보고: 원인·영향·대안 3·권고)	인지 후 5영업일	10영업일 (초과 시 프로그램 이사회 자동 부의)
3	스폰서 → 프로그램 이사회	프로그램 허용범위 초과, 관리예비비 24억, 중단	즉시	임시 소집 10영업일
병행	수행사 → 변경협의체	발주사 결정 요청에 P1이 5영업일 내 미응답	6영업일째	다음 변경협의체에서 대기 비용 판정
병행	P1 PM → 소관 임원	통제 밖 협상 교착(3PL: 한동석 / 가맹: 오정근 / 앱 벤더: 박세연)	교착 인지 후 5영업일	소관 임원이 스폰서에 보고

4. 허용범위 위임 격자 (Tolerance Delegation — 초안, Day2 확정)

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지=수행사 PM / 프로젝트=PM / 프로그램=스폰서). 빈 칸은 “미정(Day2)”. 허용범위는 비즈니스 케이스의 편익 민감도(손익분기 실현률)에서 역산한다 — 모든 프로젝트에 같은 ±10%를 쓰지 말 것. 사내 전결과 충돌하는 칸에 주석.

축	작업패키지 (수행사 PM)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	사내 규정과의 관계
편익	—	-5%p	-10%p	판정 권한 재무본부
원가	+2%	+6% (10.08억)	+12%	5억 초과 단일 건은 CFO 병행 결재, 5,000만 원 이상 내부통제 지침
일정	+5영업일	+15영업일	+30영업일	—
품질	결함밀도 0.13건/FP	0.4건/FP	0.8건/FP	감리 지적 시정조치는 허용범위와 무관하게 이행
범위	±1%	±3% (±35건)	±6%	변경협의체 합의 필요
지속가능성	0 (안전·환경 사고)	0	0	—
리스크	EMV 2.7억	EMV 8억	EMV 16억	이사회 부의 금액

5. RACI 매트릭스 — 착수·기획 단계 주요 결정과 산출물

행 = 결정과 산출물(15~25행, 활동이 아니다), 열 = 역할·개인(8~12열). **행마다 A는 정확히 한 명**. 결정 행(승인·판정)과 산출물 행(작성·인수)을 구분하고, 통제 밖 결정(3PL 협상, 가맹 배포 범위, P2 규격)의 A가 프로젝트 밖의 임원임을 드러낸다. 표 아래에 검사를 적는다.

열: 정미란(Exec) / 오정근(SU) / 박세연(SS) / 한동석 / 최영주 / 박준영 / P1 PM / 이재현 / PMO장(프로그램) / CCB / 이사회 / 재경팀장

#	결정 · 산출물	정미란	오정근	박세연	한동석	최영주	박준영	P1 PM	이재현	PMO장	CCB	이사회	재경
1	비즈니스 케이스 요약 v1.0 확정 (G1)	A	C	C	C	I	I	R	I	C	I	I	C
2	프로젝트 헌장 승인	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I	I
3	3역할 실명 지명	C	I	I	I	I	I	R	I	C	I	A	I
4	편익 항목별 책임자·분모 확정	A	R	C	R	I	I	R	I	C	I	I	C
5	요구사항 베이스라인 v1.0 확정 (StRS 214)	I	A	C	C	C	C	R	R	I	I	I	I
6	월 요구사항 동결 (매월 마지막 수)	I	C	C	I	I	I	A	R	I	I	I	I
7	아키텍처·인터페이스 설계 승인	I	C	A	C	C	C	R	R	I	I	I	I
8	규제 요건 해석 의견 (142개 처리항목·망분리)	I	I	C	I	A	I	R	C	I	I	I	I
9	P2 설비 인터페이스 규격 전달 (T0 전)	I	I	R	C	I	I	R	C	A	I	I	I
10	3PL WMS 연동 계약 변경 협상	I	I	C	A	C	I	R(명세)	I	I	I	I	I
11	가맹 SW 배포 범위·단말 비용 부담 결정	C	A	C	I	C	I	R(옵션)	I	I	C	I	C
12	자사앱 소스 인수 조항 계약 변경	I	C	A	I	C	I	R	I	I	I	I	I
13	온담푸드시스템 별도 법인 연동 계약 구조	C	I	R	I	A	I	R	I	I	I	I	I
14	원가·일정 기준선 확정 (G1)	C	C	C	I	I	I	R	R	R	I	A	C
15	FP 기준선 확인서 서명	I	I	I	I	I	I	A	R	I	I	I	I
16	허용범위 내 변경 승인	I	C	C	I	I	I	A	R	I	I(사후)	I	I
17	허용범위 초과 변경 승인	R	C	C	C	C	I	R	C	C	A	I	C
18	변경대가·FP 재산정 트리거 판정	I	I	I	I	I	I	A	R	I	I	I	I
19	컨틴전시 10.2억 집행 (건별)	I	I	C	I	I	I	A	I	I	I(월 보고)	I	C
20	관리예비비 12억 집행	A	I	I	I	I	I	R	I	C	I	I	C
21	예외 보고 결정 (허용범위 초과 예상)	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I	C
22	서비스 인수 기준(SAC) 초안 합의 (G1)	I	C	C	I	I	A	R	C	I	I	I	I

#	결정 · 산출물	정미란	오정근	박세연	한동석	최영주	박준영	P1 PM	이재현	PMO장	CCB	이사회	재경
23	데이터 전환 정보 판정 (G2)	C	C	R	C	I	I	R	R	C	I	A	I
24	컷오버 go/no-go (G3)	A	C	C	C	C	C	R	R	C	I	I	I
25	조기 종료 부의·손실 확정	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I(결정)	R
26	이해관계자 등록부·리스크 등록부 갱신 (게이트마다)	I	C	C	C	C	C	A	C	I	I	I	I

검산 — A 없는 행 [], A 둘 이상인 행 [], PM이 A인 행 [n / 전체]. 나머지 행의 A가 어디에 있는지가 “PM 권한”의 실제 크기다.

A 없는 행 0, A 둘 이상인 행 0. P1 PM이 A인 행 8 / 26 — 나머지 18행의 A는 P1 밖에 있다. 이것이 현장 항목 12의 “PM 권한”의 실제 크기다.
