

PM 트랙 Day 1

프로젝트 매니지먼트 일반론과 착수

- ▶ 프로젝트 매니지먼트 4일 특강 · 1일차
- ▶ 사례 회사: (주)온담F&B홀딩스 ONE ONDAM 프로그램 **P1** 「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」
- ▶ 승인 예산 **168억 원** · 2026-01-05 ~ 2027-05-29 · 하이브리드(스프린트 36회 + 게이트 G0~G5)

오늘의 세 질문 — 이것은 무엇인가 / 무엇을 따를 것인가 / 어떻게 시작할 것인가

오전 — 이론 (제1~2장)

- ▶ **0교시** 20분 · 사례 브리핑 — 온담F&B와 P1, 책받침 한 장
- ▶ **1교시** 80분 · 용어 정리 · 프로젝트란 무엇인가 · 왜 실패하는가 — 제1장
- ▶ **2교시** 90분 · 표준의 지형 — PMBOK 6→7→8, PRINCE2, ISO, 테일러링 — 제2장

오후 — 착수 이론과 실습이 번갈아

- ▶ **3교시** 90분 · 착수 이론 — BC · 편익 소유 · 현장 · 이해관계자 — 제3장 전반
- ▶ **4교시** 90분 · **실습 ①** BC 요약 + 현장 — 워크북 §1~2
- ▶ **5교시** 75분 · 거버넌스 · 권한 없는 PM · 프리모템 · 분야별 착수 — 제3장 후반
- ▶ **6교시** 75분 · **실습 ②** 등록부 · RACI · 프리모템 — 워크북 §3~5
- ▶ **마무리** 20분 · 학술 배경 · 읽을 자료 · Day2 예고 — 제4~5장

오늘 만든 다섯 산출물이 Day2 계획 산출물의 입력이 된다

오전 이론

1. 프로젝트·프로그램·운영을 **돈과 권한의 언어**로 구분한다
2. CHAOS·Flyvbjerg 수치를 **왜 그대로 인용하면 안 되는지** 말한다
3. PMBOK 6→7→8 계보 — 사내 표준을 **재매핑 대장** 네 칸으로
4. 테일러링 기준 = **되돌림 비용** — P1과 P2에 다른 처방

오후 실습

5. BC 결함을 목록화하고 **편익 오너가 PM이 아닌 이유**를 설명한다
6. 현장 15항목 · 이해관계자 3속성 7유형 · RACI · 프리모템을 온담 P1으로 **직접 작성**한다

자격시험 수업이 아니다 — 기초는 다루지 않고, 판단을 다룬다

0교시 (20분) — 사례 브리핑: 온담F&B홀 딩스와 P1

사례를 어떻게 쓰는가 — 통독하지 않는다

- ▶ 사례 문서(25쪽)는 **사전**이다 — 소설처럼 읽고 외우는 문서가 아니다
- ▶ 교재의 온담 단락마다 ■ **사례 사실** 줄이 그 단락이 쓰는 사실과 출처(§·숫자 표 ID)를 먼저 준다
- ▶ 워크북의 산출물마다 ◆ **실습 입력 카드**가 필요한 정보 §·앞 산출물·추가 조건을 모아 준다
- ▶ 책상 위에는 **사례 한 장**(책받침) — 타임라인·인물 13명·숫자 12
- ▶ 오늘 20분 동안 그 한 장을 같이 읽는다 — 회사 / 왜 P1인가 / 날짜 / 사람

사례를 다 읽어 왔는지 묻지 않는다 — 다음 네 장을 보면 오늘 수업을 따라올 수 있다

규모와 돈

- ▶ 카페·베이커리·델리 3브랜드 **615개 매장**(직영 227 / 가맹 388) + B2B 원료 유통
- ▶ 2025 매출 **8,740억**, 영업이익 312억(**3.6%**) — 이익이 얇다
- ▶ 부채비율 **187%**, 사모펀드 350억 → **2027년 IPO** 조항

왜 P1인가

- ▶ 매장 시스템 **OD-POS 2.1**(2011 자체개발) 수명 종료, 원 개발자 1명 재직
- ▶ 인터페이스 47본 중 **13본 설계문서 없음**, 재고를 실시간으로 못 본다
- ▶ 두 번의 실패 — **2019 스마트오더 34억 중단**, **2022 WMS 12억 축소**

돈이 얇고 시계가 빠른 회사가 세 번째 시도를 한다 — 이사회는 "세 번째 실패는 없다"를 문서로 걸었다

범위 — 다섯 산출물


- ▶ ① 클라우드 POS·매장 운영 ② 주문 허브 ③ 통합 재고 ④ 가맹 발주 포털 ⑤ 통합 계층·데이터 전환(1,842 테이블·7.4TB)
- ▶ **제외:** SAP ECC 교체 · 물류 설비(P2) · 교육(P3) · 규제 등록(P4) · 운영 조직(P5)

돈과 시간

- ▶ 예산 **3총** — 승인 168.0 / 집행 한도 156.0 / 계획 원가 145.8
- ▶ SI 계약 68.2억 = **FP 12,400 × 55만 원** 고정가, 수행사 한빛디지털
- ▶ 2026-01-05 → 2027-05-29, 스프린트 36회 + 게이트 G0~G5 — **하이브리드**

P1은 프로그램 ONE ONDAM(428억, P1~P5)의 척추다 — 편익 214억은 P1 혼자 만들지 않는다

P1 타임라인 — 움직일 수 없는 날짜 셋

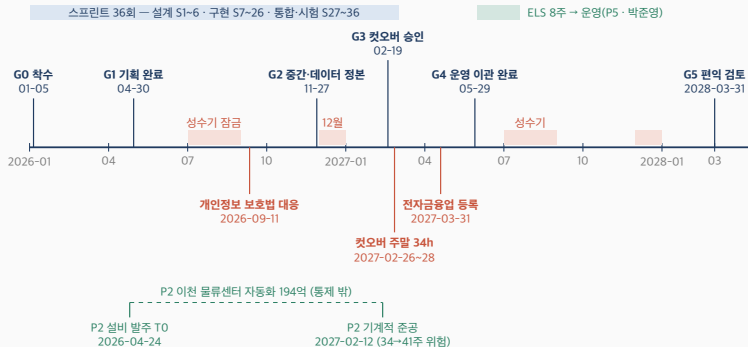

사례 \$3.4-\$3.5-\$5.4. 붉은색 = 협상 불가능한 외부 기한(컷오버 창은 IPO 2027-3Q 예비심사에서 역산).

2026-09-11 · 2027-02-26~28 · 2027-03-31 — 이 셋은 협상 대상이 아니다. 컷오버 창은 IPO 예비심사에서 거꾸로 센 날짜다

오늘 이름을 알아야 할 여덟

- ▶ **김선호** 대표 — 이사회 의장, "일정이 먼저다" · **정미란** CFO — 스폰서·CCB 위원장, "148억으로"
- ▶ **오정근** 영업본부장 — Senior User, "성수기 절대 금지" · **박세연** IT본부장 — Senior Supplier, OD-POS 원 설계자
- ▶ **한동석** 물류본부장 — 3PL 계약 소관 · **박준영** 서비스 운영팀장 — SAC 판정권
- ▶ **서정필** 가맹점주협의회회장 — 388점 서면 동의 · **이재현** 수행사 PM — "대기·추가는 변경대가"

세 개의 시계 (사례 §6.3)

- ▶ **대표** — IPO: 2027-3Q 예비심사 전 안정 가동 → "더 앞당기라"
- ▶ **CFO** — 부채비율 187 → 160%: 1차연도 176억을 **148억**으로
- ▶ **수행사·감리** — FP 12,400 안에서 손익률 6.5%: 당기면 변경대가, 줄이면 재협상

세 시계는 맞지 않는다 — PM이 맞추는 게 아니라 현장의 우선순위 칸에 적어 스폰서가 결정하게 한다

1교시 (80분) — 프로젝트란 무엇인가, 왜 실패하는가

- ▶ 이 과정에서 "PM"이 무엇을 뜻하는가 — 프로젝트 매니저 / PO / 프로덕트 매니저의 3중 충돌
- ▶ 프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영 — 세 표준의 정의를 나란히 놓으면 보이는 것 [§1.1]
- ▶ 프로젝트는 왜 실패하는가 — 통계를 그대로 믿으면 안 되는 이유 [§1.2]
- ▶ 프로젝트를 임시조직으로 본다는 것 [§1.3]
- ▶ 유형은 하나가 아니다 — NTCP 다이아몬드 · 분야별 되돌림 비용 [§1.4~1.5]

§1.2(실패 통계)가 가장 길다 — 경력자가 가장 많이 틀리는 지점

약칭	원어	책임지는 것	이 과정에서
PM	Project Manager	정해진 사양·일정·예산 안에서 산출물(output) 인도	PM 트랙 4일 (오늘)
PO	Product Owner (Scrum)	백로그 우선순위, 스프린트 단위 가치 판단	Product 트랙
프로덕트 매니저	Product Manager	제품의 존재 이유 — 시장·사용자·수명 전체의 성과(outcome)	Product 트랙 4일


- ▶ 명함이 아니라 **무엇에 책임지는가**로 구분한다
- ▶ 오늘 이후 "PM" = 온담 P1의 **발주사** 프로젝트 매니저(여러분)

output은 PM의 책임, outcome은 사업 오너의 책임 — 오늘 하루 반복되는 구분

표준	프로젝트	프로그램	포트폴리오
ISO 21502:2020	합의된 목표를 위한 임시적 노력. 시작·끝이 정의됨	개별 관리로는 얻을 수 없는 편익 을 위해 함께 관리	전략 목표를 위한 프로젝트·프로그램· 운영 의 집합
PMBOK 8판 (2025)	고유한 산출물을 위한 임시적 노력 + 가치 인도	편익과 통제를 위해 조정 관리	전략 목표를 위한 그룹 관리
MSP 5판 (2020)	산출물(outputs)을 만드는 것	outputs → capabilities → outcomes → benefits	(MoP가 다름)

▶ 공통 단어 셋: **임시적**(끝이 정의되어 있다) / **편익** / **전략·운영**

정의는 개념 논쟁이 아니다 — 프로젝트라 부르는 순간 예산·책임자·해산이 생긴다

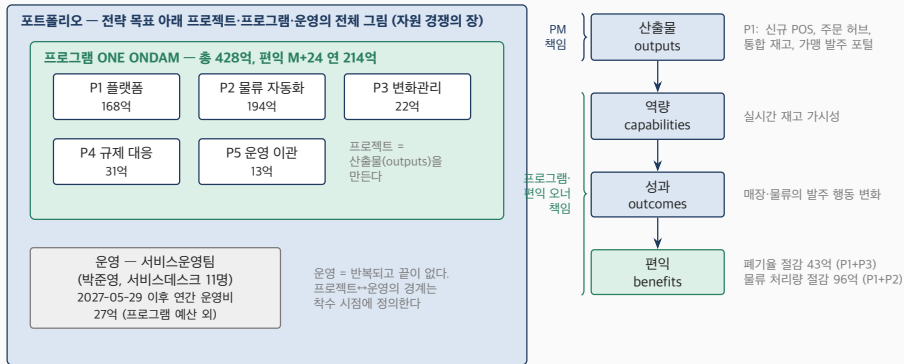

출처: ISO 21502:2020, PMBOK Guide 8판(PMI, 2025), MSP 5판(AXELOS, 2020)의 정의와 사례 문서 「위온담F&B홀딩스」를 바탕으로 재구성.

그림 1-1. 포트폴리오·프로그램·프로젝트·운영의 관계와 MSP 가치 사슬 (ONE ONDAM 428억 · P1~P5)

편익이 프로젝트 경계를 넘어 발생한다는 사실 자체가 프로그램의 존재 이유다

P1의 편익은 P1 혼자 만들지 못한다

- ▶ 폐기율 절감 **43억** = P1 실시간 재고(산출물) → 매장·물류의 발주 행동 변화(역량→성과) → 편익
- ▶ 물류 처리량 **96억** = P2 설비 + P1 재고 원장이 **함께** 작동해야 나온다
- ▶ P1의 산출물은 명확하다 — POS, 주문 허브, 통합 재고, 가맹 포털, 통합 계층·데이터 전환
- ▶ 운영과의 경계: P5 종료(2027-05-29) 이후는 서비스운영팀(박준영, 11명)의 것
- ▶ 연 운영비 27억은 428억 **밖**

프로젝트가 끝나는 지점과 운영이 시작되는 지점을 착수 시점에 정의하지 않으면 종료 때 반드시 다룬다

프로그램을 프로젝트 도구로

- ▶ "전사 혁신 과제", "DX TF"
- ▶ 편익 소유자 소멸
- ▶ 프로젝트 간 의존 미관리
- ▶ 종료 조건이 흐려진다

운영을 프로젝트로 포장

- ▶ 연례 업그레이드에 현장·킵오프·종료 보고서
- ▶ 반복되고 끝이 없는 일은 **운영**
- ▶ 그것은 ITIL의 영역이다

여러분 회사에서 "프로젝트"라 불리지만 정의상 프로그램이거나 운영인 것은?

프로젝트는 왜 실패하는가 — ”성공률 30%”를 믿으면 안 되는 이유


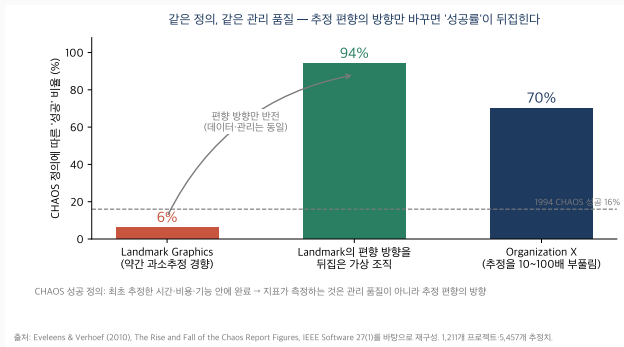


그림 1-2. CHAOS 성공 정의의 결함 — 6% / 94% / 70%

- ▶ Standish CHAOS(1994~): 성공 16% · challenged 53% — 30년간 업계 상식
- ▶ Eveleens & Verhoef (2010): ”성공” = 최초 추정 안에 완료 → 추정 편향의 **방향**을 짚 뿐
- ▶ 추정을 부풀리는 조직 70% 성공 / 정확하되 약간 과소 6% / 편향만 뒤집으면 94%

결론은 ”프로젝트는 실패하지 않는다”가 아니다 — 이 숫자로는 아무것도 알 수 없다

두 개의 별개 관찰 — iron law와 곱셈 구조

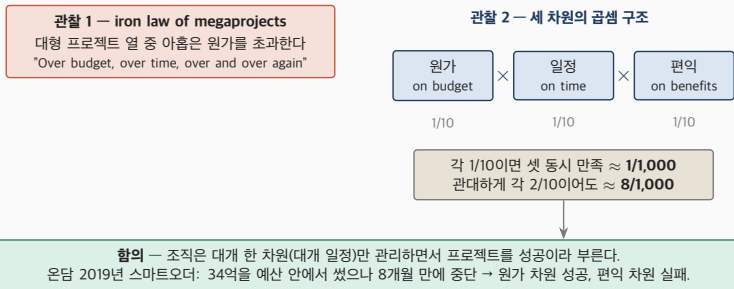


출처: Flyvbjerg (2014), What You Should Know About Megaprojects and Why, Project Management Journal 45(2)를 바탕으로 재구성.

그림 1-3. Flyvbjerg의 두 관찰 — iron law와 세 차원의 곱셈 구조 ($1/1,000 \cdot 8/1,000$)

조직은 대개 한 차원만 관리하면서 성공이라 부른다 — 2019 스마트오더: 예산 안, 8개월 만에 중단

처방 — Reference Class Forecasting: 외부 분포 먼저, 내부 추정 나중

올바른 순서 — 외부 분포를 먼저 본다 (outside view → inside view)



틀린 순서 — 내부 추정을 먼저 만들고 RCF로 "검증"한다



출처: Flyvbjerg (2014); Kahneman & Tversky (1979)의 outside view; 영국 재무부 Green Book-DfT 지침을 바탕으로 재구성.

그림 1-4. RCF 3단계 — ① 유사 과거 20~30건 → ② 실적÷최초 예산의 분포 → ③ uplift·상대 위험 판단

▶ 순서를 뒤집으면 앵커링 / reference class를 너무 좁게 잡으면 uniqueness bias

IT 원가 초과는 멱함수 분포 — 평균에 맞춘 컨틴전시가 틀리는 이유 (Day2·Day3)


그러면 Flyvbjerg의 숫자는 믿어도 되는가 — 자기 조직의 base rate

- ▶ Flyvbjerg 표본은 교통·에너지·올림픽 중심.
168억 SI에 그대로 적용은 **class를 너무 넓게**
잡는 반대쪽 오류
- ▶ 배울 것은 숫자가 아니라 태도 — **남의 통계**
대신 자기 조직의 base rate
- ▶ 네 건은 class로는 적다. 그러나 ”정보화 4건
중 2건 중단·축소”는 P1 리스크 등록부에 들
어갈 base rate

연도	사업	규모	결과
2014	SAP 도입	74억	(실적 미기재)
2019	스마트오 더	34억	중단 (8개월)
2022	WMS 고 도화	12억	범위 63% 축소
2025	검사기록 디지털화	34억	반려

오늘의 첫 실무 처방 — 제안서·임원 보고서에서 CHAOS 수치를 빼라

성공의 두 정의 — Cooke-Davies (2002)

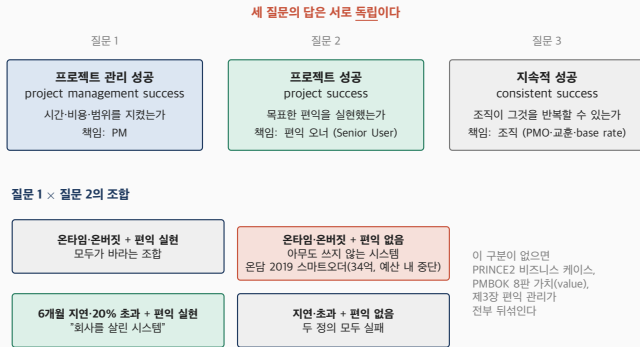

출처: Cooke-Davies (2002), The 'real' success factors on projects, IJPM 20(3)을 바탕으로 재구성.

그림 1-6. 성공 세 정의와 2×2 조합 — 관리 성공은 G4(2027-05-29), 프로젝트 성공은 G5(2028-03-31)에 판정


세 답은 서로 독립이다 — 온타임·온버짓인데 아무도 안 쓰는 시스템 / 지연·초과인데 회사를 살린 시스템

프로젝트를 임시조직으로 본다는 것 — Lundin & Söderholm (1995)

네 가지 구조 개념 (4T) — 임시조직을 정의한다



네 가지 행위 개념 — 임시조직의 행위를 시퀀싱한다



출처: Lundin & Söderholm (1995), A theory of the temporary organization, Scandinavian Journal of Management 11(4)를 바탕으로 재구성.

그림 1-7. 임시조직 이론 — 4T · 4 행위 개념 · 실무 현상

라이프사이클 그림이 설명 못 하는 것 — 왜 프로젝트 안의 사람들이 그렇게 행동하는가

이 렌즈가 설명하는 네 가지 현상

실무자가 매일 겪는 것	설명하는 개념	온담에서
교훈(lessons learned)은 왜 항상 실패하는가	제도화된 종료 — 배울 조직이 종료와 함께 해체	스마트오더 종료 보고서의 중단 사유 세 줄
종료 직전에 왜 인력이 빠지는가	팀 — 끝이 보이면 다음 과업을 찾는 것이 정상	안정화 기간의 핵심 개발자 이탈
프로젝트는 왜 모조직과 싸우는가	계획된 고립 — 프로젝트의 고립은 운영의 부담	IT본부 47명 중 14명 투입, 33명이 6종·47본 운영
착수 결정은 왜 분석적이지 않은가	행위 기반 기업가정신	”615개 매장을 하나의 채널처럼”이 먼저

종료 이후 경로(P5, 다음 배치)를 착수 시점에 설계해야 인력 이탈을 막는다

- ▶ 일정·예산·조직 구성·핵심 갈등은 착수 전에 **조직의 역사와 정치**로 이미 결정되어 있다
- ▶ 컷오버 2027-02 = 2019 사모펀드 계약의 IPO 조항
- ▶ 인터페이스 우선 = 2011 OD-POS를 박세연이 직접 만듦
- ▶ 가맹 경계 = 2019 스마트오더 중단 경험
- ▶ 처방: 새 프로젝트 첫 주에 **직전 프로젝트 두세 개의 종료 보고서**를 읽어라


킵오프 시점 PM의 진짜 일은 이미 결정된 것들을 목록화하는 것

프로젝트 유형은 하나가 아니다 — NTCP 다이아몬드 (Shenhar & Dvir, 2007)

축	질문	단계	이 축이 결정하는 것
Novelty	시장·사용자에게 얼마나 새로운가	derivative / platform / breakthrough (3)	요구사항 확정 시점, 시장 조사 신뢰도
Technology	기술이 얼마나 성숙한가	low / medium / high / super-high (4)	설계 동결 시점, 설계 반복 횟수
Complexity	범위·계층이 얼마나 넓은가	assembly / system / array (3)	조직·절차의 형식성, 하도급·인터페이스 관리
Pace	시간이 얼마나 결정적인가	regular / fast-competitive / time-critical / blitz (4)	의사결정 위임 수준, 상위 관리자 개입

네 축은 직교한다 — 합산해 "난이도 3.2등급"을 만드는 순간 모델은 무의미해진다

온담 P1을 NTCP로 진단하면 — ”표준 SI 프로젝트”가 아니다

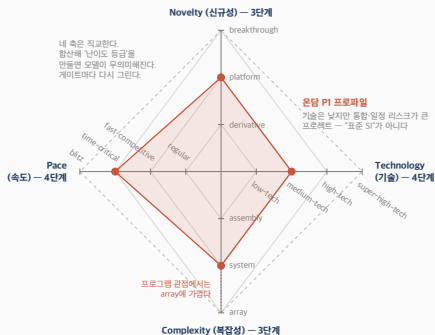

출처: Shenhar & Dvir (2007), Reinventing Project Management: The Diamond Approach, Harvard Business School Press를 바탕으로 재구성. P1 위치는 교재 1.4절의 예시 진단.

그림 1-8. NTCP 다이아몬드 — 온담 P1의 위치

- ▶ **N = platform** — 사용자 3,000명대의 업무 방식이 바뀐다
- ▶ **T = medium** — 기술은 성숙, **기존 기술의 미지**(문서 없는 13분, 7.4TB)가 크다
- ▶ **C = array에 가까운 system** · **P = time-critical** — IPO·규제 역산

기술 리스크보다 통합·일정 리스크에 자원 집중 — 같은 프로그램의 P2는 전혀 다른 프로파일

분야별 대조 — 같은 단어, 다른 리듬, 다른 되돌림 비용



출처: 교재 1.5절 분야별 대조표(SI·EPC·NPD·계약)와 Merrow(IPA), Cooper(Stage-Gate), AACE 추정 등급을 바탕으로 재구성. 구간 비율은 개념도이며 실측이 아니다.

그림 1-9. 분야별 되돌림 비용 시간축 대조 (SI · EPC · NPD · 제약)

되돌릴 수 있으면 실험하고 반복한다. 되돌릴 수 없으면 결정 전에 최대한 알아야 하므로 앞단에 시간을 쓴다

분야별 대조표 — 산출물 · 되돌림 비용 · 리듬 · 범위 확정 · 주된 실패

축	SI	건설·EPC	제조 NPD	제약 임상·규제
산출물	소프트웨어 — 수정 가능	물리 구조물	물리 제품 + 양산 공정	승인 — 규제기관의 결정
되돌림 비용	낮음~중간 (전환·컷오버는 예외)	매우 높음 — 기초 타설 후 변경은 철거	높음 — 금형 후 재작업, 양산 후 리콜	극단적 — 제출 후 문서 잠김, 시계는 상대가
리듬을 정하는 것	요구사항 확정, 인터페이스 상대의 준비	자재 리드타임, 공정 순서, 인허가	금형·부품 리드타임, EVT/DVT/PVT	심사 일정, 추가자료 왕복 횟수
범위 확정 시점	늦다 — 계약 후에도 움직임	이르다 — 설계 성숙도 (AACE Class)가 계약 유형 결정	게이트마다 단계적, Gate 1~2에서 kill	프로토콜 승인 시 사실상 고정
주된 실패	요구 팽창, 데이터 전환, 인터페이스 미확정	설계 미성숙 상태의 LSTK, 동시지연 클레임	이빨 없는 게이트(kill 0건), 금형 뒤 설계 변경	추가자료 0회 가정 위의 출시일 공표

가장 중요한 열은 되돌림 비용 — 이 표가 2교시 테일러링의 토대다

1. 프로젝트는 **산출물**, 프로그램은 산출물이 역량·성과를 거쳐 **편익**이 되도록 함께 관리
2. CHAOS 성공률은 **추정 편향의 방향**을 측정한다 — KPI로 쓰면 부풀리기가 최적 행동
3. iron law와 3차원 곱셈은 별개. 처방은 RCF — **외부 분포 먼저**
4. 관리 성공(시간·비용·범위)과 프로젝트 성공(편익)은 **독립**
5. 임시조직론(4T + 4행위)이 교훈의 실패·종료 직전 이탈·모조직과의 긴장을 설명. 착수의 진짜 일은 **이미 결정된 것의 목록화**
6. NTCP(3/4/3/4)는 축별로 다른 처방. 합산하지 말고 게이트마다 다시 그린다
7. 분야 차이의 핵심 변수는 **되돌림 비용**

워크북 §1 "전략적 배경"과 심화 과제(과거 4건 base rate)에 쓰인다

2교시 (90분) — 표준의 지형: 무엇을 따를 것인가

- ▶ PMBOK의 계보 — 6판, 7판, 그리고 8판의 부분 회귀 · 6 원칙과 7 성과영역 [§2.1~2.2]
- ▶ PRINCE2 7 — 프로젝트 보드, 예외 관리, 산출물 기반 계획 [§2.3]
- ▶ ISO 21502:2020 — 계약서가 인용하는 표준 · 애자일·SAFe·하이브리드의 위치 [§2.4~2.5]
- ▶ 테일러링 — 되돌림 비용, Boehm-Turner, Cynefin, TDR [§2.6]
- ▶ 자격 체계의 실효성 [§2.7]

이 교시의 실무 산출물은 재매핑 대장과 TDR이다

- ▶ PMBOK Guide는 법도 계약 조건도 아니다. 그런데도 판본을 알아야 하는 이유 셋
- ▶ ① 사내 PMO 표준·양식·직무기술서가 인용하는 **조항 번호**가 살아 있는가, 죽어 있는가
- ▶ ② 계약서·RFP의 "PMBOK 준거" 문구 — 판본과 문서를 특정하지 않으면 **분쟁의 씨앗**
- ▶ ③ 표준을 만드는 조직이 5년 사이에 자기 구조를 **두 번 뒤집었다**는 사실 자체가 이 분야의 현재 상태

2021 삭제 → 2022 보완 별책 → 2025 회귀 — 세 줄을 하나의 이야기로

PMBOK 계보와 주변 표준 연표 1996~2026

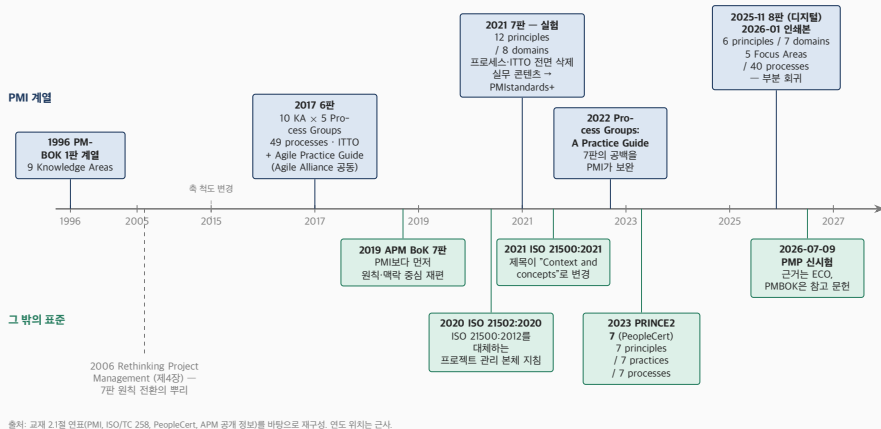


그림 2-1. 1996 9 KA → 2017 6판 49 프로세스 → 2021 7판 12 원칙 → 2025-11 8판 40 프로세스

APM BoK 7판(2019)이 PMI보다 먼저였고, 뿌리는 2006 Rethinking PM까지 올라간다

- ▶ 10 지식영역 × 5 프로세스 그룹 = **49 프로세스**, 각각 ITTO(Inputs / Tools & Techniques / Outputs)
- ▶ 한국 기업에 뿌리내린 이유 ① **감사 가능성** — 감사·감리·검수는 ”이 문서가 있는가”를 판정할 문장을 요구한다
- ▶ 이유 ② **양식이 자산** — 수년간 축적된 산출물 서식. 원칙 12개로는 서식이 나오지 않는다
- ▶ 이 교재는 6판을 ”폐기된 판”으로 다루지 않는다 — 한국 기업 문서체계의 **원본(source document)**

8판이 40 프로세스를 되살린 것은 ”프로세스 없는 표준은 조직이 쓸 수 없다”는 실무 피드백의 결과

7판 — 12 원칙 / 8 성과영역, 프로세스 삭제

- ▶ 두 문서가 한 권 → ”7판 준거”는 어느 문서인지 불명확
- ▶ 원칙 12개는 **감사할 수 없는 문장**
- ▶ 실무 콘텐츠는 PMIstandards+(구독형)로

8판 — 6 원칙 + 7 성과영역 + 5 Focus Areas·40 프로세스

- ▶ Focus Areas = Initiating / Planning / Executing / M&C / Closing — **5 Process Groups가 이름을 바꿔 돌아왔다**
- ▶ 실질 변경: **Integration → Governance, Cost → Finance**
- ▶ Quality는 QA→Governance / QC→Scope로 분산, Communications는 Stakeholders에 흡수

7판은 학술 논쟁의 20년 늦은 반영, 8판은 그것이 실무와 충돌한 뒤의 재타협


PMBOK 8판 구조 — 6 원칙 / 7 도메인 / 5 Focus Areas · 40 프로세스

6 core principles — 왜 (모든 도메인·프로세스를 관통)




5번은 8판 신설 (7판 대응물 없음)

7 performance domains — 무엇을 (6판 지식영역명 이름으로 회귀)



5 Focus Areas 안의 40 processes — 언제 (6판 5 Process Groups와 같은 이름, non-prescriptive)



현장 개발 · 이해관계자 식별 (2개)

세로 읽기: 원칙(왜) → 도메인(무엇을) → Focus Area의 프로세스(언제). 8판이 40개 프로세스를 되살린 것은 6판이 옳았다는 뜻이 아니라 "프로세스 없는 표준은 조직이 쓸 수 없다"는 실무 피드백의 결과다.

출처: PMBOK Guide 8판(PMI, 2025 디지털 / 2026-01 인쇄) 구조를 교재 2.1~2.2절에 따라 재구성. 원칙 영문은 출처에 따라 축약형·완전형이 혼재하므로 인쇄본 대조 필요.

그림 2-2. Governance · Scope · Schedule · Finance · Stakeholders · Resources · Risk

Governance가 첫 번째 도메인 — 실패의 가장 흔한 원인은 기술이 아니라 "누가 결정하는가"의 부재

한국 사내 표준은 6판에 머물러 있다 — 합의와 처방

- ▶ 여러분 다수는 **두 판본 뒤쳐진 사내 표준**으로 일하며 **한 판본 뒤쳐진 자격 지식**을 갖고 있다 — 정상 상태
- ▶ 합의 ①: "6판 4.6 Perform Integrated Change Control" 같은 조항 번호는 현행에 없다 → "현행 표준 준거" 요구에 방어 불가
- ▶ 처방은 재작성이 아니라 **재매핑 대장 네 열**

사내 문서·조항	6판 근거	8판 대응 위치	조치
통합변경통제 절차서	4.6	Governance 도메인	조항 번호만 교체, 절차 본문 유지
원가관리계획서	7.1	Finance 도메인	명칭 변경, 자금 조달·현금흐름 항목 신설 검토
품질보증 절차서	8.x	QA→Governance / QC→Scope	조직마다 결정 필요

합의 ② PMP 승진 요건의 형평 문제 · 합의 ③ 판본이 바뀌어도 살아남는 산출물

6판 10 지식영역 → 8판 7 도메인 재매핑

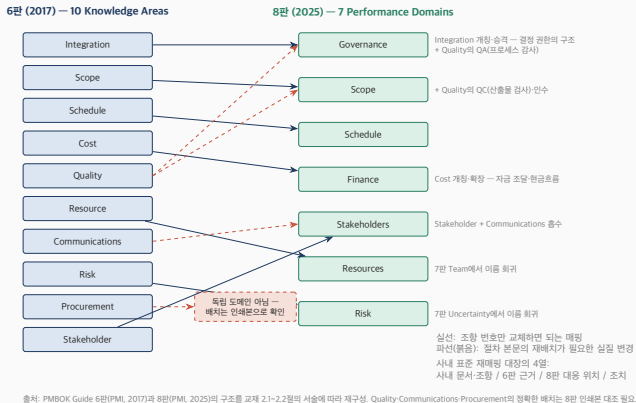


그림 2-3. 실선 = 이름만 바뀜 / 파선 = 분산·흡수 (Quality · Communications · Procurement)


워크북 §2 재매핑 대장의 원본 — 조항 번호 교체로 끝나는 행과 끝나지 않는 행을 구분하라

원칙	7판에서	온담에서 보이는 모습
1 총체적 관점 (holistic view)	#5 시스템 상호작용 + #9 복잡성	"P2가 늦으면 P1 컷오버가 밀린다"를 리스크 등록부에
2 가치 집중 (focus on value)	#4 유지 + #3·#11·#12 흡수	편익 214억의 근거를 항목별로 묻는 CFO = 이 원칙의 실행
3 품질 내재화 (embed quality)	#8 "Build" → "Embed"	사후 검사가 아니라 프로세스·산출물 안에. Quality 도 메인 소멸과 짝
4 책임 있는 리더십 (lead accountably)	#1 stewardship + #6 병합	CCB "반대의견 실명 기재" vs 2022 WMS 회의록의 빈 서명란
5 지속가능성 통합	신설 — 대응물 없음	P2 물류 인력 246명 문제 = 사회적 지속가능성이 리스크로
6 권한 위임 문화 (empowered teams)	#2 협력적 팀 환경의 진화	한국에서 이상과 현실의 거리가 가장 먼 원칙 → 5교시

원칙 6(권한 위임)은 PRINCE2의 Manage by Exception·허용범위로 제도화된다


PRINCE2 7 (2023) — 구조와 PMBOK과의 결정적 차이

PRINCE2 7 (2023) — 7 principles / 7 practices / 7 processes



7판의 변경: 통합 요소 4→5(People 추가), 성과목표측 6→7(sustainability 추가), 관리 접근법 9개.

Project Board — 스폰서를 세 역할로 나눈다 (PMBOK의 단일 "sponsor"와의 결정적 차이)



출처: PRINCE2 7 Managing Successful Projects (PeopleCert, 2023)의 구조를 교재 2.3절에 따라 재구성. 문단 해정한 사례 문서 §4.1.

- ▶ 7 principles 중 핵심: continued business justification · **manage by exception** · focus on products
- ▶ 7판 변경: 통합 요소 4→5(People), 성과목표측 6→7(sustainability)
- ▶ **PMBOK = "무엇을 알아야 하는가"의 지식체계 / PRINCE2 = "누가 무엇을 결정하는가"의 방법론**

그림 2-4. PRINCE2 7 삼중 구조 + Project Board

네 장치 — Project Board / Manage by Exception / Product-Based Planning / 살아 있는 Business Case

역할	책임	온담 P1
Executive	비즈니스 케이스 — ”돈을 쓸 가치가 있는가”	정미란 CFO
Senior User	산출물이 사용되어 편익이 나오는 것 . 요구사항 대표, 편익 실현 책무	오정근 영업본부장
Senior Supplier	산출물을 만드는 쪽의 자원·기술적 실현 가능성	박세연 IT본부장

- ▶ 이해가 상충하는 당사자를 **강제로 한 의사결정체에** 넣는다
- ▶ MbE: 7 성과목표축 × 3계층의 **허용범위 격자** — 벗어날 것으로 **예측되는 순간** Exception Report

Exception Report는 문제 보고서가 아니라 권한 반납 문서 — PM의 자율성을 규정으로 방어하는 유일한 수단

Product-Based Planning — 활동이 아니라 산출물부터

- ▶ Project Product Description → PBS → Product Descriptions(**품질 기준·검수 방법·검수 책임자** 강제) → Product Flow Diagram
- ▶ 활동 중심 WBS("설계하기")는 검수 기준을 계획에서 누락시킨다 — 검수 분쟁의 원인 대부분

Business Case — 승인용 문서가 아니라 단계 경계마다 갱신

- ▶ 각 stage 경계에서 "계속할 이유가 아직 있는가"를 Board가 되묻는다
- ▶ 편익 검토는 종료 **이후**에 예약 — 온담 이사회 조건 3항과 G5(2028-03-31)

PBS 노드는 명사여야 하고, 명사가 아니면 검수할 수 없다 → Day2 WBS

- ▶ 『Guidance on project management』, ISO/TC 258. **자격시험이 없다** → 교육시장에서 무명
- ▶ 글로벌 EPC·발주처 계약서와 RFP에서는 "PMBOK 준거"보다 자주 — **중립성**
- ▶ 구조: §4 맥락 → §5 전제 조건 → §6 통합 실무(**§6.2 pre-project** … **§6.9 post-project**) → §7 관리 실무 17종
- ▶ **ISO 21500의 함정**: 2021년판 제목은 "Context and concepts" → "ISO 21500에 따라 관리한다"는 **무의미한 문장**
- ▶ 지침은 **21502**, 용어는 **21506:2024**, 거버넌스는 **21505:2017**

계약에는 "ISO 21502:2020 §7 관리 실무에 따라"처럼 문서·연도·조항을 특정하라

표준 지형도 — 지식체계 / 방법론 × 거버넌스 층 / 인도 층

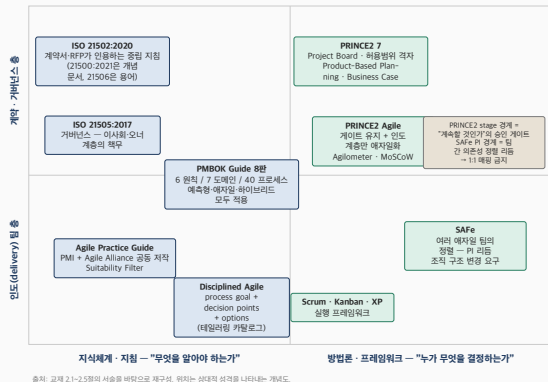



그림 2-5. PMBOK · PRINCE2 · ISO 21502/21505 · 애자일 프레임워크가 각각 어느 층에 있는가

같은 층에 있는 것끼리만 대체된다 — 애자일은 인도 층, PRINCE2는 거버넌스 층

- ▶ 애자일(Scrum, Kanban / SAFe, LeSS, DA)은 표준이 **개발 접근(development approach)**이라 부르는 것의 한 종류
- ▶ **Agile Practice Guide (2017)** — Agile Alliance 공동 저작. 실무 자산은 Suitability Filter
- ▶ **PRINCE2 Agile** — 게이트 거버넌스 유지, **인도 계층만 애자일화**. 시간·비용 고정, 범위는 MoSCoW
- ▶ **SAFe** — 한국 실패 원인은 Personnel·Culture 축 무시. **PI $\neq$ Stage** — 1:1 매핑하면 중단 결정 지점이 사라진다
- ▶ **온담 P1 하이브리드** — 스프린트 36회, 요구사항 월 1회 동결, FP 12,400점 고정가, 게이트 G0~G4

하이브리드 = 어느 결정을 언제까지 되돌릴 수 있게 남기고 언제 동결하는가의 설계

테일러링의 기준은 하나 — 되돌림 비용

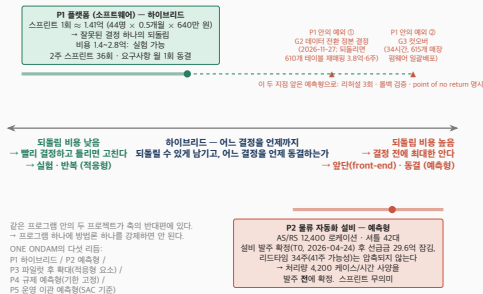

같은 프로그램 안의 두 프로젝트가 속의 반대편에 있다.
 → 프로그램 하나에 방법론 하나를 강제하면 안 된다.
 ONE ONDAM의 다섯 리듬:
 P1 하이브리드 / P2 예측형 /
 P3 파일럿 후 확대(적응형 요소) /
 P4 규제 예측형(7일 고정) /
 P5 운영 이관 예측형(SAC 기준)


출처: 교재 2.6절 "되돌림 비용이 방법을 결정한다"의 서술과 사례 문서 수치를 바탕으로 재구성. 속 위 위치는 상대적 개념도.

그림 2-6. 되돌림 비용 축 위의 P1 vs P2

- ▶ **P1: 스프린트 1회 ≈ 1.41억 — 잘못된 결정 하나 = 1.4~2.8억 → 실험 가능**
- ▶ **P2: 설비 발주 후 선금금 29.6억 잠김, 리드타임 34주 → 예측형, 앞단에 시간**
- ▶ **P1의 예외 — G2 전환 정보(3.8억·6주), G3 컷오버(34시간) 앞은 예측형**

프로그램 하나에 방법론 하나를 강제하면 안 된다 — 다섯 프로젝트, 다섯 리듬

Boehm-Turner 5축 (2003) — 축이 같으면 시스템을 쪼개라

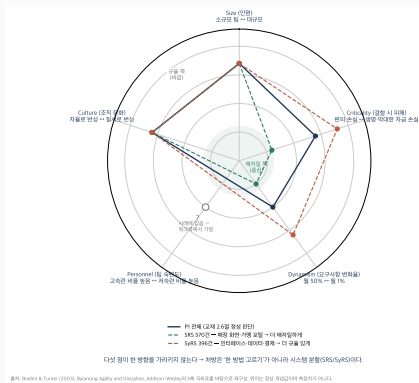


- ▶ P1: Size 82명 → 바깥 / Criticality 615개 매장
결제 / Dynamism 월 동결 → 중간 / Culture
질서 쪽
- ▶ 처방은 "한 방법을 골라라"가 아니라 **축이 갈리
면 쪼개서 부분마다 다른 방법**
- ▶ 매장 화면·가맹 포털(SRS 570) → **더 애자일 /
인터페이스·데이터·결제(SyRS 396) → 더 규
율**

그림 2-7. 5축 극좌표 — P1 전체와 SRS/SyRS 분할

한국에서 결정적인 축은 Personnel과 Culture — 프로세스만 이식하면 실패한다

Cynefin — 방법론 선택 도구가 아니다 (Snowden & Boone, 2007 HBR)

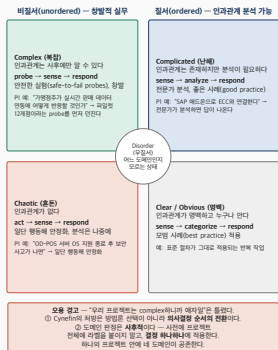

출처: Snowden & Boone (2007), A Leader's Framework for Decision Making, Harvard Business Review를 바탕으로 재구성. PI 예시는 교재 2.6절.

그림 2-8. 네 도메인과 의사결정 순서

- ▶ 오용 "complex하니까 애자일" — 처방은 **의사결정 양식의 전환**이고, **도메인 판정은 사후적**
- ▶ 프로젝트 전체가 아니라 **결정 하나하나**에 — SAP 애드온 = complicated / 가맹점주 반응 = complex → 파일럿 12개점 / OD-POS 보안 사고 = chaotic
- ▶ 시중의 Stacey matrix 2×2는 **Stacey의 원 도식**이 아니라 **후대 각색본** — "만든 사람이 버린 그림"이라고 말하지 말 것

하나의 프로젝트 안에 네 도메인이 공존한다 — 결정마다 도메인을 감각하라

- ▶ 세 도구는 **다른 질문**에 답한다: NTCP = 유형 / Boehm-Turner = 준비도 / Cynefin = 개별 결정 — 충돌 지점이 설계할 지점
- ▶ 근거 기록이 없으면 모든 생략이 감사에서 "표준 미준수" → 방어용 문서 양산 — **한국 조직에서 문서가 줄지 않는 진짜 메커니즘**

무엇을	왜	어떤 리스크를 수용하는가	누가 승인
스프린트 단위 상세 일정표 생략	월 동결·게이트로 통제	스프린트 내 지연 가시성 저하	스폰서
데이터 전환 리허설 3회 추가	2023 감사 지적 "형상관리 미비", G2 비가역성	시험 기간 압박	스폰서

생략 항목별로 행이 있어야 감사 조항에 대응된다 — 테일러링은 줄이는 것만이 아니다

자격	기반 문서	실효
PMP (PMI)	ECO — PMBOK은 참고 문헌. 2026-07-09 신버전	한국 최고 인지도. 증명하는 것은 "지식과 경력 시간"이지 "상황 속 판단"이 아님
PMI-ACP	애자일 실무	
PRINCE2 7 F/P (PeopleCert)	PRINCE2 7 매뉴얼	한국 자격 가치 낮음. 해외 발주처·글로벌 본사 보고에서 "문서 이름 맞추는 능력"
SAFe SA/SSM/SPC	SAFe	전환 컨설팅 수임에 유리, 연 1회 갱신
IPMA A~D	ICB4 29 역량 요소	자격 실효는 낮으나 ICB4는 사내 PM 등급제·직무기술서의 원천

"PMP를 8판으로 다시 봐야 하나요?" → 아니오. 시험 근거는 ECO. 판본 논쟁은 사내 문서 체계의 문제

1. PMBOK 6판(49 프로세스) → 7판(12원칙, 삭제) → 8판(6원칙/7도메인/40 프로세스, **부분 회귀**)
2. 사내 표준은 대부분 6판 — 처방은 **4열 재매핑 대장**. Integration→Governance, Cost→Finance
3. PRINCE2의 자산 = **3역할 / 허용범위 격자와 MbE / PBP / 갱신되는 BC**
4. 계약서는 ISO 21502 — "21500에 따라"는 틀린 문장. 용어는 21506
5. 애자일은 개발 접근의 한 종류. PRINCE2 Agile은 게이트 유지. Stage ≠ PI
6. 테일러링의 기준은 **되돌림 비용**. NTCP / Boehm-Turner / Cynefin은 다른 질문. 결과는 **TDR 네 칸**
7. PMP의 근거는 ECO. 자격은 문을 여는 열쇠

점심시간에 워크북 §0.3 온담 한 페이지 요약과 §1.5·§2.5 완성 예시본을 훑어 올 것

3교시 (90분) — 착수 이론: 비즈니스 케이스 · 편익의 소유 · 헌장 · 이해관계자

- ▶ 착수 이전 — 비즈니스 케이스와 편익의 소유권 [§3.1]: 이미 결정된 것들 / BC의 항목 / Zwikael & Smyrk의 ITO / Ward & Daniel의 BDN
- ▶ 프로젝트 헌장 — 항목별 의미와 한국 기업에서의 실질화 [§3.2]
- ▶ 이해관계자 — 식별·분석·참여 계획 [§3.3]: Power/Interest의 한계 / Mitchell-Agle-Wood 현저성 모델 / 한국 특유의 이해관계자
- ▶ 4교시 실습 ①(비즈니스 케이스 요약 + 헌장)의 이론 부분

오전보다 온담 숫자가 훨씬 많이 나온다 — 워크북 §0.3 한 페이지 요약을 펼쳐 놓고 듣는다

착수의 첫 번째 일은 검증이다 — 표준이 "착수 전"을 수용하는 방식

- ▶ ISO 21502 §6.2 pre-project activities / PRINCE2 Starting Up a Project가 Initiating 앞에
- ▶ PMBOK 8판 Initiating은 프로세스 둘뿐(현장 개발, 이해관계자 식별) — 입력인 BC·편익 관리 계획은 **프로젝트 바깥**에서 온다
- ▶ P1 PM이 받는 것: 이사회 부의안(2025-12) + 편익 표(연 214억) + 프로그램 관리 규정 + 승인 조건 5개항
- ▶ 착수의 첫 번째 일은 새로 만드는 것이 아니라 **이미 만들어진 BC의 숫자와 가정을 검증하는 것**

읽지 않고 현장을 쓰는 것은 남이 정한 목표를 자기가 정한 것처럼 서명하는 일

비즈니스 케이스를 온담 P1로 채우면


항목	무엇을 적는가	온담 P1에서
문제 / 기회	무엇이 잘못되어 얼마의 비용을 만드는가. 숫자로	OD-POS OS 지원 종료(2024-07), 문서 부재 인터페이스 13본. 폐기율 3.9% = 연 98.7억 (2,530억 × 3.9%), 결품률 4.7%, 가맹 발주 리드타임 38시간
대안	do-nothing / do-minimum / 제안안 / 그 밖	(a) 현행 유지 — SAP ECC 2027-12 종료 시 이중 위기 (b) 부분 개선 (c) 통합 플랫폼(P1) (d) 상용 패키지 — 검토 기록 없음
편익	기준값·목표값·측정 방법·시점· 측정 책임자	B-01~B-08, M+24 연 214억. 측정 책임자 "프로그램 착수 후 지정 예정" — 결함 ①
비용	프로젝트 + 운영 = TCO	P1 168억 + 나머지 260억. 연 운영비 27억(3년 81억)이 편익에서 미차감 — 결함 ②
리스크	편익이 안 나올 주요 이유	과거 2건 중단·축소, P2 리드타임, 3PL WMS 개방, 가맹 부속서 388점 서면 동의, 규제 기한
권고	어느 대안을 왜. 승인 조건	이사회 원칙 승인 + 5개 조건

표를 채우면서 알게 되는 것 — 온담 BC는 존재하지만 완결되어 있지 않다

- ▶ B-03 결품률: "기회손실, 미산정" / B-02 재고 정확도 91.3%: 분모가 **순환실사 대상 SKU 69%뿐**
- ▶ B-06 물류 처리량 96억: 이사회 자료에 **분모가 없고**, 노조는 "인원 절반이라는 뜻이냐", 한동석은 "4,200은 현장 숫자가 아니다"
- ▶ 편익 합계 214억에서 연 운영비 27억 미차감 → 정직한 숫자는 **187억**
- ▶ 측정 책임자 "추후 지정" — 그것은 지정하지 않겠다는 뜻
- ▶ CFO: "근거가 없는 항목은 승인하지 않겠다" / 내부감사: "편익 산정 근거를 문서로 제출하라"

PM의 착수 시점 일은 결함을 고치는 것(권한 밖)이 아니라 목록으로 만들어 스폰서에게 결정을 요구하는 것

편익은 누가 소유하는가 — Zwikael & Smyrk의 ITO 모델 (2011)



온담 P1의 편익 오너 (교재 3.1절)

- 폐기물 절감 43억 → 영업본부장 오정근 (구매·매장 운영 책임, Senior User) — P1 PM이 아니다
- 물류 처리량 절감 96억 → 물류본부장 한동석
- 매장 인건비율 38억 → 영업본부
- 측정 시점 G5(2028-03-31)는 프로젝트 종료 후 → 측정 책임자는 반드시 **상설 조직의 실명**. 부서명을 쓰면 6개월 안에 유효성이 된다

한국 기업에서 가장 자주 잘못 설계되는 지점 — benefit owner를 PM·PMO장으로 지정. PM은 통제 불가능한 것에 책임을 지게 되고, 범위 방어와 책임 회피가 합리적 행동이 된다. 편익 오너의 이름이 없는 편익은 착수 시점에 이미 실현되지 않기로 결정된 편익이다.


출처: Zwikael & Smyrk (2011), Project Management for the Creation of Organisational Value, Springer의 ITO 모델을 바탕으로 재구성.

그림 3-1. Input → Output(PM) → Outcome(사업 오너) — 책임의 분리선

편익 측정 시점(G5 2028-03-31)에 프로젝트 조직은 없다 → 측정 책임자는 상설 조직의 실명

- ▶ **산출물 = PM의 책임 / 활용·성과 = 사업 오너의 책임**
- ▶ PM에게 매출·절감 목표를 주면 **범위 방어와 책임 회피가 합리적 행동**이 된다
- ▶ 온담: 폐기물 43억의 오너는 **오정근**(Senior User), 물류 96억은 **한동석**, 인건비율 38억은 영업본부

편익 실현은 왜 대부분 실패하는가 — Ward & Daniel의 BDN

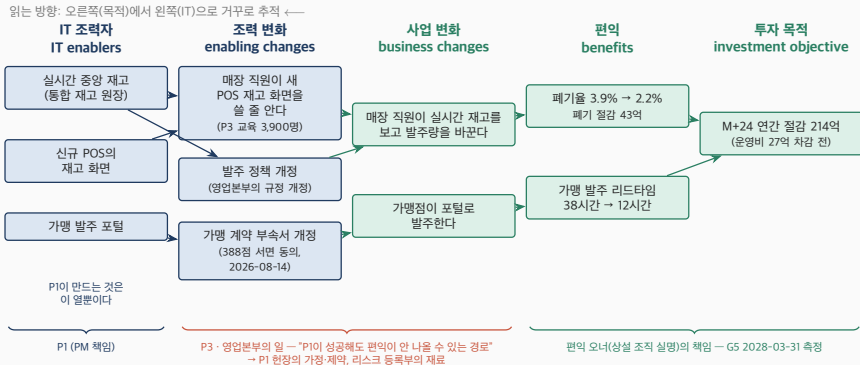


출처: Ward & Daniel (2012), Benefits Management, 2nd ed., Wiley의 Benefits Dependency Network를 온담 편익 표(B-01 폐기율, 가맹 발주 리드타임)에 적용해 재구성. 예시이며 워크북에서 다시 그린다.

그림 3-2. 온담 편익의 Benefits Dependency Network — IT 조력자 → 조력 변화 → 사업 변화 → 편익

P1이 만드는 것은 맨 왼쪽뿐 — "P1이 성공해도 편익이 안 나올 경로"가 착수 시점에 보여야 한다

프로젝트 헌장은 권한 문서다

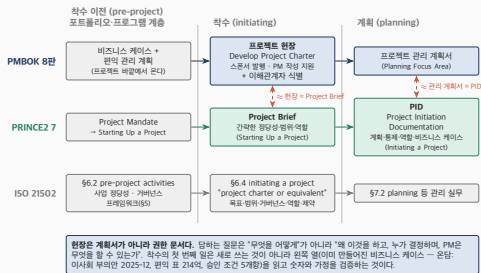

출처: PMBOK Guide 8판(PMI, 2025), PRINCE2 7(PeopleCert, 2023), ISO 21502:2020의 학수 문서 체계를 교재 3.1~3.2절에 따라 재구성.

- ▶ 헌장 = 프로젝트의 존재를 공식화하고 **PM에게 조직 자원을 쓸 권한을 부여하는 문서**
- ▶ 답하는 질문은 "무엇을 어떻게"가 아니라 **"왜 하고, 누가 결정하며, PM은 무엇을 할 수 있는가"**
- ▶ PMBOK 헌장 ≈ PRINCE2 **Project Brief**(→ PID) ≈ ISO 21502 §6.4 "charter or equivalent"

그림 3-3. 학수 문서 흐름 — BC → 헌장 → 계획서

워크북 헌장 = Project Brief에 PID의 핵심(권한·허용범위·완료 기준)을 엮은 15개 항목

목적 — 3~5문장, 반드시 숫자

- ▶ 흔한 오류: **솔루션을 목적으로** — ”차세대 플랫폼을 구축한다”는 목적이 아니다
- ▶ 온담: ”패치가 중단된 시스템으로 615개 매장의 결제를 처리하고, 연 98.7억어치가 폐기되며, 2027 IPO 전에 벗어나야 한다” — **프로젝트가 없어져도 남는 문장**

성공 기준 — 두 층으로 분리

- ▶ 프로젝트 관리 성공(PM 책임): 2027-05-29까지 156억 한도 내 다섯 산출물 인도, SAC 충족
- ▶ 프로젝트 성공(편익 오너 책임): M+24 폐기율 2.2%, 결품률 1.5%, 리드타임 12h — **측정 책임자 실명**

흔한 오류 — 편익 목표를 PM의 성공 기준에 넣는 것

현장 항목 ② 범위 / 제외 범위 — 무엇을 만들지 않는가

- ▶ 무엇을 만드는가보다 **무엇을 만들지 않는가**가 더 중요 — 제외 범위 없는 현장은 범위 팽창의 초대장
- ▶ P1 제외: SAP ECC 교체 / 이천 설비·WMS(P2) / 교육·가맹 계약 개정(P3) / 규제 등록 자체(P4) / 운영 조직(P5)
- ▶ 각 제외 항목에 **”그러면 누가 하는가”**를 붙인다
- ▶ 흔한 오류: ”기타 협의된 사항”처럼 모호하게

제외 범위는 포함 범위와 같은 무게, 같은 분량으로

예산 요약 — 하나의 숫자가 아니라 총

승인 예산	집행 한도	계획 원가	PM 통제 컨틴전시	관리에비비 (스폰서)
168.0억	156.0억	145.8억	10.2억	12.0억

가정 = 참이라고 믿고 계획하지만 확인되지 않은 것 / 제약 = 바꿀 수 없는 것

- ▶ 제약: 컷오버 창 2027-02-26~28, 규제 기한 2개, 집행 한도, FP 12,400점 계약
- ▶ 가정: P2 인터페이스 준비 / 대성로지스 준실시간 API 합의 / 가맹 부속서 2026-08-14 / 박세연의 13분 분석 시간

가정은 리스크 등록부의 첫 번째 원천 — 가정이 틀리면 그것이 리스크

현장 항목 ④ 거버넌스와 PM 권한 — 현장의 심장

- ▶ 스폰서(정미란), 운영위 구성·주기(월 1회), 에스컬레이션 경로
- ▶ 변경 통제 경로: CCB 월 셋째 목요일 / 변경협의체 격주 수요일
- ▶ **PM이 스스로 결정할 수 있는 범위**: 원가 +6%(10.08억), 일정 +15영업일, 범위 ±35건, 컨틴 전시 10.2억
- ▶ 흔한 오류: "PM은 프로젝트를 총괄한다" 한 줄

리스크(5~10개, 프리모템 결과) · 이해관계자 요약 · 승인 — 서명 없는 현장은 현장이 아니다

한국 기업에서 현장이 형식화되는 네 가지 이유 → 실질화하는 다섯 가지 방법

왜 형식이 되는가

1. 결정이 현장 **밖에서** 이미 내려졌다 — 부의안·품의서의 사본
2. PM 권한 항목을 채울 권한이 PM에게 없다 — 전결 5억과 안 맞는다
3. 스폰서가 현장을 읽지 않는다 — 대리 서명, 전자결재 자동 승인
4. 현장이 계약서와 충돌한다 — SI의 진짜 범위 문서는 계약서

어떻게 살리는가 — 스폰서에게 결정을 요구

1. 현장을 **결정 요청서**로 — 우선순위·허용범위·편익 오너·미확정 가정을 빈칸으로
2. **가정·제약 목록을 가장 긴 항목으로**
3. PM 권한을 **위임전결규정과 대조**
4. **과거 실패에 대한 답**을 넣는다 — 승인 조건 5항
5. **게이트마다 다시 연다** — G1·G2·G3

여러분의 마지막 현장에는 여덟 가지 오류 중 몇 개가 해당하는가

이해관계자 — Mitchell-Agle-Wood 현저성 모델 (1997, AMR): 3속성 7유형

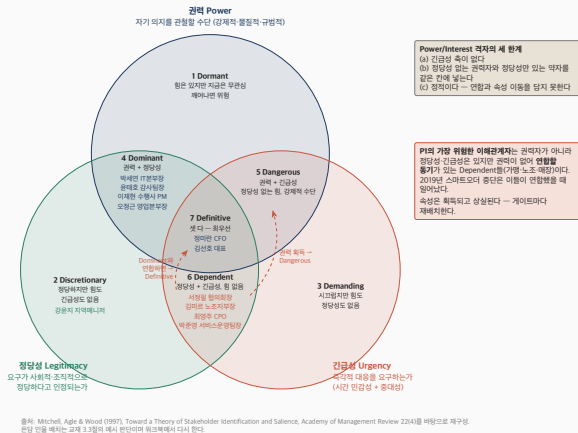


그림 3-4. 권력 · 정당성 · 긴급성의 벤 다이어그램 7유형 + 온담 인물 (G0 예시 판단)

Power/Interest 격자의 세 한계 — 긴급성 축 없음 / 권력자와 약자를 같은 칸에 / 정적

권력이 있는 쪽

- ▶ **정미란 CFO** — P+L+U, Definitive
- ▶ **김선호 대표** — Definitive, 일상은 Dormant 처럼 → 게이트에서 깨어난다
- ▶ **오정근** Dominant → 가맹 반발 시 Definitive
- ▶ **박세연** Dominant — 권력의 원천은 직위가 아니라 **지식**(유일한 해독자)

권력이 없는 쪽 — 연합할 동기

- ▶ **서정필 협의회장** — L+U, Dependent. 388점 서면 동의 거부라는 집합적 권력 → 오정근과 연합 시 Definitive
- ▶ **김미르 노조 지부장** — Dependent → **Dangerous** 가능
- ▶ **최영주 CPO** — Dependent, 박세연이 움직여야
- ▶ **강윤지 지역매니저** — Discretionary → 슈퍼유저 124명 대표가 되면 활용률 좌우

속성은 고정되어 있지 않다 — 2019년의 실패는 정당성·긴급성만 있는 이들이 연합했을 때 일어났다

서구 문헌에 잘 안 나오지만 한국에서 결정적인

- ▶ **노동조합** — 인력 효율이 편익로 명시된 프로그램에서 착수부터 Definitive에 가깝다
- ▶ **가맹점주협의회** — 데이터와 단말은 가맹점주 소유. "우리 시스템"의 절반은 본사 것이 아니다
- ▶ **감사실 / 준법** — "어떤 문서가 있으면 지적하지 않을 것인가"를 착수에 묻는다
- ▶ **그룹 지주사 / 별도 법인** — 계약 주체 둘, 개인정보 처리자 둘, 보안 정책 둘

참여 계획 — 분석은 대응이 있어야 의미가 있다

- ▶ 현재 참여 수준 → 목표 수준 → 간극을 메울 **행동** (unaware / resistant / neutral / supportive / leading)
- ▶ 서정필: "발주 포털은 환영, 데이터·단말은 저항" → 한 사람을 두 행으로. 행동은 **오정근을 통해**, 2026-08-14 이전

행동에 이름과 날짜가 없는 참여 계획은 계획이 아니다

1. 착수의 첫 번째 일은 **이미 만들어진 BC의 숫자와 가정을 검증**하고 결함을 목록으로 만들어 스폰서에게 결정을 요구하는 것
2. **산출물은 PM의 책임, 활용·성과는 사업 오너의 책임(ITO)**. 편익 오너는 **상설 조직의 실명**
3. 편익은 기술이 아니라 조직 변화에서 나온다(BDN) — P1이 성공해도 편익이 안 나올 경로가 착수 시점에 보여야 한다
4. 현장은 계획서가 아니라 **권한 문서** — 제외 범위·예산 총·가정·PM 권한을 채우고, 스폰서가 결정할 빈칸을 남긴다
5. 3속성·7유형으로 보면 P1의 가장 위험한 이해관계자는 권력자가 아니라 **연합할 동기가 있는 Dependent들**

다음 교시는 바로 실습 ① — 워크북 §1·§2와 온담 정보를 준비한다

**4교시 (90분) — 실습 ①: 온담 P1 비즈니스
스 케이스 요약 + 프로젝트 현장**

- ▶ 산출물 ① 비즈니스 케이스 요약 — 워크북 §1, 약 35분. P1 뭇만 발라내고 각 숫자의 분모와 책임자를 확인한 두 쪽
- ▶ 산출물 ② 프로젝트 헌장 — 워크북 §2, 약 50분. 15개 항목 중 목적·성공 기준·범위/제외·예산 총·가정/제약·PM 권한·우선순위·완료 기준
- ▶ 진행: 과제 지시 → 작성 요령 → 흔한 오류 점검 → 완성 예시본과 대조
- ▶ 준비물: 워크북 §0.3 온담 한 페이지 요약, §1.4·§2.4 빈 템플릿, §1.5·§2.5 완성 예시본
- ▶ 3~7년차: 각 절의 심화 과제(자기 회사 프로젝트로 같은 문서)를 병행

예시본은 "정답"이 아니라 "판단의 흔적이 보이는 문서"다

- ▶ **과제:** 워크북 §1.4 빈 템플릿 9개 항목 중 **항목 2(전략적 배경) · 4(편익) · 6(재무 평가) · 9(편익 책임자)**를 온담 P1로 채우라
- ▶ 나머지 항목은 §1.5 예시본을 읽고 확인
- ▶ 왜 PM이 다시 쓰는가: 승인 문서의 숫자를 PM이 검산하지 않으면 그 숫자는 나중에 **PM의 약속**이 된다 — 214억 안의 ”물류 96억”은 P2 설비의 숫자
- ▶ BC는 게이트마다 갱신되는 살아 있는 문서 — 갱신 기준선이 없으면 중단 결정을 못 내리는 좀비

시간이 부족하면 항목 4(편익)와 9(책임자)만 — 이 둘이 현장 성공 기준의 입력이다

항목 2 전략적 배경 — ”왜 지금인가”

- ▶ 3~5문단, 문단마다 숫자 하나 이상. 현재 상태를 측정값으로(폐기율 3.9%), **분모**를 밝히고(취급원가 2,530억)
- ▶ 온담의 세 압력 — 기술 부채 한계 / IPO 시계 / 규제 시행일 + 두 번의 실패 이력. **do-nothing**을 한 문단 이상

항목 3 대안 검토 — 최소 셋 + 기각된 대안 하나

- ▶ ① 현행 유지 ② do-minimum(OS 마이그레이션 + 인터페이스 문서화, 약 18억) ③ 상용 리테일 패키지 — 기각 ④ 제안안 168억
- ▶ 기각 사유 한 줄이라도 반드시 — ”가맹·B2B·직영 세 모델을 한 패키지가 못 다루고 SAP 병행 요건 미충족”

do-nothing = ”OS 지원 종료 상태로 615개 매장 결제를 계속 처리한다”

- ▶ **항목 4 편익** — 기준값·목표값·시점·금액·산출 분모·측정 책임자. P1 직접($43+37+38 = 118$ 억)과 P2 의존(물류 96억)을 분리
- ▶ **항목 5 비용** — 구축 8항목과 운영(연 $27\text{억} \times 3\text{년} = 81\text{억}$) 구분, 3층($168.0 / 156.0 / 145.8$) 정의, 5년 TCO 한 줄
- ▶ **항목 6 재무 평가** — 회수기간 약 3.4년 / NPV(8%, 5년) 약 +134억 / 민감도 70%: +16, 50%: -63 / **손익분기 편익 실현률 약 66%**
- ▶ **항목 9 편익 책임자** — 직책과 실명: 폐기율·결품률·인건비율 오정근 / 재고 정확도 한동석 / 검토 시점은 종료 후(M+12, G5)

PM은 한 명도 없다 — G5에 PM은 그 자리에 없다. 이 표의 서명이 현장 서명보다 어렵고, 그래서 더 중요하다

- ▶ 원본 승인 문서(2025-12 이사회 부의안)를 적지 않아 요약본이 독립 문서처럼 돌아다닌다
- ▶ 솔루션을 배경으로("클라우드 POS가 필요하다") / 형용사만 있고 숫자가 없다("노후화가 심각하다")
- ▶ 제안안 하나만 적고 "대안 없음" / 214억을 그대로 옮기고 분모를 확인하지 않았다 / 측정 책임자 "추후 지정"
- ▶ 편익 100% 실현 전제로 IRR 40% / 할인율이 없다 / 리스크 칸에 "일정 지연" 같은 일반론
- ▶ 이사회 승인 조건 5개를 빠뜨렸다 / 다음 갱신 시점(G1 2026-04-30)이 없다

점검 질문 — 편익 표 모든 행에 분모와 실명이 있는가 / 손익분기 실현률을 한 문장으로 말할 수 있는가

- ▶ 왜 P1 편익을 **118억**으로 한정했는가
- ▶ 왜 do-minimum을 G1까지 **폴백**으로 남겼는가 — 예산 삭감이 곧 중단이 된 2019년의 결말
- ▶ 왜 손익분기 **66%**를 굳이 계산했는가
- ▶ 왜 재고 정확도 분모 문제를 별도 항목으로 뺐는가

완성 예시 PDF: [템플릿/PM_Day1/01_비즈니스케이스요약_완성예시.pdf](#)

- ▶ **과제**: 워크북 §2.4 빈 템플릿 15개 항목 중 **2(목적) · 3(성공 기준) · 5(범위/제외) · 8(예산) · 9(가정/제약) · 12(거버넌스·PM 권한) · 13(우선순위) · 14(완료 기준)**. 나머지 7개는 §2.5 예시본으로 확인
- ▶ 헌장이 답하는 질문은 여섯 개뿐: **왜 / 무엇이 성공 / 어디까지 / 누가 결정 / PM은 무엇을 혼자 결정 / 언제 끝**
- ▶ 없을 때 터지는 것: **범위 경계 분쟁**(가맹 단말 교체 비용) / **PM 권한의 공백**(전결 5억 vs 10.08억) / **성공 기준 부재**(2019 "중단"이 실패인지 손절인지 판정 불가)

가장 중요한 칸은 "무엇을 만드는가"가 아니라 "무엇을 만들지 않는가"와 "누가 무엇을 결정하는가"

- ▶ **항목 2 목적** — 3~5문장, 숫자 필수, 편익 문서 ID 인용. 오류: "플랫폼을 구축한다"(수단) / 프로그램 전체의 목적을 그대로(P1 ≠ ONE ONDAM)
- ▶ **항목 3 성공 기준** — 표: 지표 / 목표값 / **판정 시점** / **판정자**. 관리 성공(G4): +15영업일·+6% 이내, RTM 100%, 결함밀도 0.4건/FP, SAC 0건 / 프로젝트 성공(G5): §1 편익 표 인용
- ▶ **항목 5 범위** — 제외를 포함과 **같은 무게로**, 각 제외에 "그러면 누가 하는가". 제외에 **가맹점 단말 하드웨어 교체** 추가
- ▶ **경계 조건**: 가맹 단말은 기존 HW에 SW 배포까지 / 3PL WMS 연동 명세는 작성하되 계약 변경 협상은 물류본부

오류 — "기타 부대 업무 일체": 수행사는 무한 범위로, 발주사는 무상 서비스로 읽는다

작성 요령 ④ — 예산 · 가정/제약 · PM 권한 · 우선순위 · 완료 기준 (항목 8·9·12·13·14)

- ▶ **8 예산** — 3층 표 + 컨틴전시(PM 10.2억, 단 5,000만 원 이상 단일 건은 CFO 결재)와 관리에 비비(스폰서 12.0억) 구분
- ▶ **9 가정/제약** — 가정에 **확인 시점·책임자**(3PL 2026-06 한동석 / 부속서 2026-08-14 오정근 / 겸임 투입률 50% 박세연), 제약에 **출처**
- ▶ **12 PM 권한** — 허용범위 표 + 에스컬레이션 3단계 + **"PM은 이 범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다"** + 전결 충돌 처리
- ▶ **13 우선순위** — 고정 / 조정 가능 / 수용. **스폰서가 결정**. 예시본: 컷오버 창 고정, 원가 한도 내 고정, 범위(옴니채널 고도화)를 조정 변수로
- ▶ **14 완료 기준** — 정상 종료(G4 SAC 0건, 판정 박준영·승인 정미란) + **조기 종료 조건**(손익분기 66% 미달 전망 / 컷오버 창 2회 이탈)

세 개를 다 고정하면 조정 변수는 품질뿐 = 결함을 운영으로 넘긴다는 뜻

- ▶ 키포프 발표 자료로 대체 / 목적 칸에 솔루션 / 제외 범위 비움 / 예산을 한 숫자로
- ▶ PM 권한을 "총괄"로 / 편익 목표를 PM 성공 기준에 / 가정을 안 적음 / 스폰서가 읽지 않은 현장에 서명
- ▶ 승인자 칸에 "경영진"·"운영위원회" — 위원회는 서명하지 않는다
- ▶ 우선순위를 전부 "고정"으로 — 희망이지 우선순위가 아님 / 종료 조건이 없어 무한 하자보수
- ▶ Senior User 서명 없이 나중에 "우리는 동의한 적 없다"

점검 — PM이 스폰서에게 묻지 않고 결정할 수 있는 금액과 기간을 한 문장으로 말할 수 있는가

- ▶ 왜 제외 범위에 **가맹점 단말 HW**를 굵게 / 왜 성공 기준을 **두 층**으로
- ▶ 왜 우선순위에서 **범위**를 조정 변수로 / 왜 **”초과가 예상되는 시점”**이라고 썼는가
- ▶ 왜 허용범위 10.08억과 전결 5억의 **충돌을 현장에** 적었는가
- ▶ 왜 조기 종료 조건에 **손실 확정 절차**까지 넣었는가

완성 예시 PDF: [템플릿/PM_Day1/02_프로젝트현장_완성예시.pdf](#)

4교시 정리 — 두 문서에서 반복된 규칙

1. **숫자에는 값·단위·출처·분모** — 214억이 아니라 ”P1 직접 118억(43+37+38), 분모 취급원가 2,530억, 운영비 27억 미차감”
2. **사람은 부서명이 아니라 직책·실명**, 편익 책임자는 PM이 아니다 — G5에 PM은 그 자리에 없다
3. 헌장은 채워 넣는 문서가 아니라 **스폰서에게 결정을 요구하는 문서** — 우선순위·허용범위·편익 오너·미확정 가정
4. **PM이 통제하지 못하는 것을 문서로 남기는 것**(가정·제약·제외 범위)이 PM의 권한을 지키는 방법
5. BC의 66%와 헌장의 조기 종료 조건은 한 줄로 이어진다 — 오늘 쓴 것은 G1(2026-04-30)에 v1.0→v1.1로 확정되는 **초안**


5교시가 설명하는 것 — ”방금 쓴 PM 권한 칸이 왜 그렇게 쓰기 어려웠는가”

**5교시 (75분) — 거버넌스 · 권한 없는 PM ·
프리모템 · 분야별 착수 노하우**

- ▶ 거버넌스 — 스폰서·운영위원회·PMO·PM의 권한 구조 [§3.4]: Manage by Exception과 허용범위 격자 / ”권한 없는 PM”이 한국에서 왜 일반적이며 어떻게 일하는가
- ▶ 초기 리스크와 프리모템 [§3.5]: 착수 시점 리스크의 세 원천 / 계획 오류와 외부 시각 / Gary Klein의 프리모템
- ▶ 분야별 착수 노하우 — SI, 건설·EPC, 제조 NPD, 제약 [§3.6]
- ▶ 6교시 실습 ②(이해관계자 등록부·RACI·프리모템)의 이론 부분

4교시에서 현장 항목 12를 쓰며 막혔던 지점 — ”PM 권한을 무엇으로 채우나” — 이 §3.4의 출발점

거버넌스 — 조직도가 아니라 결정의 흐름

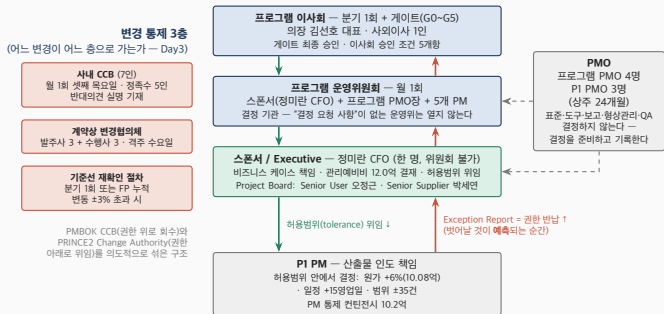

거버넌스는 조직도가 아니라 결정의 흐름이다 — 어떤 종류의 결정이 어디서 얼마 안에 내려지는가. 이 그림의 화살표(위임 ↓ / 예외 ↑)가 상자보다 중요하다. 검증 두 가지: ① 원가 허용범위 10.08억 vs 본부장 위임전결 한도 5억 — 사내 규정과 맞는가 ② 편익 -5%p 허용범위(≈10.7억) — Business Case의 편익 민감도와 맞는가

출처: 사례 문서 『위임담F&B홀딩스』 §4.1-§5.6과 PRINCE2 7의 Manage by Exception을 교재 3.4절에 따라 재구성.

그림 3-5. 온담 P1 거버넌스 — 결정의 흐름(위임↓ / 예외↑)과 변경 통제 3층

어떤 종류의 결정이 어디서 얼마 안에 내려지는지가 그려져야 한다 — 조직도 그리기가 아니다

구성 요소	원칙	온담 P1
스폰서 (Executive)	자원을 대고 BC에 책임. 한 명 . 위원회는 스폰서가 될 수 없다	정미란 CFO — 프로그램 스폰서 겸임(P1 별도 스폰서 없음)
운영위원회	스폰서가 의장인 결정 기관. "결정 요청 사항"이 없는 운영위는 열지 않는 편이 낫다	프로그램 운영위(월 1회) + 프로그램 이사회(분기 + 게이트, 의장 김선호)
PMO	표준·도구·보고·형상관리·QA 지원. PMO는 결정하지 않는다 — 결정을 준비하고 기록한다	프로그램 PMO 4 + P1 PMO 3(상주 24개월, 12.6억) + P2 PMO 2
PM	산출물 인도, 허용범위 안에서 결정, 벗어나면 에스컬레이션	
변경 통제 기구	권한 회수(CCB)와 권한 위임(Change Authority)을 구분	3층 — 사내 CCB(7인, 정족수 5, 반대의견 실명) / 변경협의체(3+3) / 기준선 재확인(분기 또는 FP ±3%)

PMO가 결정하기 시작하면 스폰서가 결정하지 않게 된다

Manage by Exception — 허용범위 격자 (온담 초안, 사례 §5.6)

팀 리더 · 수행사 PL: P1 PM — 이 일 안에서는 묻지 않고 결정 스폰서 · 프로그램 운영위

성과목표측 \ 계층	작업패키지 work package	프로젝트 (P1) project	프로그램 programme
원가 (cost)	+2%	+6% (10.08억)	+12%
일정 (time)	+5영업일	+15영업일	+30영업일
범위 (scope)	±1%	±3% (±35건)	±6%
품질 (quality)	결함일도 0.13건/FP	0.4건/FP	0.8건/FP
리스크 (risk)	EMV 2.7억	EMV 8억	EMV 16억
편익 (benefits)	-1.7%p	-5%p	-10%p
안전-지속가능성	0	0	0

검증 ① 사내 규정과 맞는가
원가 허용범위 10.08억 > 본부장 위임전결
한도 5억 → 불일치. 한량에 적고 스폰서가 결정

검증 ② Business Case의 편익 민감도와
맞는가
편익 -5%p = 21.4억의 약 10.7억이 사라져도
프로젝트 계층에서 처리한다는 뜻 → CFO
"근거 없는 편익은 숨긴 않겠다" 상황에서
적절한가

허용범위를 전 프로젝트 공통 "+10%"로
박으면 격차는 장식이 된다 → 편익 민감도에서
역신한다

벗어날 것이 예측되면
→ Exception Report로
권한을 오른쪽 계층에 반납

→ 스폰서에게 반납
(실제로 벗어난 후가 아니라
예측되는 순간)

→ 프로그램 이사회

- ▶ P1 PM은 원가 10.08억 · 일정 15영업일 · 범위 ±35건 안에서 **스폰서에게 묻지 않고 결정한다**
- ▶ 검증 ① **사내 규정** — 원가 10.08억은 본부장 위임전결 5억을 초과
- ▶ 검증 ② **BC 편익 민감도** — 편익 -5%p = 약 10.7억이 사라져도 프로젝트 계층에서 처리한다는 뜻

출처: PRINCE2 7의 7 성과목표측 × 3 계층 허용범위 격자에 사례 문서 §5.6의 온담 허용범위 초안을 대입해 재구성.

그림 3-6. 허용범위 격자 7축 × 3계층 (온담 초안 수치)

벗어날 것이 예측되는 순간(실제로 벗어난 후가 아니라) Exception Report

”권한 없는 PM”이 한국에서 왜 일반적인가

- ▶ 예산 집행권은 재경과 본부장에게, 인사권은 부서장에게, 계약 변경권은 구매·법무에게, 요구 사항 확정권은 현업 임원에게 — PM에게 남는 것은 **일정표와 회의 소집권**
- ▶ 개인의 문제가 아니라 **구조의 문제** — 이유 셋
- ▶ ① **매트릭스 조직에서 기능 부서의 권한이 프로젝트의 권한보다 세다** — 임시조직에 권한을 주면 영구조직이 잃는다
- ▶ ② **위임전결규정이 직위 기준이지 역할 기준이 아니다** — ”본부장 5억”은 있어도 ”PM 10억”은 없다
- ▶ ③ **스폰서가 권한을 위임하지 않고 보고를 요구한다** — 허용범위가 없으니 모든 결정이 보고 대상

보고가 많으니 PM은 결정하는 사람이 아니라 보고하는 사람이 된다

- ▶ ① **허용범위를 문서로 획득한다** — ”PM은 총괄한다”가 아니라 ”PM은 원가 10.08억, 일정 15 영업일, 범위 ± 35 건 안에서 결정한다”를 **스폰서 서명**으로
- ▶ ② **결정을 결정권자에게 가져간다** — **선택지 + 권고 + 기한을 붙여서** — 스폰서는 결정하거나 결정하지 않은 책임을 진다. 어느 쪽이든 **기록된다**
- ▶ ③ **에스컬레이션을 BATNA로 쓰지 않는다** — 한 번 쓰면 관계 자본이 소진되고, 임원이 PM 편을 들지 않으면 공개적으로 무너진다
- ▶ 영향력의 실체는 **상대의 BATNA** — 박세연이 인터페이스 분석에 시간을 내지 않으면 그가 잃는 것은 ”우리 손으로 운영할 수 있는 시스템”이라는 그 자신의 목표

”권고는 (b). 결정 기한은 2026-06-30, 그 이후는 (a)만 남는다”

착수 시점의 리스크는 어디서 나오는가 — 세 원천

원천	질문	온담 P1
가정에서	현장의 가정 각 항목 — ”이 가정이 틀리면 무엇이 일어나는가”	”대성로지스가 준실시간 API에 합의한다”가 틀리면 → 센터 재고가 야간 배치로 남고 → 재고 정확도 98.5%가 구조적으로 불가능 → B-02·B-03·B-04가 흔들린다. 2022년에 정확히 이것이 일어났다
구조에서	임시조직론·Engwall의 ”이미 결정된 것들”	통제 밖 의존(P2, 3PL, 규제, 노조) / 과거 실패의 반복 패턴 / 이해관계자 연합 가능성 / 핵심 인물 의존 (박세연 — OD-POS 원 개발자 3명 중 재직 1명)
base rate에서	1교시 §1.2 reference class	정보화 사업 4건 중 2건 중단·축소 / IT 원가 초과의 먹함수 분포 — ”이 프로젝트는 다르다”는 믿음에 대한 외부 시각

아직 WBS도 일정도 없다 — 착수 시점 리스크는 활동 단위가 아니라 가정·구조·base rate 단위


- ▶ Kahneman & Tversky(1979): 사람들은 과제 완료 시간을 체계적으로 과소추정한다
- ▶ Buehler, Griffin & Ross(1994): **자기 과거 실적 정보를 주어도 예측이 개선되지 않는다**
- ▶ **내부 시각**: 세부 계획을 보고 "이렇게 하면 된다" / **외부 시각**: 유사 프로젝트들의 한 사례로 보고 "그 부류는 대개 이렇게 되었다"
- ▶ Lovallo & Kahneman(2003, HBR)이 경영 언어로, Flyvbjerg의 RCF가 절차로
- ▶ "17개월·156억이 맞는가"보다 먼저 — **"비슷한 회사가 비슷한 재구축을 했을 때 대개 얼마나 초과했는가"**

그 데이터가 없다면 — 대개 없다 — "데이터가 없다"는 사실 자체가 첫 번째 리스크

프리모템(premortem) 절차 — Klein (2007)



설계 핵심 (a) — 문법이 효과를 만든다 (prospective hindsight)



프리모템의 자리 — 한 번이 아니라 계획이 있는 시점마다



출처: Klein (2007), Performing a Project Premortem, Harvard Business Review; Mitchell, Russo & Pennington (1989), Back to the future, J. Behavioral Decision Making 2(1)를 바탕으로 재구성.

그림 3-7. 프리모템 절차와 "실패했다"의 문법 — prospective hindsight (Mitchell, Russo & Pennington, 1989)

"지금은 프로젝트가 끝난 시점이고, 완전히 실패했다. 각자 2분 동안 그 실패의 이유를 적으라"

P1에서 나올 법한 실패 이유 — 여러 항목이 같은 원인을 가리킨다

- ▶ 가맹 388점 중 140점이 새 POS 배포 거부, 두 시스템 병행
- ▶ G2 정보 결정이 박세연 한 사람에게 걸려 두 달 지연
- ▶ P2 41주로 물류 인터페이스 시험이 컷오버 후로
- ▶ CFO 148억 축소로 전환 용역 11.4억이 2027년으로, 리허설 3회→1회 / 수행사 대기 시간 변경대가 청구
- ▶ 오픈 첫 달 615개 매장 콜이 서비스데스크 11명에게, SAC 미충족으로 인수 거부

공통 원인(가맹 협상 · 핵심 인물 · 프로그램 의존 · 재무 압박)이 최우선 리스크

- ▶ 착수 시점에 이미 계약이 있다 — SI PM의 일은 현장을 쓰는 것이 아니라 **계약 문서를 읽고 현장으로 번역하는 것**
- ▶ ① **세 문서의 우선순위**: 계약서 > 과업지시서 > 제안서. 제안서는 **”단방향 확대 문서”** — ”무상 3개월 안정화”, ”AI 자동 분류”가 그대로 과업이 된다
- ▶ ② **규모 기준선**: FP 12,400점 × 55만 원 = 68.2억. FP는 측정치가 아니라 **협상 인공물** — G1 ”FP 기준선 확인서 서명”
- ▶ ③ **인터페이스 상대의 소유자**: 47본 중 문서 부재 13본, 3PL WMS, 은행·PG 7본 — **”누가 상대 쪽을 준비하는가”의 이름**
- ▶ **공공 vs 민간**: 과업심의위원회·감리 의무·분리발주는 **공공 발주에만**. 온담 같은 민간에는 없다 → 계약서로 직접 만든다

SI는 컷오버 주말에 죽지 않는다 — 진짜 사인은 데이터 정제 착수 지연과 인터페이스 상대 미확정

건설·EPC — 발주 방식과 계약 유형이 리스크를 결정

- ▶ **설계 성숙도**: AACE Class 5 ~ 1. 어느 Class에서 계약하느냐가 신뢰 구간을 정한다
- ▶ Class 4 이하에서 경쟁입찰 **LSTK**는 리스크 이전이 아니라 프리미엄·변경 청구·클레임으로 되돌아온다 — 온담 P2가 정확히 이 검토 대상
- ▶ **기록 규율**(SCL Protocol): 지연 청구의 승패는 사건 당시 생성된 기록

제조 NPD — Stage-Gate의 Gate 1~2

- ▶ **게이트는 회의가 아니라 투자 결정** — Go / Kill / Hold / Recycle. 자원 약정 없는 게이트 = "이빨 없는 게이트"
- ▶ **Must-meet / Should-meet** 이원 기준 — "3.8점이니 통과"는 규제 불가 항목이 점수에 가려진 것
- ▶ **Kill이 0건인 게이트 프로세스는 고장난 것**

온담에 던질 질문 — G1에서 P1을 중단할 수 있는가, 기준은, 중단 결정자는 착수 결정자와 다른가

- ▶ 착수는 규제 경로 결정에서 시작: IND → 임상 → NDA / 510(k) · De Novo · PMA / SW 의료기기는 IEC 62304 등급. 경로가 정해지면 게이트는 협상 불가
- ▶ (a) 제출 순간 문서 세트가 잠긴다 (b) 심사 시계는 제출자가 통제 못 한다 (c) 추가자료 요구는 시계를 멈추고 재개 시점을 상대가 정한다 → float가 성립하지 않는다
- ▶ 착수 오류: **추가자료 라운드 0회로 가정**한 뒤 출시일 공표. 처방: 라운드 수를 같은 경로의 과거 제출 건(reference class)에서 분포로
- ▶ ”규제가 애자일을 막는다”는 통념은 틀렸다 — GAMP 5 2판, FDA CSA. 개발 리듬과 산출물 베이스라인을 분리
- ▶ 온담 P4: 개인정보 보호법 개정 대응(2026-09-11), 전자금융업 등록(심사 2027-03-31), ISMS-P(2027-06)

최영주: ”시행일은 협상 대상이 아니다” — 규제 해석을 착수 시점에 서면으로 받아 두라

네 분야가 착수에서 공유하는 네 질문

1. 무엇이 이미 결정되어 있는가 — 계약, 설계 성숙도, 규제 경로, 게이트 기준
2. 어느 결정이 되돌릴 수 없는가 — FP 기준선, 설비 발주, 금형, 규제 제출
3. 누가 그 결정을 소유하는가
4. 그것을 문서로 남겼는가

현장은 이 네 질문의 답을 적는 곳이다

1. 거버넌스는 조직도가 아니라 **결정의 흐름**. 허용범위 격자(7축 × 3계층)가 PM이 권한을 얻는 유일한 표준 근거 경로 — 전결 규정과 편익 민감도 양쪽으로 검증
2. 권한 없는 PM은 구조의 문제. 처방 셋 — **허용범위를 서명으로 획득 / 선택지·권고·기한과 함께 결정을 가져간다 / 에스컬레이션을 BATNA로 쓰지 않는다**
3. 착수 시점 리스크는 **가정·구조·base rate**에서 나온다. 자기 과거 실적을 알아도 예측은 개선되지 않는다 → outside view
4. 프리모템(Klein, 2007)은 **”실패했다. 왜”**의 문법으로 반대자의 발언을 과제로 만든다. 게이트마다 반복하고 현장·리스크 등록부에 연결
5. SI는 **계약 이후 착수** / EPC는 **설계 성숙도 × 계약 유형** / NPD는 **kill 0건이면 고장** / 제약은 **규제 게이트의 비가역성**

6교시는 바로 실습 ② — 4교시에 쓴 현장 초안을 꺼내 놓는다. §3~5는 현장을 고치는 문서들이다

**6교시 (75분) — 실습 ②: 이해관계자 등록
부 · 거버넌스·RACI · 프리모템**

- ▶ 산출물 ③ 이해관계자 등록부와 현저성 분석 — 워크북 §3, 약 25분
- ▶ 산출물 ④ 거버넌스 구조와 RACI 초안 — 워크북 §4, 약 20분
- ▶ 산출물 ⑤ 프리모템 기록과 초기 리스크 목록 — 워크북 §5, 약 25분. 조별로 실제로 실시한다
- ▶ 세 문서는 4교시 현장을 **고치**는 문서 — 등록부가 항목 11을, RACI가 항목 12를, 프리모템이 항목 9·10을 되먹인다
- ▶ 준비물: 워크북 §3.4·§4.4·§5.4 빈 템플릿, §3.5·§4.5·§5.5 완성 예시본, 4교시 현장 초안

75분에 세 산출물 — 각 산출물은 핵심 항목만 채우고 나머지는 예시본 대조와 사후 과제

- ▶ **과제:** 워크북 §3.4 템플릿으로 8명 등록 — 정미란·오정근·박세연·한동석·서정필·김미르·최영주·박준영
- ▶ 각 행에 항목 3(기대·우려·KPI), 4(P/L/U 3속성과 7유형), 5(태도 현재→목표), 6(관여 전략·관계 소유자). 그다음 **현재성 분석 요약표**
- ▶ 등록부의 가치는 명단이 아니라 **분석 열**에 있다 — 어떤 힘, 쓸 정당성, 지금 움직이려 하는가. 그리고 그 셋은 **바뀐다**
- ▶ 없을 때 터지는 것: **보이지 않던 사람이 결정적 순간에 나타난다**(김미르) / **같은 직책을 같은 방식으로 대한다**(오정근과 한동석)

”요구할 정당성은 없지만 멈출 힘이 있는 사람”을 찾아 적는 것이 등록부의 절반

- ▶ 항목 3 기대·우려 — 그 사람의 말로. 박세연의 우려: 벤더 종속, 그리고 **자신이 만든 OD-POS**와 문서 없는 13본이 **"실패"**로 서술되는 것 — 공식 입장에 없지만 등록부에는 있어야
- ▶ 항목 4 3속성·유형 — 판정 시점(G0)을 적고 바뀔 시점과 방향을 비교예. 서정필 L+U 의존
→ 2026-08 협상에서 거부권이 실질 권력 → 확정 / **김미르 P+U 위험**
- ▶ 항목 5 태도 — 무인지/저항/중립/지지/주도, "현재 → 목표". **저항은 정보다** — 오정근의 저항은 2019년의 경험
- ▶ 항목 6 관여 전략·관계 소유자 — 외부 협상 상대의 소유자는 PM이 아니라 소관 임원: 서정필
→ **오정근** / 김미르 → **한동석** / 윤태호 → P1 PM

오류 — 직급으로 권력 판정(나영선의 P1 권력은 CCB 표 하나) / 긴급성 무시 / 한 번 판정하고 갱신 안 함

- ▶ 부서명만 적고 사람을 안 적었다(“영업본부”) — 부서는 우려를 갖지 않는다 / 임원만 적고 실무 접점자(구매팀장, 재경팀장, 지역매니저)를 뺐다
- ▶ “영향받는 자”(매장 직원, 물류 현장)를 뺐다 — 요구하지 않지만 결과를 매일 겪는다
- ▶ PM의 추측을 그 사람의 기대로 / 우려를 안 적음 / 모두에게 “프로젝트 성공”
- ▶ 모두 “지지” / 목표를 모두 “주도” / 저항을 개인의 결함으로
- ▶ 전략 칸에 “정기 보고”만 / 관계 소유자를 안 적어 PM이 노조 협상까지 / 착수 시 한 번 쓰고 끝

점검 — 부서명만 있는 행이 있는가 / 관계 소유자가 전부 PM인가 / “우려” 칸이 “기대” 칸과 다른가

- ▶ 왜 김미르를 **"위험"**으로 판정했는가 — 정당한 경로가 없는 권력은 비공식 경로로 행사된다.
대응은 설득이 아니라 **정당성 경로를 만들어 주는 것**
- ▶ 왜 박세연의 "우려" 칸에 공식 입장에 없는 것을 적었는가
- ▶ 왜 관계 소유자가 PM이 아닌 행이 열 개 가까이 되는가
- ▶ 왜 사모펀드와 규제기관처럼 접촉하지 않는 이해관계자를 넣었는가 — 등록부는 접촉 명단이 아니라 **힘의 지도**
- ▶ 왜 정하늘 감리원의 목표 태도가 중립→중립인가 — 감리는 독립성이 가치

완성 예시 PDF: [템플릿/PM_Day1/03_이해관계자등록부_완성예시.pdf](#)

- ▶ **과제:** 워크북 §4.4 템플릿의 **항목 2(3역할과 핵심 직위)**와 **항목 5(RACI)** 10행. 항목 1·3·4는 §4.5 예시본으로 확인
- ▶ **RACI 규칙 셋:** 행마다 A는 정확히 한 명 / R은 여럿 가능하나 조정자 필요 / C가 많으면 느려지고 I가 많으면 아무도 안 읽는다. **행은 활동이 아니라 결정과 산출물**
- ▶ **항목 2 3역할** — Executive 정미란 / Senior User 오정근 / Senior Supplier **박세연**(수행사 이재현은 그 아래의 공급자)
- ▶ **항목 5 RACI** — 결정 행과 산출물 행 구분. **통제 밖 결정(3PL 협상, 가맹 배포 범위, P2 규격)의 A가 P1 밖의 임원임을 명시**
- ▶ “컨틴전시 집행” 행: **A = P1 PM, C = 재경팀장, I = 정미란·윤태호** — 2020 감사 지적에 대한 답은 사전 승인이 아니라 **사후 투명성**

한국 SI에서 가장 흔한 혼동 — 수행사 PM을 Senior Supplier로 적어 발주사 IT의 기술 승인 권한이 사라지는 것

- ▶ 회의체 이름만 적고 권한을 안 적음 / 정족수·반대의견 기록 방식이 없어 "전원 찬성"만 남음 / 사내 CCB와 변경협의체의 선후 관계를 안 적음
- ▶ 경로는 있는데 시한이 없다 / "필요 시 보고"(필요는 항상 사후에 판정된다) / 수행사의 에스컬레이션 경로를 뺐다
- ▶ 모든 프로젝트에 같은 $\pm 10\%$ — 허용범위는 BC 편익 민감도(손익분기 66%)에서 역산 / 작업 패키지 계층을 비워 수행사에 재량이 없다
- ▶ **A가 둘 이상인 행(공동 책임 = 무책임)** / PM이 모든 행의 A / 활동("주간 회의")을 행으로
- ▶ 위원회와 개인이 섞인 열에서 위원회 안의 누가 A인지 불명확

점검 — 모든 행에 A가 정확히 한 명인가 / 확인하지 않은 A는 A가 아니다

- ▶ **왜 P1 PM이 A인 행이 26개 중 8개뿐인가** — 착수·기획 결정 26개 중 18개의 최종 책임은 PM 밖에 있다(3PL 한동석, 가맹 배포 오정근, 아키텍처 박세연, 규제 해석 최영주, 기준선 이사회)
- ▶ **왜 컨틴전시 집행의 A를 PM으로 두고 CCB를 I로**
- ▶ **왜 가맹 SW 배포 범위(A 오정근)에 CCB·정미란을 C로** — C를 빼면 배포 범위가 조용히 줄고 P1은 G2에서 발견
- ▶ **왜 CCB와 변경협의체 순서를 문장으로 못박았는가**
- ▶ **왜 박세연의 이해 충돌(교체 대상 시스템의 설계자가 아키텍처 승인자)을 표에 기록했는가** — 정보 판정에서 그는 R이지 A가 아니고 감리 확인 병행

이 표를 스폰서에게 보여 주는 이유 — A인 사람들이 자기가 A라는 것을 알게 하기 위해서

- ▶ **과제:** 조별로 프리모템을 실시하고 §5.4 템플릿의 항목 2(실패 선언문) · 3(원문) · 4(군집화) · 5(초기 리스크 3행) · 6(즉시 조치)
- ▶ ① 진행자가 **실패 선언문**을 읽는다 — 과거형, 날짜·숫자 포함. F1 "2027-08, 컷오버 창을 놓쳐 IPO 예비심사 서류에 '구축 중'으로 기재되었다"
- ▶ ② 각자 **2분간 개별 작성** — "무엇이 일어났다"의 과거형. "~할 것 같다"는 다시 쓰게 한다
- ▶ ③ 돌아가며 한 가지씩, **편집 없이** 번호를 붙여 기록. 중복도 그대로(중복 횟수가 우선순위 정보)
- ▶ ④ 원인별로 군집화, 언급 수 + 1인 3표로 순위. 군집명은 범주("일정")가 아니라 **원인**("가맹 부속서 협상 지연")

브레인스토밍은 "요구사항 변경"을, 프리모템은 "협의회가 2026-08 부속서 서명을 거부했고 우리는 이미 가맹 SW를 개발 중이었다"를 낸다

- ▶ **항목 5** — 군집을 리스크 서술로: **원인** → **사건** → **영향**. 원인은 **현재 사실**, 사건은 **불확실한 미래**, 영향은 **목표에의 결과**. 기회 1~2건 포함
- ▶ R-01: "P2 벤더가 리드타임 34→41주 가능성을 통지한 상태다 → MC가 2027-02-12를 넘긴다 → 물류 통합시험을 G3 전에 못 하고 컷오버를 분리하거나 창을 놓친다"
- ▶ 원인 → **트리거**, 사건 → **근접성**, 영향 → **대응 방향**. Day2 정량화는 확률을 사건에, 금액을 영향에
- ▶ 소유자는 원인에 가장 가까이 있고 대응 자원을 가진 사람 — **PM이 아닌 경우가 많다**. 예시본 13개 위협 중 PM 소유는 3개
- ▶ **항목 6 즉시 조치** — 리스크 대응 계획을 기다리지 않고 **지금 바뀌어야 하는 것**: 현장 가정·제외 범위 수정, 등록부 추가, RACI 행 추가. 각 줄에 "어느 문서의 어느 항목을" + 담당·기한

오류 — 원인과 사건을 섞음("P2 지연 리스크") / 이미 발생한 이슈를 리스크로 / 기회를 안 적음


- ▶ 실패 선언문을 조건문으로("만약 ~한다면") — 그러면 브레인스토밍 / 실패의 모습이 추상적("잘 안 됐다") / 한 종류의 실패만 제시
- ▶ PM 혼자 쓴다(PM의 걱정 목록) / 임원이 참석해 발언 위축 / 운영·현업이 없어 기술 리스크만
- ▶ 수집 단계에서 토론이 시작되어 사유가 걸러진다 / PM이 "그건 이미 대응 중"이라며 삭제 / 원문을 곧바로 범주로 뭉갬
- ▶ 군집을 너무 크게("외부 요인") / 득표만 보고 언급 수 적은 치명적 사유(원 개발자 1명 이탈)를 탈락시킴
- ▶ 리스크 목록이 일반론 / 소유자 전부 PM / 이미 발생한 이슈를 리스크로 / 결과를 현장에 연결 안 함

점검 — 소유자 열에서 PM이 절반을 넘는가: 넘는다면 통제 밖 리스크를 PM이 떠안고 있거나 아직 못 찾은 것

- ▶ 예시본 구성: 세션 정보, 실패 선언문 F1~F3, 원문 15개, 군집 12개, 리스크 R-01~R-13 + O-01·O-02, 즉시 조치 7건
- ▶ 왜 실패 선언문을 **세 개**로 — F1만 주면 사유가 전부 일정으로 쏠린다. F2(제때 끝나도 편익 실패), F3(통제 밖의 것이 결합해 중단) = Flyvbjerg의 세 성공은 별개
- ▶ 왜 리스크 서술을 세 부분으로 강제했는가 / 왜 소유자에 PM이 세 번밖에 없는가(RACI 8/26과 같은 그림)
- ▶ 왜 기회를 넣었는가 / 왜 "즉시 조치"에서 현장을 고쳤는가

완성 예시 PDF: [템플릿/PM_Day1/05_프리모템리스크_완성예시.pdf](#)

다섯 문서의 상호 관계 — 순서대로 쓰지만 순서대로 완성되지 않는다

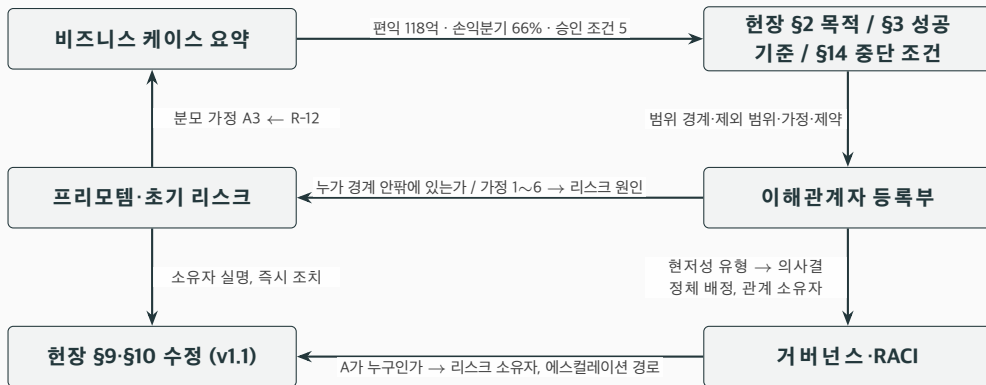

따로 쓰면 각 문서는 다른 문서가 이미 의심한 것을 계속 참이라고 말한다

1. **사람은 부서명이 아니라 직책·실명**이며, 책임(관계 소유자, RACI의 A, 리스크 소유자)은 대부분 **PM** 밖에 있다 — 관계 소유자 10행, A 8/26, 리스크 소유자 3/13
2. **PM이 통제하지 못하는 것을 문서로 남기는 것이** PM의 권한을 지키는 방법
3. 가장 위험한 이해관계자는 권력자가 아니라 **정당성 경로가 없는 권력(위험)과 연합할 동기가 있는 의존** — 대응은 정당성 경로 제공과 후원자 연결
4. 프리모템은 **”실패했다. 왜”**의 문법이고, 완료 조건은 리스크 목록이 아니라 **현장·등록부·RACI의 수정**
5. Day2로: 현장 §5·§6 → WBS / §4·§13 → RTM·MoSCoW / §7·§9 → 일정 기준선 / BC §5·현장 §8 → 원가 기준선 / 리스크 13+2건·허용범위·66% → 정량화

”내가 통제하지 못하는 것이 내 일정을 결정한다는 사실을 문서로 남기지 않은 PM은 자연이 발생했을 때 설명할 근거가 없다”


**마무리 (20분) — 학술 배경 깊이 읽기 · 읽
을 자료 · Day2 예고**

이 블록에서 배우는 것

- ▶ 오늘 인용한 학술 문헌 네 갈래를 **왜 그런가 / 언제 틀리는가**의 관점에서 다시 본다 [교재 제4장]
- ▶ Rethinking Project Management의 다섯 방향 / Morris의 front-end / Flyvbjerg의 착각과 기만 / Staw의 몰입 상승
- ▶ 읽을 자료 — 필수 · 30일 · 90일 · 참고 [제5장]
- ▶ 오늘 만든 산출물 다섯 가지와 사후 읽기 과제
- ▶ Day2 예고 — 계획: 범위·일정·원가 기준선

표준이 "이렇게 하라"고만 말하는 지점에서 학술 문헌은 "왜"와 "언제 틀리는가"를 말한다 — 그것을 아는 사람만이 테일러링할 수 있다

Rethinking Project Management (2006) — 다섯 방향이 이 교재의 뼈대다

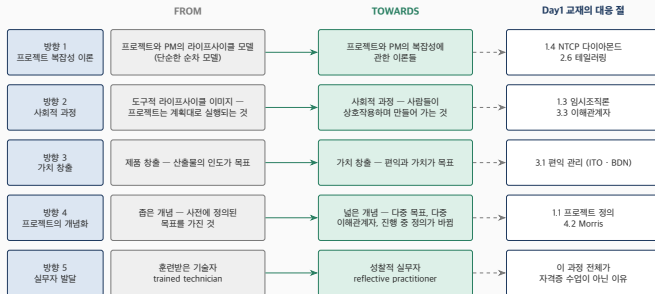

출판 오독 — 다섯 방향은 **병렬적** 방향이며 순차적 성숙 단계가 아니다. RPM은 방법론 교체("애자일이 waterfall을 대체")가 아니라 연구 대상 자체(라이프사이클 모델 → 임시조직 이론)의 교체다. PMBOK 7판(2021)의 원칙 전환은 이 논문(2006)의 15년 늦은 반영이고, 8판(2025)의 부분 회귀는 학술과 실무의 재타협이다.

출처: Winter, Smith, Morris & Cicmil (2006), Directions for future research in project management, IJPM 24(8), Table 1을 바탕으로 재구성.

그림 4-1. 다섯 방향 FROM → TOWARDS + Day1 대응 절 (Winter, Smith, Morris & Cicmil, IJPM 24(8))

표준 변경을 뉴스가 아니라 사조로 — 7판은 이 논문의 15년 늦은 반영, 8판은 학술과 실무의 재 타협


- ▶ 전자는 실행 통제(계획·감시·변경 통제), 후자는 프로젝트가 정의되는 **앞단(front-end)**, 기술, 상업, 정치까지 — 성패는 대부분 앞단에서 결정되는데 **BOK는 실행만 다룬다**
- ▶ **Samset & Volden(2016)의 역설: 정보의 가치가 가장 큰 시점에 예산·권한·데이터가 가장 적다**
- ▶ Flyvbjerg의 break-fix model — 앞단이 부실하면 실행에서 반복적 파손과 수리, 그 수리 비용이 원가 초과와 실체
- ▶ 한국 조직에서 PM은 품의서 결재 뒤에 지명된다 — 그래도 둘은 할 수 있다: ① 앞단의 결정을 목록화해 가정·리스크를 현장에 ② 종료 보고서에 "앞단의 X가 실행 중 Y의 원인"을 기록
- ▶ 오독: front-end를 "기획 문서 강화"로 — 요점은 문서량이 아니라 의사결정 권한과 **대안 유지** / "착수 지연"으로 — 처방은 think slow, **act fast**

"착수 시점에 잘못 적힌 것은 계획 시점에 고쳐지지 않는다" — 오늘 현장의 가정 목록을 길게 쓰라고 한 이유

- ▶ Flyvbjerg, Garbuio & Lovo(2009): **Delusion** — 낙관 편향·계획 오류 → 처방은 outside view·RCF / **Deception** — 전략적 왜곡 → 처방은 인센티브·책임·리스크 자본 구조의 설계
- ▶ 2021 PMJ 「Top Ten Behavioral Biases」 1위는 **strategic misrepresentation** — 편향 교육으로 정치 문제를 풀려는 헛수고
- ▶ 「Survival of the Unfittest」 — 선정되는 것은 서류상 가장 좋아 보이는 프로젝트 = 원가 최소·편익 최대로 추정한 프로젝트
- ▶ 온담 물류 96억의 분모 부재 — 착각인가 기만인가? 알 수 없고 알 필요도 없다. 처방이 같다 — 분모·측정 방법·오너 실명 없는 항목은 합계에서 제외
- ▶ **Think slow, act fast**(2023) — 학습곡선은 반복 가능한 동일 단위에서: 매장 배포는 모듈화(파일럿 12개점→확대), 전환 7.4TB·컷오버 34시간은 bespoke → 리스크 집중

CFO의 "근거 없는 항목은 승인 안 함"이 정확히 Flyvbjerg의 제도 처방이다

Staw — 몰입의 상승(escalation of commitment)과 결정자의 분리

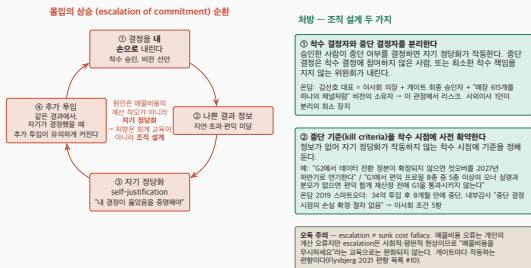

출처: Staw (1976), Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action, Organizational Behavior and Human Performance 16(1)을 바탕으로 재구성.

그림 4-2. 몰입의 상승 순환과 두 가지 조직 설계 처방

- ▶ Staw(1976): 같은 나쁜 결과에서, 그 결정을 자기가 내렸을 때 추가 투입이 유의하게 커진다 — 원인은 자기 정당화
- ▶ 처방 ① 착수 결정자와 중단 결정자를 분리 — 김선호 대표가 의장·게이트 승인자·비전 소유자, 사외이사 1인이 최소 장치
- ▶ 처방 ② 중단 기준(kill criteria)을 착수 시점에 사전 확약 — 이사회 조건 5항의 핵심

escalation은 매몰비용 계산 착오가 아니라 사회적·평판적 현상 — 게이트마다 작동한다

필수 (과정 전, 총 90분) — 사례 회사 문서 §1~3·§5 / Klein(2007) 2페이지 / 교재 §2.1 연표·§2.2 표 / Cooke-Davies(2002) 6페이지

30일 안에	왜
Flyvbjerg & Gardner, 『프로젝트 설계자』(2024)	”우리 회사 base rate은 어디서 구하나”로 남은 질문. 8시간
Winter et al.(2006), IJPM 24(8)	다섯 방향 — 표준 변경을 사조로
Lundin & Söderholm(1995) / Engwall(2003)	4T·4행위 / 착수의 진짜 일이 ”이미 결정된 것의 목록화”인 이유
Zwikael & Smyrk(2011) ITO 장	워크북 편익 프로필 ”오너 실명” 칸의 이론 원전
Eveleens & Verhoef(2010) 7페이지	제안서에서 CHAOS 수치를 빼야 하는 이유를 데이터로
Mitchell, Agle & Wood(1997) 7유형 정의 절	워크북 §3 분류 근거

읽지 않아도 되는 것 — CHAOS 원문 / Stacey matrix 2차 자료 / ”PMBOK 7판 요약” 류 시중 교재(현행은 8판)

#	산출물	워크북	PRINCE2 7 대응	상태
①	비즈니스 케이스 요약	§1	Outline Business Case (Project Brief 내)	v0.9 — G1(2026-04-30)에 v1.0 확정
②	프로젝트 헌장	§2	Project Brief → PID(핵심부)	v1.0 — 프리모템 반영 후 v1.1
③	이해관계자 등록부 + 현저성 분석	§3	Communication management approach의 분석부	G0 판정 — G1·2026-08·G2·G3 갱신
④	거버넌스 구조 + RACI 초안	§4	PM team structure, Role descriptions	허용범위 3층은 Day2 확정
⑤	프리모템 기록 + 초기 리스크 목록	§5	Risk register(초기), Risk management approach(초안)	13+2건 정성 — Day2에서 확률·영향·EMV

- ▶ 다섯 문서 모두 **”결정되지 않은 것을 결정하는 문서”** — Day2 이후의 문서는 Day1에서 결정된 것을 분해하고 측정한다

현장의 한 줄이 모호하면 WBS 열 개가 모호해진다 — 완성하지 못한 항목은 예시본과 대조해 채우고 내일 가져오라

읽기 (총 1시간 안)

- ▶ Klein(2007) 「Performing a Project Premortem」 2페이지 — 왜 "실패했다"인지 원문에서
- ▶ Cooke-Davies(2002) 6페이지 — 현장 항목 3의 두 층이 왜 분리되어야 하는지
- ▶ 교재 §3.2 "항목별 의미"와 §3.4 "권한 없는 PM" — 오늘 쓴 현장 항목 12를 다시 읽으며

쓰기 (심화 과제, 3~7년차 — 하나만)

- ▶ §1.7 최근 승인 문서의 편익 표를 항목 4 형식으로 — 분모 없는 항목·부서명 책임자·남의 편익의 개수
- ▶ §2.7 자기 회사 현장에 **항목 12와 14**가 없다면 그 둘만 써서 스폰서에게 보여 줄 초안
- ▶ §4.7 운영위 명단에 3역할 배정 — 배정 안 되는 인물 수와 빈 역할
- ▶ §5.7 실패 선언문 세 개(일정·편익·중단), 각 5개 사유 — 현재 등록부에 없는 것의 개수

생각해 볼 질문 — 제1장 3 / 제2장 3 / 제3장 1 중 하나씩 골라 답을 적어 오라. Day2 첫 10분에 두세 명이 말한다

Day2 산출물	Day1에서 받는 입력
⑥ 범위 기술서와 WBS	현장 §5 범위, §6 산출물 — 포함 5개 산출물이 WBS 레벨 2. PBS 노드는 명사
⑦ 요구사항 추적표(RTM) 골격	현장 §4 상위 요구사항(요구 제공자), §13 우선순위 → MoSCoW
⑧ 일정 기준선	현장 §7 마일스톤(외부 고정), §9 제약 → 컷오버·규제에서 역산한 주공정, G3 합류 버퍼 15영업일
⑨ 원가 기준선과 예비비 구조	BC §5·3층 예산, 현장 §8, RACI 19·20행 → 145.8 / 컨틴전시 10.2 / 관리예비비 12.0. R-04 시나리오별 축소안
⑩ 리스크 등록부 정량화 + 허용범위 격자	초기 리스크 13+2건, 허용범위 초안, 손익분기 66% → 확률·영향·EMV, EMV 합계 vs 8억, 편익 -5%p의 타당성 역산

- ▶ 다시 만나는 Day1 개념: **RCF / 역함수 분포 / 되돌림 비용 / Product-Based Planning / 허용범위 격자**

Day3 실행·통제(3층 변경 통제에 비용, Kreiner의 표류 역설) · Day4 종료·이관(판본이 바뀌어도 살아남는 산출물, ITIL)
