

PM 트랙 Day 4

전환과 종료 — 컷오버·서비스 전환·편익

- ▶ 4일 특강 · 4일차 · 전환과 종료(Transition · Closing)
- ▶ 사례는 같다 — 온담F&B홀딩스 ONE ONDAM **P1**, BL-02 PMB 146.82 / 집행 한도 156.0
- ▶ 시점이 둘 — 런북 확정 **2027-02-05** / 종료 **2027-05-28 G4**
- ▶ 1차 컷오버 02-26 20:00~02-28 06:00(34h), PoNR 01:40, 트리거 4 발동 0
- ▶ 오늘의 문서는 프로젝트가 아닌 것을 향해 쓴다 — 결정 요청 칸이 아니라 **인수자 서명 칸**

오늘의 질문 — 오픈 다음 날 아침, 운영이 ”우리는 인수한 적 없다”고 말하면 무엇이 없었던 것인가

오전 — 이론 (제1~3장)

- ▶ **1교시** 90분 · 전환·종료론과 컷오버 — 세 개의 시계 · 런북 · 게이트 · PoNR · 롤백 · 리허설 — 제1~2장
- ▶ **2교시** 90분 · 서비스 전환 — ITIL 판본 · SAC · ELS · SLA 3층 · error budget · 72 시간 — 제3장
- ▶ **3교시** 90분 · 종료 — 원가 3층 · 계약 종결 · 지체상금 0 · 이관 10건 — 제4장

오후 — 실습과 교훈·편익

- ▶ **4교시** 90분 · **실습 ①** 컷오버 런북·SAC + 이관 체크리스트·SLA/OLA/UC — 워크북 §1~2
- ▶ **5교시** 75분 · 교훈과 편익 — Syllk · 여섯 칸 · ITO · 분모 정치 · 손익분기 66% — 제5장
- ▶ **6교시** 75분 · **실습 ②** 종료 보고서·교훈 등록부·편익 원장 — 워크북 §3~5
- ▶ **마무리** 30분 · 학술 배경 · 20종의 사슬을 거꾸로 · Product 트랙 예고 — 제6장

오전은 "받는 쪽"의 문서를 읽고, 오후는 "받는 쪽"이 서명할 문서를 쓴다

오전 — 읽을 수 있다

- ▶ 프로젝트·운영·편익의 세 시계를 분리해 오픈의 위치를 말한다
- ▶ 게이트를 ”되돌리는 비용이 달라지는 곳”에 세우고 판정자를 배치한다
- ▶ PoNR과 기술적 롤백 시한을 구별하고 결정권 상향 구간을 정한다
- ▶ SAC·ELS 종료 조건·SLA 3층의 결손을 찾는다
- ▶ 종료 보고서의 숫자를 성과보고·변경 로그의 행으로 추적한다

오후 — 쓸 수 있다

- ▶ ⑯ 런북 게이트 3·PoNR·트리거 4·검증 6종의 조건을 관측값으로 적는다
- ▶ ⑰ 이관 체크리스트의 인수 서명 4열과 SLA/OLA/UC 3층을 채운다
- ▶ ⑱ 원가 3층(168/156/146.82) 대비 최종 AC 151.95를 분리해 적는다
- ▶ ⑲ 교훈 6칸 중 ”적용 대상·소유자” 칸을 실명으로 채운다
- ▶ ⑳ 편익 원장의 측정 책임자·분모·손익분기를 서명란과 함께 만든다

목표의 공통 척도 — 프로젝트가 사라진 뒤에도 그 문서가 누군가의 손에 남아 있는가

Day4 산출물	Day3에서 받는 입력	교재
⑯ 런북 · SAC	⑫ EX-01 대안 1 · ⑭ 심각도 1·2 미해결 0 · ⑬ R-14(두 번 컷오버) · ⑪ CR-08 조건 ③·CR-11	제2장 · 3.2
⑰ 이관 · SLA/OLA/UC · ELS	⑬ 이슈 미결 6건 · ⑭ 인터페이스 47본 문서 · ⑮ 하도급 조건 ③·계약 변경 4·6·7번 · R-16	제3장
⑱ 종료 보고서 · 이관 목록 · 계약 종결	⑫ BL-02(146.82)·EAC4 150.86 · ⑪ CR-01~11 · ⑬ 잔여 EMV 7.26 · ⑮ 귀책 분해표	제4장
⑲ 교훈 등록부	⑫ 조기 신호 5·착시 5 · ⑭ 감리 귀속 이의 · ⑬ IS-02 · AF-1-08	제5장 전반
⑳ 편익 실현 원장	⑫ 편익 축 G(118억) · ⑬ R-12(두 분모) · ⑪ CR-04·CR-09 · Day1 ① BC §4·§6	제5장 후반


20종의 사슬 — 런북이 시작이고 편익 원장이 끝이다. 되돌아가는 파선은 종결 기록이지 재기준선이 아니다

1교시 (90분) — 전환·종료론과 컷오버

- ▶ 프로젝트의 끝과 서비스의 시작은 같은 날이 아니다 — 세 개의 시계 (1.1)
- ▶ 표준이 종료를 어떻게 정의하는가 — PRINCE2 5활동 · PMBOK 8 · ISO 21502 (1.2)
- ▶ 임시조직의 끝은 제도로 정한다 — 해산은 사람별 일자로 (1.3)
- ▶ 분야별 종료 게이트의 뼈대는 같다 — 증명서·하자 목록·보증·서명 (1.4)
- ▶ 컷오버 — 런북·게이트 3·PoNR·롤백 트리거 4·검증 6종·리허설 3회 (제2장)

한 문장 — 오픈은 프로젝트가 시스템을 놓은 사건이 아니라, 운영이 받았다고 서명한 사건이어야 한다

세 개의 시계 — 프로젝트 · 운영 · 편익 (온담 P1)

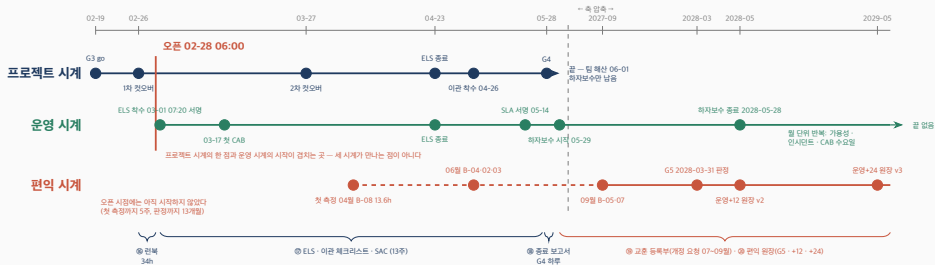

출처: Day4 워크북 ④ 항목 1-10, ⑤ 항목 1-5, ⑥ 항목 1-7-8, ⑧ 항목 4(편익 리뷰 두 시계). 가로축은 2027-06 이후를 압축.

그림 1-1. 프로젝트 시계(G3 → 컷오버 → 2차 → ELS 종료 → G4 05-28)·운영 시계(ELS 착수 서명 07:20 → CAB → 하자보수 2028-05-28)·편익 시계(첫 측정 2027-04 → G5 2028-03-31). 오픈은 겹치는 점 하나다

오픈은 세 시계가 만나는 점이 아니다 — 프로젝트의 마지막 마일스톤과 운영의 첫 달이 겹치는 곳이고, 편익 시계는 아직 시작하지도 않았다

PRINCE2 7 Closing a Project — 5활동과 End Project Report

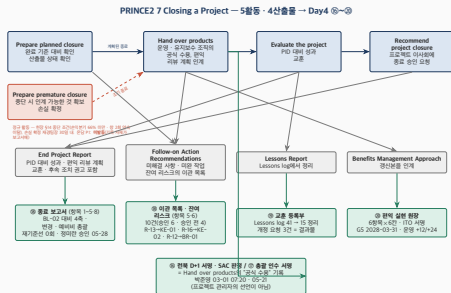


그림 1-2. Prepare planned closure · Prepare premature closure · Hand over products · Evaluate the project · Recommend project closure — 4 산출물(End Project Report · Lessons Report · Benefits Management Approach · Follow-on Action Recommendations)이 ㉔~㉚에 대응한다

두 규율 — 인수는 운영의 공식 수용이지 PM의 선언이 아니다 / premature closure는 실패 처리가 아니라 정규 활동이다

- ▶ PMBOK 8 Closing — 인도물 이전·계약 종결·재무 정산·팀 해산·기록·성과 평가·교훈·**편의 계획 이전**
- ▶ 6판 4.7 한 프로세스 → 8판은 계약 종결·재무 정산을 Closing 안에 명시
- ▶ 가장 무거운 문장 — ”편의 실현 계획을 프로젝트 후 조직에 이전한다” → ②⑩ 소유 재무본부
- ▶ 운영 준비도(operational readiness)를 종료 조건으로 적는다 → SAC·①⑦
- ▶ ISO 21502 §7 — 종료 조건 확인·인계·계약 종결·기록·교훈·편의 책임 명시. 계약이 인용할 때 검수 조건의 해석 기준

세 표준의 공통분모 — ”누구에게 넘기는가”가 적혀야 종료다. 편의 계획도, 미해결 사항도, 잔여 리스크도

분야별 종료 게이트 — 이름은 다르고 뼈대는 같다


분야	단계적 증명서	PoNR / go 조건	하자·보증	받는 쪽
건설·EPC	MC → 시운전 → 성능 시험 → PAC → FAC	성능 시험 통과	punch list A/B/C · DLP	발주자
SI	릴리스 검수 → 최종 검수 → 잔금·유보금	데이터 정보 전환	하자보수 1년 · 유지보수 별도	운영 조직
제조 NPD	파일럿 런 → Run@Rate → 양산 이관	수율·불량률	ECN backlog	생산
제약·임상	데이터 실사 → 쿼리 해소 → DB lock	DB lock(규제가 명시)	—	규제 제출

어휘가 아니라 구조를 빌린다 — 조건부 인수의 정규화(EPC) · PoNR의 명시적 정의(제약) · go 조건의 숫자화(NPD)

- ▶ 전환(Transition) — 이후 상태는 영구조직의 것 → 전환 완료의 판정권도 영구조직(SAC = 박준영)
- ▶ 제도화된 종료 — 종료 보고서·해산·복귀가 제도로 정해져 있다
- ▶ 두 실무 현상 — 종료 직전 인력 이탈(IS-04·IS-11) · 교훈의 실패(조직이 해산하면 배운 것도 해산)
- ▶ Staw의 처방 — 끝났다고 선언하는 사람과 받았다고 서명하는 사람은 달라야 한다
- ▶ 해산은 사람별 일자로 — 발주사 14명 중 12명 06-01 복귀·2명 P5 / 수행사 05-31 철수·하자 보수 4명 비상주

”05-31 해산” 한 줄이면 6월 첫 주의 하자 문의는 아무에게도 가지 않는다

온담 1차 컷오버 런북 시각표 — T-24h ~ D+1 (2027-02-25 20:00 → 03-01 07:20), 계획 대비 실행 기록

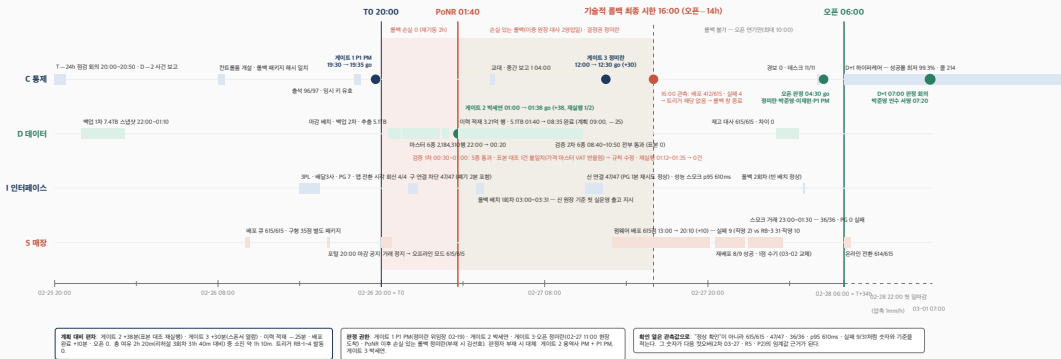

출처: Day4 워크북 ○원 생성번호 항목 2(시각표 38행)·3(게이트)·4(PoNR)·5(트리거)·10(실행 기록). 가로축 4mm/h, 오픈 이후 1mm/h로 압축.

그림 2-1. 1차 컷오버 런북 시각표 T-24h~D+1 — 네 갈래(C·D·I·S) 38행, 게이트 1·2·3 계획/실제(+5·+38·+30), PoNR 01:40, 롤백 최종 시한 16:00, 오픈 판정 04:30 → 오픈 06:00 → D+1 07:20 서명. 여유 2h 20m 중 1h 10m 소진

런북은 시각(時刻)이 주어진 유일한 프로젝트 문서 — 확인 열은 "정상 확인"이 아니라 관측값(건수·해시·성공률)으로

게이트	계획 / 실제	조건(전부 충족)	판정자	되돌리는 비용
1 착수	19:30 / 19:35	인력 97명·백업 해시·임시 라이선스 유효·CAB 잠금	P1 PM(위임)	0
2 정본 전환	01:00 / 01:38	마스터 검증 6종 통과·재실행 2회 이내	박세연	시간(재기동 2h)
PoNR	01:40 / 01:40	신 원장 '정본' 활성화	—	시간 + 손실
3 매장 배포	12:00 / 12:30	이력 6종·IF 47/47·스모크·RB-2 미 발동	정미란	+ 매장 재방문 2.1억
기술적 시한	16:00	오픈 06:00 — 14h(복원 8h+검증 2h+캐시 4h)	정미란	불가

세 게이트를 모두 스폰서에게 맡기면 새벽 1시의 게이트 2는 "스폰서 깨우기 vs 그냥 진행"이 된다 — 데이터는 CIO, 돈과 매장은 스폰서

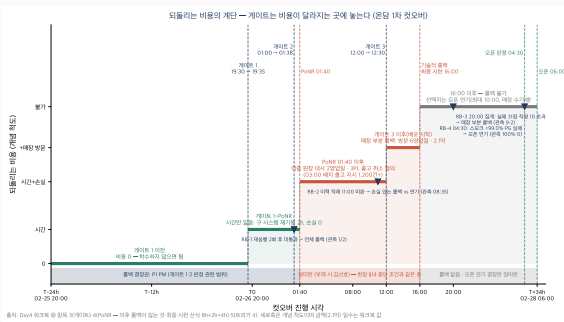


그림 2-2. 되돌리는 비용의 계단 — 게이트 1 전 0 → 시간만 → 시간+손실(PoNR) → +매장 방문 2.1억(게이트 3) → 불가(16:00). 트리거 RB-1~4의 위치와 관측값($1/2 \cdot 08:35/11:00 \cdot 9/31\text{점} \cdot 100\%/99.0\%$) — 발동 0

임계값이 숫자가 아니면 판정은 토론이 된다 — 발동하지 않은 트리거의 관측값이 다음 컷오버의 임계값 근거다

데이터 검증 6종 — 이 데이터의 정답을 누가 판정하는가

검증	분모	리허설 1 (11-23)	본 컷오버	서명
① 건수	1,842 테이블	0	0 / 0	용역사 PM·PMO 품질
② 금액 합계	5년 원장	—41,200원 → 규칙 정정	0 / 0	재경팀장
③ 키 유일성	PK 1,842	1,204 (브랜드 간 중복, R-10)	0 / 0	박세연
④ 참조 정합성	FK 3,916	412 (폐점·단종)	0 / 0	박세연
⑤ 코드 매핑	4,318 코드	96 (97.8%)	0 / 0	수행 통합팀·PMO
⑥ 표본 대조	2,000 / 5,000행	18	1 → 재실행 → 0 / 0	PMO 품질·용역사 PM

분모 · 통과 기준 0 · 서명자 — 셋 중 하나가 없으면 전환 검증은 자기 채점이다. 리허설 1회차의 미통과 3종은 정보 판정(G2)의 입력이었다

리허설 3회 · 두 번 컷오버 — 결과가 나빠야 좋은 리허설

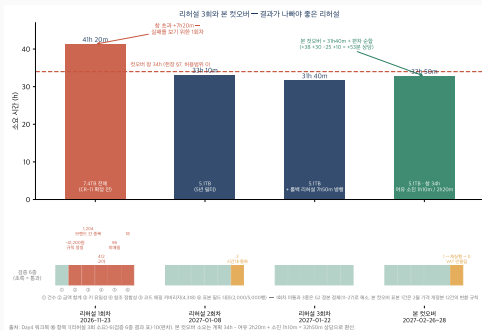


그림 2-4. 1회차 11-23 41h 20m(7.4TB 전체, 창 초과 7h 20m, 미통과 3종) → 2회차 01-08 33h 10m(5.1TB, 표본 3건) → 3회차 01-22 31h 40m(롤백 리허설 7h 50m 병행) → 본 컷오버 32h 50m 상당 / 창 34h

회차마다 목적이 다르다 — 1회 무엇이 깨지는가 · 2회 창 안에 들어오는가 · 3회 여유와 PoNR
이후 롤백의 실측. 리허설 없이 정한 PoNR은 추측이다

- ▶ 세 개의 시계 — 오픈은 프로젝트의 마지막 마일스톤과 운영의 첫 달이 겹치는 점, 편익 시계는 아직 전
- ▶ 이관 = 받는 쪽의 서명 — PRINCE2 hand over · PMBOK 8 편익 계획 이전 · 해산은 사람별 일자로
- ▶ 게이트는 되돌리는 비용이 달라지는 곳에 — 조건·판정자·시간 한도, 데이터는 CIO·돈은 스폰서
- ▶ PoNR 01:40 ≠ 기술적 시한 16:00 — 그 사이 14h 20m의 롤백 결정권은 한 층 위
- ▶ 트리거·검증은 숫자와 서명자로 — 발동 0의 관측값과 리허설 1회차의 실패가 다음 컷오버의 자산

컷오버는 되돌릴 수 없는 시각을 정하는 기술이고, 종료는 받는 쪽이 서명하는 문서를 쓰는 기술이다

**2교시 (90분) — 서비스 전환: ITIL · SAC ·
SLA 세 층 · error budget**

2교시 — 이 교시에서 배우는 것

- ▶ 약속(SLA)은 그것을 받치는 약속(OLA·UC)의 합보다 강할 수 없다
- ▶ SAC는 거부권이 실재할 때만 장치가 된다 — 판정자 박준영
- ▶ ELS는 기간·종료 기준·인력 축소가 연동된 8주
- ▶ 99.5%는 219.2분이고, 그 예산이 릴리스 횟수를 정한다
- ▶ 인시던트는 복구로, 문제는 원인 제거로 닫는다 — KEDB 6건

2교시의 한 문장 — 약속과 그 약속을 받치는 것을 분리하지 않는 것이 이 장의 모든 오류다

ITIL 판본을 정직하게 — v5가 현행, 이 교재는 practice 어휘로 고정

ITIL Version 5(현행)의 상위 구조와 이 교재가 고정한 practice 어휘 — practice 이름은 판본이 바뀌어도 같다

ITIL Version 5 (PeopleCert, Foundation 2026-02-12)

ITIL Value System (← Service Value System) · 프레임: Digital Product and Service Management
유지: 34 practices(14 general + 17 service + 3 technical) · 7 guiding principles · 4 dimensions/organizations and people에 AI 명시)

Product and Service Lifecycle 8활동 (← Service Value Chain 6활동)



6활동 → 8활동 채택된 회사 운영 규정
개정 시 필요(Design and transition → Design +
Transition, Deliver and support → Deliver + Support)

Transition · Operate 경계
= ELS 8주(03-01~04-23)
이 장의 서비스 전환이 놓이는 곳

practice 이름은
판본이 바뀌어도 같다

이 교재가 고정한 practice 어휘 (ITIL 4 명칭 · 판본 무관)

Change Enablement — CAB 수요일 · 변경 동결 02-20~03-12	⑩ 항목 1-8
Service Validation and Testing — UAT · 스모크 거래 36건 중 36 성공	⑩ 항목 2-행 31
Release Management — R1~R5 · 하자보수기 표준 릴리스	⑩ 항목 7
Deployment Management — 광역어 615점 배포 · 8명월	⑩ 행 26~30
Incident Management — P1 2 · P2 9 · P3 41 · P4 88	⑩ 항목 6
Problem Management — 문제 9 = 근본 제거 3 + KE 6	⑩ 항목 6
Service Level Management — SLA 1 · OLA 3 · UC 5 서명 05-14	⑩ 항목 4
Early Life Support — 8주 · 종료 기준 5 · 상주 20~4	⑩ 항목 5
Known Error Database — KE-01-06 · 우회 · 근본 원인 상태	⑩ 항목 6

쓰지 말 것: 'ITIL 4가 최신'(2026-02-12 이후 틀린 문장). 쓰는 것: practice 명칭(위 9개) — 여러 회사 운영 규정 수행서 유지보수 계약 CSP 계약 ISO/IEC 20000 증적이 지금 이 어휘로 적혀 있다. 이 장이 다루는 것은 어휘가 아니라 판단(SLA 3층의 산술 · '케스' 해당 여부 · 릴리스 횟수)이며 판단은 판본이 바뀌어도 같다. ITIL 4는 폐기되지 않고 병행 유지.

출처: PeopleCert ITIL Version 5 공지(2026-02, 웹 확인 — 상위 모듈은 3~4월 순차) · Day4 교재 3.1절 · 워크북 ⑩ 52.2. 오른쪽 값은 워크북 ⑩ ⑩ ⑩ 완성 예시본.

그림 3-1. ITIL Version 5(2026-02-12) 상위 구조 — ITIL Value System · Product and Service Lifecycle 8활동.

이 장은 상위 구조 명칭을 쓰지 않고 practice 명칭 9개만 쓴다


“ITIL 4가 최신”은 2026-02-12 이후 틀린 문장 — 바뀐 것은 상위 구조·6→8활동, practice 이름은 그대로

SAC — 인수 거부권이 실재해야 문서가 장치가 된다

- ▶ 판정자 = 인수자(운영 조직, 박준영) — 프로젝트가 판정하면 자기 평가
- ▶ 거부권은 헌장 §14 ①에 걸려 있어야 실재한다
- ▶ 조건부 충족 경로 — 없으면 1항목 때문에 전체 거부 또는 거짓 충족
- ▶ 시점 — G1 초안 → 월 검토 → G3 사전 점검 → G4 판정
- ▶ 항목 12 · 각 항목에 판정자와 증빙 열

프리모템 12번(”미해소 23건으로 인수 거부”)과의 차이는 항목 수가 아니라 G3 사전 점검의 유무다

SAC 12항목 — G3 사전 점검(미해소 7)에서 G4 판정(총족 11·조건부 1)까지

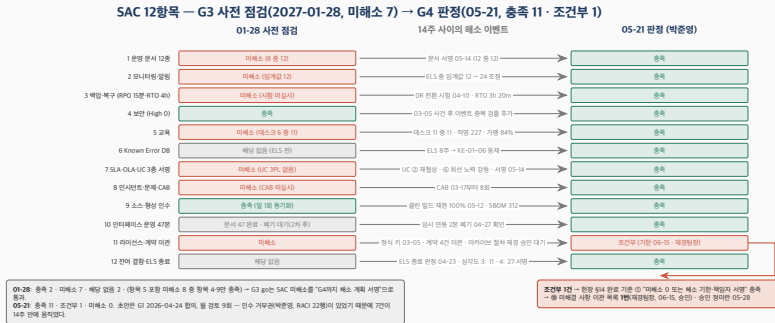

출처: Day4 워크북 ⑧ 항목 8(SAC v1.0 → 판정 표, 12행), ⑨ 항목 2(문서 12종)·4(SLA)·5(ELS), ⑩ 항목 1(완료 기준 ①)·6(이관 1번).

그림 3-2. 01-28 미해소 7 → 14주 해소 이벤트(DR 시험 04-10 · 임계값 12→24 · 데스크 교육 11/11 · CAB 8회 · UC 재협상 · 문서 12종 05-14) → 05-21 판정. 조건부 1(항목 11 아카이브 접근 절차, 재경팀 06-15) = 이관 목록 1번

사전 점검이 있었기 때문에 미해소 7은 작업 목록이 되었고, 조건부 1은 이관 목록 1번이 되었다

ELS 8주 — 종료 조건이 없는 하이퍼케어는 상주가 된다

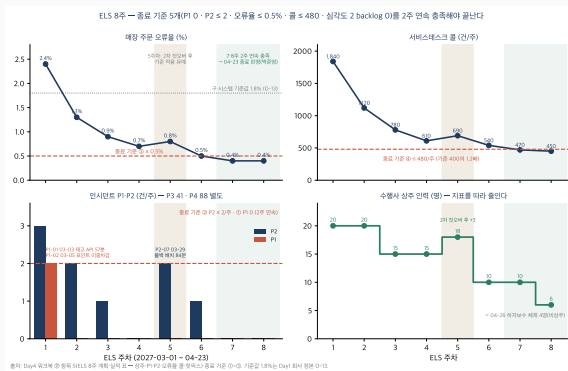


그림 3-3. 2027-03-01~04-23 · 오류율 2.4→0.4% · 콜 1,840→450 · P1 2(1주차)·P2 9 · 상주

20→15→10→6→4 · 5주차 재상승은 2차 컷오버 유예 조건 안 · 7·8주 2주 연속 충족 → 04-23 종료

ELS의 세 요소 — 기간 · "n주 연속"의 종료 기준 · 지표와 연동된 인력 축소. 하나라도 빠지면 상주는 하자보수가 된다

practice	답하는 질문	요소
Change Enablement	이 변경을 해도 되는가(승인)	standard·normal·emergency · change authority · CAB/ECAB · 변경 일정
Release Management	무엇을 언제 묶어 내보내는가(구성)	릴리스 단위 · 릴리스 일정 · 릴리스 노트
Deployment Management	어떻게 환경에 옮기는가(실행)	big-bang·phased·pull·continuous · 배포 절차 · 롤백(런복)

- ▶ 섞이면 CAB가 "이 기능을 넣을 것인가"와 "이번 주 배포해도 되는가"를 한 회의에서 다룬다
- ▶ 온담 — CCB(정미란) 05-28 해산 · CAB(박준영, 수요일) 03-17 첫 회, 8회 = SAC 항목 8 증빙

무엇을 넣을지는 릴리스 계획(현업), 언제 어떻게 내보낼지는 CAB(운영 위험 · error budget), 표준 변경은 CAB에 오지 않는다

SLA/OLA/UC 3층 — 한 층이 비면 SLA는 협상이 아니라 산술로 불가능하다

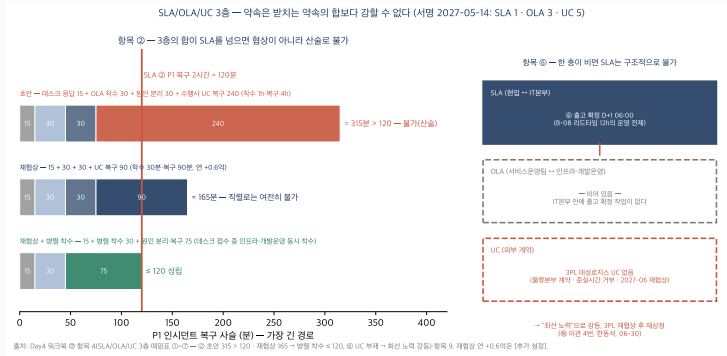


그림 3-4. 항목 ② P1 복구 2h — 사슬 15+30+30+240 = 315분 > 120분(UC 초안 불가) → UC 재협상(착수 30·복구 90, 연 +0.6억) 165분 → 병렬 착수 ≤ 120 성립. 항목 ⑥ 출고 확정 D+1 06:00 — 3PL UC 없음 → 최선 노력 강등

SLA 복구 시간 ≥ 받치는 OLA·UC 사슬의 합 — 강등은 패배가 아니라 정직한 경계 표시이자 재협상 안건 목록이다

Error budget — 99.5%를 3시간 39분으로, 다시 릴리스 속도로

- ▶ 평균 달 = $365.25/12 \times 1,440 = 43,830\text{분} \cdot 0.5\% = \mathbf{219.2\text{분} = 3\text{h } 39\text{m}}$
- ▶ 계획 정지(CAB 승인 창·2차 컷오버 8h)는 제외 — 산입하면 3월 98.7%
- ▶ 비계획 유보 60 : 릴리스 뭉 40 = 131.5분 : **87.7분**
- ▶ 릴리스당 기대 다운 = 변경 실패율 $\times$ 복구 시간(DORA)
- ▶ policy — 유보 초과 시 표준 릴리스 동결 · 릴리스 뭉 소진 시 CAB 승인만 · 결정자 박준영

같은 99.5%를 운영은 "지킬 숫자"로, 프로젝트는 "넘지 않을 숫자"로 읽는다 — 예산으로 바꾸면 토론이 계산이 된다

환전 계산 — 릴리스 속도를 여섯 배로 만드는 것이 아니라 복구 시간이다




그림 3-5. 219.2분 = 유보 60% + 릴리스 40%(87.7분) · 3월 실측 57분

릴리스당 기대 다운	분	월 가능(87.7 ÷)	주 환산
DORA 실측 12% × 240분	28.8	3.0회	0.7회 — 주 1회 불가
중간(하자보수기) 10% × 90분	9.0	9.7회	2.2회 — 표준 주 1회 + 핫픽스
ELS 목표 10% × 45분	4.5	19.5회	4.5회

240분 → 45분은 KEDB(우회 준비된 오류) · 회귀 자동화(R-19 0.25억) · 롤백 스크립트의 문제 — 안정
과 속도의 환율


Incident와 Problem, Known Error DB — 복구로 닫는 것과 원인 제거로 닫는 것

KE	증상 → 우회	근본 원인 · 상태	소유자
KE-01	구형 단말 9점 인쇄 8초 → 재부팅	펌웨어 호환 — 협의 중(이관 2번)	오정근
KE-02	폴백 배치 겹침(R-16) → 22:30	3PL 준실시간 전환 시(2027-06, 이관 4번)	한동석·박준영
KE-03	포인트 이중차감 → 중복 검출 배치	먹등 키 — 03-12 핫픽스 제거, 감시 잔류	수행사
KE-04	IF-SAP-12 타임아웃 → 수동 재전송	ECC 야간 배치 경합 — EoM 2027-12까지 유지(이관 7번)	박세연
KE-05	구형 xls 수량 0 → xlsx 안내	사용률 1% 미만 — 보류(CAB 04-14)	박준영

인시던트 140 · 문제 9 = 근본 제거 3 + Known Error 6 — 상태가 다르므로 소유자가 다르고, 소유자가 다르므로 이관처가 다르다

개인정보 사건 — 조문은 단정, 적용은 비단정, 시한은 단정

P1-02 포인트 이중차감의 72시간 — 조문은 단정하고, 적용은 단정하지 않고, 시한은 단정한다




집단	지표(2주 → 8주)	장벽	조치
가맹 점주 388점	팩스·엑셀 발주 24% → 11% (목표 ≤15)	K/A	P3 방문 교육 2회차 · R5 간편 재발주
가맹 점주	마감 20:00 준수 81 → 96%	R	마감 30분 전 알림
직영 227점	반품 절차 준수 78 → 94%	R	POS 강제 확인 단계 + 지역매니저 점검
서비스데스크 11명	1차 해결률 52 → 73%	K	FAQ 20건 · KEDB 우회 공유
물류센터 246명	재고 조회 사용률 87%(4주)	A/D	한동석 서면 04-12

채택은 교육 이수율이 아니라 사용 지표로 잴다 — R 장벽에 교육을 더 하면 ELS가 끝나는 날 내려간다

D-2 라이선스 사건 — 거버넌스 변경의 부작용이 14개월 뒤 청구되는 구조

D-2 라이선스 사건의 인과 사슬 — 세 개의 정상적인 결정이 14개월 뒤 컷오버 창 앞에서 만난다

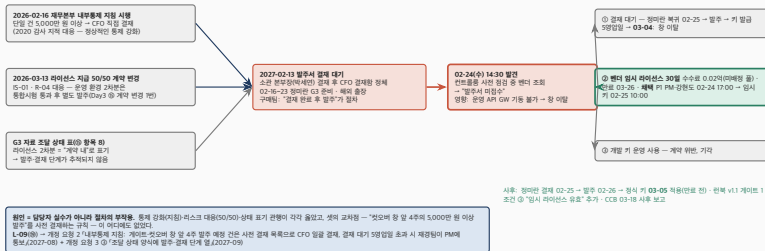

출처: Day4 워크북 ⑩ 항목 9(D-2 사건 기록), ⑩ L-09-개정 요청 2·3, ⑩ 항목 4(미배정 풀 0.02). 내부통제 지침-50/50 변경은 Day1 회사 정본-Day3 ⑩.

그림 2-6. 내부통제 지침(2026-02-16) · 50/50 계약 변경(03-13) · 조달 상태 표 "계약 내" → 02-13 CFO 결제 대기 → 02-24 14:30 발견 → ② 임시 라이선스 0.02억 → L-09 → 지침 개정 요청 2·3

세 개의 정상적인 결정이 겹쳐 만든 대기 — 담당자가 아니라 규정의 겹침을 적어야 L-09가 지침 개정이 된다

2교시 핵심 정리 — 약속과 그 약속을 받치는 것

- ▶ ITIL 현행은 v5 · 이 교재는 practice 어휘로 고정 — ”4가 최신”이라 쓰지 마라
- ▶ SAC = 인수자 판정 + 현장 거부권 + 조건부 경로 · 미해소 7 → 총족 11·조건부 1 → 이관 1번
- ▶ ELS 8주 = 기간 · n주 연속 종료 기준 · 연동된 인력 축소(20→4)
- ▶ SLA $\geq$ OLA·UC 사슬의 합 — 315 > 120 재협상, 3PL UC 없음 강등
- ▶ 99.5% = 219.2분 · 릴리스 뭉 87.7 · 복구 240분이면 월 3회, 45분이면 19.5회

인시던트는 복구로, 문제는 원인 제거로, 개인정보는 조문·적용·시한 세 줄로, 채택은 사용 지표로 — 워크북 §2 ⑰로 간다

**3교시 (90분) — 종료: 보고서는 마지막 독
자를 위해 쓴다**

3교시에서 배우는 것 — 선언이 아니라 증명

- ▶ 종료 보고서 8항목 — 모든 숫자가 어느 문서 어느 행에서 왔는지 추적된다
- ▶ BL-02 대비 최종 4축 + 리스크·편익·지속가능성, 원가는 3층을 분리해 적는다
- ▶ 계약 종결 — 검수 → 정산 → 유보금 → 하자보수 → 지체상금 0의 근거
- ▶ 문서·형상 인수(2023 지적 회수) · 이관 10건 · 잔여 리스크 · 팀 해산
- ▶ 마지막 독자 — 3년 뒤의 내부감사·분쟁·다음 PM

종료 보고서는 프로젝트의 마지막 문서가 아니라 내부감사의 첫 문서다

#	항목	입력(어느 문서에서 오는가)
1~2	문서 정보·완료 기준 판정 / BL-02 대비 최종 성과	헌장 §14 다섯 기준 · 성과보고 제17호(05-31)
3~4	변경 로그 총괄 / 컨틴전시·관리에비비 집행 총괄	변경 로그 v1.4 · 결재·CCB 월 보고
5~6	잔여 리스크 이관 / 미해결 사항 이관 목록	등록부 v1.4 · SAC 판정 · KEDB · SLA
7	계약 종결	계약 종결 서면 7건 · 검수 확인서 R1~R5
8	문서·형상 인수 · 팀 해산 · 승인	클린 빌드 05-12 · SBOM · 편익 원장 v1.0

- ▶ 첫 문장 — 기간 2026-01-05~2027-05-28(17개월), BL-01 → BL-02, **재기준선 0회**
- ▶ 완료 기준 다섯 — 각각 판정·근거·일자·**판정자 실명**(박준영 SAC · 박세연 형상)

추적되지 않는 숫자는 종료 시점에 만들어진 숫자다 — 첫 줄은 입력 목록이다

BL-02 대비 최종 성과 — 네 축, 편차 0·0·—5.13·24%

축	BL-02	최종 실적(05-28)	편차	판정
범위	FP 12,585 / RTM 1,189	인수 FP 12,585(100%)	0	이내
일정	G4 2027-05-28	G4 05-28 정시, 창 34h·8h 정시	0영업일	이내
원가	PMB 146.82	AC 151.95 / CPI 0.966	VAC —5.13	이내(예외 0)
품질	0.4건/FP	1,187건 → 0.094건/FP	기준의 24%	이내
리스크	잔여 EMV 8 / 단일 2	최대 잔여 7.26(9월)	—	이내

- ▶ 편익 — 첫 측정 B-08 13.6h, 판정은 G5 → ㉔ 원장으로 이관 · 지속가능성 — 사건 1건 (P1-02) 기록
- ▶ 9월 as-is 전망 06-11(+10) → EX-01 대안 1로 회복 — 0영업일은 회복의 결과다

품질을 결함 수로 적지 마라 — 분모 12,585·분자(통합~UAT)·기준 0.4가 있어야 1,187이 읽힌다

원가 3층 — "16.05 미사용"과 "VAC -5.13"이 동시에 참

원가 3층과 최종 AC 151.95 — "16.05 미사용"과 "VAC -5.13"이 동시에 참인 이유 (G4 2027-05-28)

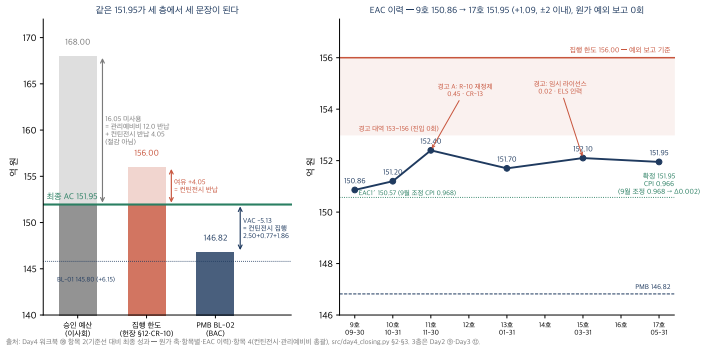


그림 4-1. 승인 168.00 / 집행 한도 156.00 / PMB 146.82 대 최종 AC 151.95. EAC 이력 9호 150.86 → 11호 152.40(경고) → 17호 151.95, 예외 진입 0회

PM의 자는 PMB다 — 종료 보고서는 세 층을 분리해 적고 "절감"이라는 말을 쓰지 않는다

변경 로그 총괄

- ▶ 승인 10 · 조건부 1(CR-09) · 거버넌스 1(CR-10) · 기각 1(CR-05) · 이관 1(CR-12)
- ▶ Day3 이후 — CR-12 P1 범위 외 이관 · CR-13 R-10 재정제 0.45 · CR-14 패치 0.20
- ▶ FP 누적 +185(+1.5%, 허용의 49.7%), SI +1.02

컨틴전시 10.20 = 다섯 조각

- ▶ 편입 1.02(변경 대가 → PMB) + 리스크 배정 집행 2.50
- ▶ 미배정 풀 0.77 + 편차 흡수 1.86 + **반납 4.05**
- ▶ 소진율(편입 제외) 50.3% · 관리예비비 12.0 요청 0·**반납 12.0**
- ▶ 유보 3건 — 클라우드 3.0 반납 / PMO 3.0 승인 전 / 전환 2.0 감액

모든 집행에 결재(PM + 재경)와 CCB 월 보고가 붙어 있다 — 윤태호의 질의에 이 표가 답이다

계약 종결 — 검수 → 정산 → 유보금 → 하자보수 → 지체상금

단계	SI 한빛디지털	근거 서면
검수	최종 검수 확인서 05-26	검수 확인서 R1~R5
정산	$69.22 + \text{대기 } 0.60 + \text{컨틴전시 귀속 } 1.20 = \mathbf{71.02}$, 잔금 05-31	합의서 7호(05-26)
유보금	$5\% = 3.46\text{억} \rightarrow \text{하자보수보증증권 대체}$	계약 §16 · 보증증권
하자보수	1년 2027-05-29~2028-05-28, 범위 = 인수 산출물의 결함	개선·요구 변경은 P5
지체상금	0 — 근거 네 줄 (다음 프레임)	합의서 6호 · Day3 ⑮ 항목 6

- ▶ 나머지 — 전환 용역 10.05(하자 6개월) · 상용SW 19.42 · 클라우드 22.16 중 P5 승계 · 단말 8.90
- ▶ 하도급(모빌커넥트 220 FP) — 수행사 정산 내 1.21, **직접 지급 요청 없음** 확인

정산액을 한 숫자로 적지 마라 — 71.02가 $69.22 + 0.60 + 1.20$ 임을 모르면 0.60은 "왜 줬나"가 된다

지체상금 0의 네 줄 — 같은 표가 대기 비용 0.60도 설명한다

- ▶ ① G4 05-28 = 기준선 완료일 → 계약 §18의 "지연" 불성립
- ▶ ② 순 지연 분해(Day3 ⑮ 항목 6) — 발주 7 + 동시 3 + 수행 3 — 회복 3 = 10 → EX-01로 0
- ▶ ③ 수행사 단독 3일(S10 재작업) → 회복 3일(S12~S17)과 상계 — 변경협의체 10-14
- ▶ ④ 동시 3일 — 07-15 합의(SCL 원칙 10) 공기 연장 인정·비용 불인정
- ▶ 같은 귀책 분해표의 반대 방향 = 발주사 귀책 대기 비용 0.60 지급(R-05 0.42·R-20 0.18)

네 줄이 없으면 0은 "봐줬다"로 읽히고, 있으면 "계산했다"로 읽힌다 — Day3 동시기록이 종료에서 정산된다

- ▶ 조건은 "받았다"가 아니라 **발주사 저장소에서 클린 빌드가 재현되는가**
- ▶ 온담 — 재현 100%(05-12, 12개 모듈 + 하도급 어댑터 220 FP), SBOM 312(GPL 계열 0)
- ▶ 빌드·배포 절차서 v1.0 · 일 1회 동기화 → G4 후 발주사 저장소 단독 정본
- ▶ 아카이브 governance/p1-closure/ — 현장~편익 원장, 계약 서면 32건, 보존 10년
- ▶ 지적 대응 요약 — 2020 편익 근거 → ㉔ 원장 / 2020 손실 확정 → §14 / 2023 소스 → 형상 인수

종료 보고서는 지적사항에 답하는 자리이지, 지적사항이 없었던 척하는 자리가 아니다

미해결 사항 이관 목록 — 소유자 실명 없는 이관은 소멸이다

#	내용	소유자	기한	승인
1	아카이브 접근 절차 재경 승인(SAC 11 조건부)	재경팀장	06-15	승인
3	발주 마감 22:00 운용 전환, CAB 재상정(CR-09 ①)	한동석	2027-09 CAB	승인 전
6	이천·안성 검사기록 디지털화 — 편익 B-02 분모의 전제	나영선	09 이사회	승인 전
7	SAP ECC 2027-12 EoM 대응, IF-SAP 8본(KE-04)	박세연	08-31	승인 전
10	하자보수기 PMO 잔류 1명 예산 1.05(Day2 유보 3.0)	프로그램 PMO장	06-01 운영위	승인 전

- ▶ 10건 = 승인 6 · 승인 전 4 — 세 칸이 결정적: **소유자 실명 · 기한 · 승인 여부**
- ▶ 출처 열이 앞선 열아홉 문서의 어느 행이 프로젝트 밖으로 나가는지를 기록한다

“승인 전”은 종료 보고서에서 가장 짧은 줄이지만 가장 오래 남는 줄이다

이관 10건의 출처와 수신 — 다른 넷과 묶는 열



그림 4-4. 출처(SAC·SLA·KEDB·변경 로그·컨틴전시 유보·편익 원장·정보 제외 범위) → 항목·소유자·기한 → 수신 조직, 승인 6 실선·승인 전 4 파선, 6번 → ② BR-05

출처 열이 없으면 종료 시점에 누군가 떠올린 목록이고, 있으면 앞선 문서의 기록이다

잔여 리스크 — 등록부 v1.4(G4 종결)

- ▶ 종결 12 / 운영 이관 3 / 편익 이관 1
- ▶ R-13 → KE-01(오정근) · R-16 → KE-02(한동석) · R-18 → 앱 벤더(오정근·박세연)
- ▶ R-12 → BR-01(재무본부·한동석·나영선)
- ▶ 신규 운영 리스크 3 — 3PL 폴백 영구화·SAP EoM·IPO 변경 동결 창

팀 해산 — 사람별 일자

- ▶ 발주사 14명 — 12명 06-01 복귀, **2명 P5 전환**
- ▶ 수행사 05-31 철수, 하자보수 대기 4명 비상주
- ▶ PMO 3명 — 2명 프로그램 PMO, 1명 잔류 (승인 전, 이관 10)
- ▶ 하자보수 창구 — P5 서비스운영팀(박준영) → UC ②, 판정 CAB

리스크는 사라지지 않는다 — 운영 등록부·KEDB·편익 리스크 표 중 한 곳에 새 소유자와 함께 다시 적힌다

문서의 마지막 독자 — 3년 뒤의 내부감사·분쟁·다음 PM

독자	물는 것	답하는 곳
내부감사(3년 뒤)	컨틴전시 R-03 0.50은 누가 언제 승인했나	항목 4 결재 08-12 · CCB 10-15 소급 · 11월~ 자 동 안건
분쟁(하자보수기)	이것이 결함인가 개선인가 · 지체상금 0은 봐준 것 인가	하자보수 범위 정의 · 검수 확인서 R1~R5 · 네 줄
다음 PM(P2·P5)	온담은 컷오버를 어떻게 했는가	런북 실행 기록 열 · 교훈 L-15

- ▶ 약어를 풀어 쓴다 — RB-30이 무엇인지 3년 뒤에는 아무도 모른다
- ▶ 출처를 적는다 — 어느 문서 어느 행
- ▶ 판단의 근거를 결론과 분리해 적는다 — ”충족”이 아니라 ”조건부 충족, 06-15, 재경팀장”

결론만 남은 문서는 3년 뒤 검증할 수 없고, 검증할 수 없는 문서는 신뢰되지 않는다

3교시 핵심 정리 — 종료 보고서는 증명이다

- ▶ 8항목 · 모든 숫자에 출처 · 완료 기준 다섯에 판정자 실명 · 첫 문장 "재기준선 0회"
- ▶ 원가 3층 분리 — 16.05 미사용 / 여유 4.05 / VAC -5.13 동시에 참, PM의 자는 PMB
- ▶ 정산 $71.02 = 69.22 + 0.60 + 1.20$ · 지체상금 0의 네 줄 · 클린 빌드 100%·SBOM 312
- ▶ 이관 10건(승인 6·승인 전 4) — 소유자 실명·기한·승인 여부 없으면 소멸
- ▶ 잔여 리스크는 새 소유자와 함께 다시 적힌다 · 해산은 사람별 일자

4교시 실습 ① — 워크북 §3 ⑱ 종료 보고서·이관 목록·계약 종결을 온담 값으로 직접 쓴다

**4교시 (90분) — 실습 ① 컷오버 런북·SAC
+ 운영 이관·SLA 3층**

이 교시에서 하는 것 — 오전 이론 둘을 손으로 쓴다

- ▶ ⑩ 런북·SAC — go/no-go 3 · PoNR · 롤백 트리거 4 · SAC 10항목을 **직접** 쓴다
- ▶ ⑪ 운영 이관 — SLA/OLA/UC 3층 매핑 7행 + error budget 환전을 **손계산**한다
- ▶ 두 문서는 서로의 입력 — SAC 항목 7(SLA 서명)이 ⑪ 항목 4, 런북 D+1 서명이 ⑪ 항목 1
- ▶ 도구는 종이 캔버스 · 계산기 · 워크북 §1.4·§2.4 빈 템플릿 — 노트북은 검산용
- ▶ 시간 — 안내 10분 / ⑩ 35분 / ⑪ 30분 / 짝 교환 검산 15분

정답은 워크북 §1.5·§2.5에 있다 — 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤에 대조하라

- ▶ 게이트 3개 — 착수(19:30) · 데이터 정보 전환(01:00) · 매장 배포(12:00) — 조건·판정자·재
실행 허용 횟수
- ▶ PoNR 시각과 근거, 기술적 롤백 최종 시한 — **두 시각을 분리**해 적고 그 사이의 결정권자를 적
는다
- ▶ 롤백 트리거 4 — 관측 지표 · 임계값(리허설 실측에서) · 관측 시각 · 판정자 · 전체/부분 롤백
- ▶ SAC 10항목 — 조건(관측 가능) · 판정자(인수자 실명) · 증빙 · G3 사전 점검 · G4 판정
- ▶ 주어진 것 — 리허설 3회 실측(이력 적재 6h 50m) · 매장 620점 · 인터페이스 47본 · PG 7본
· 현장 §14 완료 기준 ①

묻는 것은 하나 — 새벽 3시에 이 종이만 보고 ”지금 돌리면 되는가”에 답할 수 있는가

과제 ⑰ — SLA 7항목을 3층으로 받치고, 99.5%를 분과 릴리스 횟수로 환전한다

- ▶ 3층 매핑표 — 행 = SLA 7항목(가용성·P1·P2 복구·배치·발주 마감·출고 확정·데이터 정정)
- ▶ 열 = SLA 목표 / OLA(사내 팀·목표) / UC(외부 계약·목표) / 합산(가장 긴 사슬) / 판정
- ▶ 주어진 UC 초안 — 수행사 유지보수 착수 1h·복구 4h · CSP 99.9% · 3PL 대성로지스 **UC 없음**
- ▶ error budget — 99.5%/월 → 허용 다운(분) → 비계획 60% / 릴리스 40% → 릴리스당 기대 다운 → 월 허용 횟수
- ▶ 주어진 DORA 실측(2026-09) — 변경 실패율 12% · 평균 복구 240분 / ELS 목표 10% · 45분

묻는 것은 둘 — 어느 행이 구조적으로 불가능한가, 복구 시간을 얼마로 줄여야 주 1회 릴리스가 SLA와 양립하는가

작성 요령 ① — PoNR은 ”무엇이 되돌릴 수 없게 되는가”로 정한다


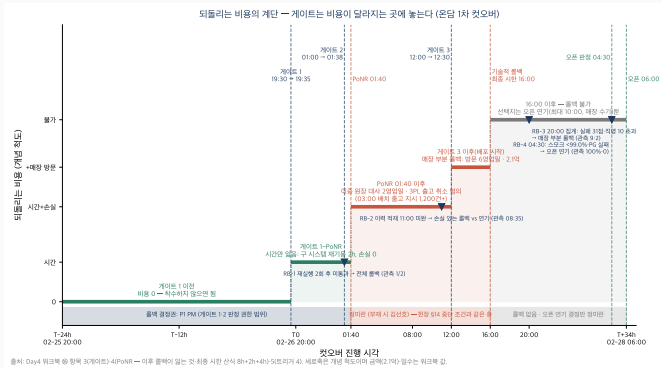


그림 2-2. 되돌리는 비용의 계단 — 게이트 1 전 0 → 시간만 → 시간+손실(PoNR 01:40) → +매장 방문 2.1억(게이트 3) → 불가(16:00). 계단이 오르는 자리마다 결정권자가 한 층 올라간다

PoNR = 신 원장이 정본이 되어 이후 거래가 그곳에만 쌓이기 시작하는 시각 — 배포 시작이 아니다

작성 요령 ② — SAC의 판정자는 인수자다, 프로젝트가 판정하면 자기 평가다

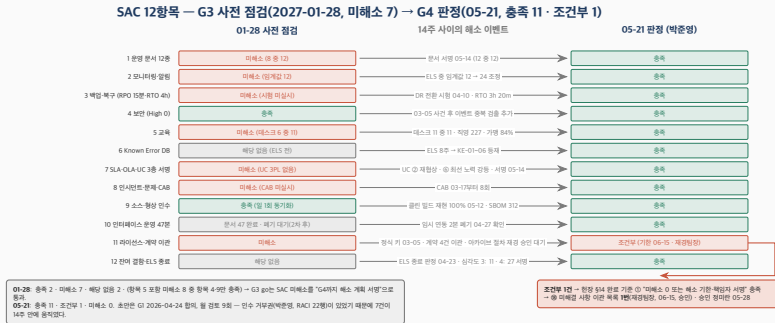

출처: Day4 워크북 ④ 항목 8(SAC v1.0 → 판정 표, 12행), ⑤ 항목 2(문서 12종)-4(SLA)-5(ELS), ⑥ 항목 1(완료 기준 ①)-6(이관 1번).

그림 3-2. SAC 12항목 × 2시점 — G3 사전 점검 01-28(충족 2·미해소 7·대기 3) → 14주 해소 → G4 05-21(충족 11·조건부 1). 조건부 1건은 해소 기한·책임자 서명으로 이관 1번이 된다

현장 §14 완료 기준 ① — "SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명" — 이 한 줄이 판정 규칙이다

작성 요령 ③ — 3층은 아래에서 위로: UC 없는 SLA는 약속이 아니다

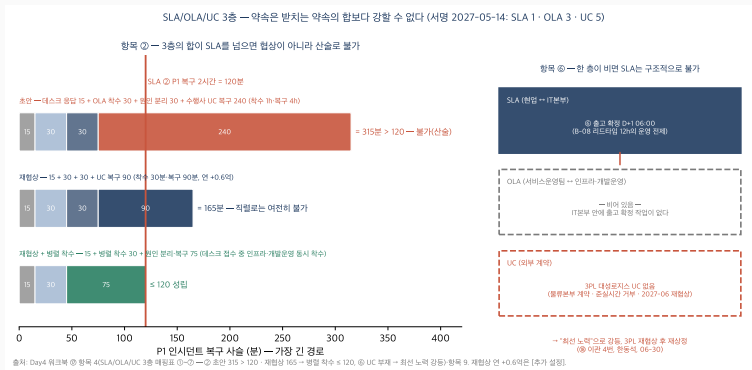


그림 3-4. SLA ② P1 복구 2시간 — 초안 사슬 15+30+30+240 = 315분 > 120 / 재협상 165 / 병렬 학습으로 ≤ 120. 항

목 ⑥ 출고 확정은 3PL UC 부재로 "최선 노력" 강등

약속은 그것을 받치는 약속의 합보다 강할 수 없다 — 합산은 가장 긴 사슬로, 한 층이 비면 "구조적 불가"

작성 요령 ④ — error budget 산식: 99.5%를 분으로, 분을 릴리스 횟수로

단계	산식	온담 값
월 허용 다운	$30.4375\text{일} \times 24 \times 60 \times 0.5\%$	219.2분 (3h 39m)
비계획 유보 / 릴리스 몫	60% / 40%	131.5분 / 87.7분
릴리스당 기대 다운(실측)	변경 실패율 12% × 복구 240분	28.8분 → 월 3.0회
릴리스당 기대 다운(중간)	10% × 90분	9.0분 → 월 9.7회
릴리스당 기대 다운(ELS 목표)	10% × 45분	4.5분 → 월 19.5회
소진 시 규칙	유보 초과 시 표준 릴리스 동결 · 다음 달 초 기화	결정자 박준영

복구 시간을 4시간에서 45분으로 줄이지 않으면 주 1회 릴리스도 SLA와 양립하지 않는다 — 회
귀 자동화·KEDB의 존재 이유

1. 게이트가 하나(오픈 직전)뿐이고 조건이 "이상 없음" — 되돌리는 비용이 달라지는 지점이 게이트다
2. PoNR을 "배포 시작"으로 적고 기술적 시한과 한 시각으로 합친다 — 사이의 결정권자가 사라진다
3. 롤백 트리거가 "중대 장애 발생 시" — 임계값 없는 트리거는 새벽에 토론이 된다
4. SAC 판정자가 프로젝트 쪽, 증빙이 "완료 보고" — 인수가 아니라 자기 평가
5. SLA만 있고 OLA는 구두, 3PL·앱 벤더는 UC에서 뺀다 — 99.5%를 분으로 환산하지 않는다

다섯 오류의 공통점 — 판정자와 숫자를 적지 않았다. 판정자 없는 조건은 조건이 아니다

- ▶ 예시본 — 워크북 §1.5(런북 38행·게이트 3·트리거 4·SAC 12) · §2.5(문서 12종·3층 7행·error budget·ELS 8주)
- ▶ 인쇄용 — ../템플릿/PM_Day4/16_컷오버런북_SAC_완성예시.pdf · 17_운영이관_SLA_완성예시.pdf (빈 양식은 _빈템플릿.pdf)
- ▶ 시간 — ⑯ 게이트·PoNR·트리거·SAC 35분 / ⑰ 3층 매핑·환전 30분 / 짝 교환 검산·대조 15분
- ▶ 자기 점검 — 워크북 §1.7·§2.7 점검 질문 각 3개. 값이 다르면 **어느 전제가 달랐는지**를 적는다
- ▶ 심화(3~7년차) — 자기 회사의 최근 오픈 당일 기록에서 게이트·PoNR·임계값·편차 기록 넷을 찾아 본다

예시본은 정답이 아니라 전제가 적힌 답이다 — 다른 값이 나왔으면 전제를 비교하라

1. 게이트 3개는 되돌리는 비용이 달라지는 세 지점 — 조건은 관측값, 판정자는 실명, 재실행 횟수까지
2. PoNR 01:40과 기술적 시한 16:00은 다른 시각 — 그 사이는 "가능하지만 손실 있음", 결정권자가 올라간다
3. 트리거 4개의 임계값은 리허설 실측에서 온다 — 발동 0이 결과이지 목표가 아니다
4. SAC는 인수자가 판정해야 인수다 — 조건부 1건은 기한·책임자 서명으로 이관 목록에 넘어간다
5. 3층은 아래에서 위로, 99.5%는 219.2분 → 87.7분 → 릴리스 3회 — 복구 시간이 릴리스 속도를 정한다

5교시는 종료 — 보고서는 선언이 아니라 증거이고, 미해결 사항은 소유자 실명이 없으면 소멸한다


**5교시 (75분) — 교훈과 편익: 프로젝트가
끝난 뒤에 남는 것**

5교시에서 배우는 것 — 프로젝트가 사라진 뒤의 독자를 위해 쓴다

- ▶ 교훈이 조직에 남지 않는 이유 — 수집이 아니라 **흡수**의 실패 (Williams · Syllk)
- ▶ 교훈 등록부 6칸 — 적용 대상·소유자 없는 교훈은 감상 / 온담 15건 → 개정 요청 3건
- ▶ 편익의 책무 분리(ITO) — output은 G4에서 종결, outcome은 2029-05까지 실명 서명
- ▶ 분모 정치 91.3 vs 84.6 — 승인된 목표는 승인된 분모로 판정한다
- ▶ 손익분기 66%·두 시계·편익 리스크 5건 — 그리고 P1은 어느 성공인가

교훈과 편익의 공통 실패는 하나 — 프로젝트가 사라진 뒤의 독자를 위해 쓰지 않은 것이다

교훈은 왜 조직에 남지 않는가 — Williams(2008)·Syllk의 여섯 층

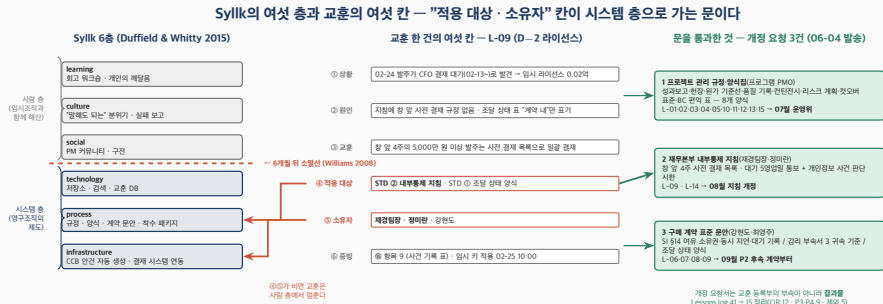

출처: Duffield & Whitty(2015) Syllk 6층; Williams(2008) — 절차로 흡수되지 않은 교훈의 소멸. 값은 Day4 워크북 ⑥ 완성 예시본 항목 1(L-09 행)·2(개정 요청 3건)·3(착수 패키지 양식). 6개월은 교재 5.1절의 표현.

그림 5-1. Syllk 6층(사람 3 / 시스템 3)과 교훈 6칸. ④ 적용 대상·⑤ 소유자가 사람 층에서 시스템 층으로 가는 문이고, 개정 요청서가 그 문을 통과하는 유일한 형식 — 6개월 소멸선은 [추가 설정]

교훈이 남는 조건은 교훈의 수가 아니라 — 그 교훈으로 개정된 양식이 다음 프로젝트의 착수 패키지에 있는가다

교훈 등록부의 여섯 칸 — ”적용 대상”이 없는 교훈은 감상이다

칸	무엇을 적는가	규율
① 상황	무엇이 있었나 — 사실·일자·숫자	형용사 없이
② 원인	왜 그랬나 — 양식·규칙·구조	사람 이름 금지
③ 교훈	무엇을 바꾸면 되나 — 한 문장	”중요하다”는 감상
④ 적용 대상	어느 양식·규칙·문안의 어느 칸 (NP / STD / CTR)	”전사”는 없음과 같다
⑤ 소유자	누가 바꾸나 — 실명	PM은 06-01에 없어진다
⑥ 증빙	어느 문서의 어느 행	워크북 ⑫~⑯ 항목 번호

- ▶ 잘된 것도 교훈이다 — 우연한 성공을 양식으로 고정하지 않으면 다음 프로젝트가 다시 발명해야 한다

”담당자가 놓쳤다”는 사실이지 교훈이 아니다 — ”양식에 그 칸이 없었다”로 적어야 칸이 다음 담당자를 잡는다

온담 P1 교훈 15건 중 다섯 — 원인에 사람이 없고 소유자에 PM이 없다

ID	상황	원인(구조) → 교훈	적용 대상	소유자
L-02	승인 대기 12영업일, 대기 비용 0.42	현장·RACI에 대체 결정권자 칸 없음 → 실명 지정	STD ① 현장 §11	PMO장
L-06	감리 AF-1-03·04 귀속 다툼, 0.18	감리 계약에 귀속 판정 기준 없음 → WBS 담당 열·RACI	CTR 감리 부속서 3	강현도·정하늘
L-08 잘 됨	대기 비용 판정 1회로 종결	회의록 "요청·응답 일자" 열 → 동시 기록 서명	CTR §14 / NP 회의록	강현도·P1 PM
L-09	D-2 라이선스 CFO 결재 대기, 0.02	창 앞 사전 결재 규정 없음 → 4주·5천만 원 일괄 결재	STD ② 내부통제	재경팀장·정미란
L-15 잘 됨	두 컷오버 정시·트리거 0	1차 지표를 2차 go 조건으로 → 컷오버 표준	STD ① 컷오버 표준	PMO장·박준영

L-02의 원인을 "본부장이 바빴다"로 적으면 사실이지만 교훈이 아니다 — 다음 프로젝트의 Senior User도 바쁠 것이다

사내 표준 개정 요청 3건(06-04 발송) — 15건을 15곳에 보내면 15건이 ”검토 중”이 된다


표준	소유자	의결 시점	개정 조항(교훈)
① 프로젝트 관리 규정·양식 집	프로그램 PMO장	2027-07 운영 위	성과보고 SV·CV 분해 열(L-01·03) · 현장 대체 결정 권자(L-02·10) · RoC 부속(L-11) · 컷오버 표준(L-15) · BC 편익 표 분모·실명 필수(㉔)
② 재무본부 내부통제 지침	재경팀장·정미란	2027-08	5,000만 원 조항 단서 신설 · 개인정보 사건 판단 시한 절차(L-09·14)
③ 구매 계약 표준 문안	강현도·최영주	2027-09 P2 후속 계약부터	SI 계약 §14 여유 소유권·동시 지연·대기 기록 · 감리 부속서 3 귀속 기준 · 조달 상태 양식(L-06~09)

- ▶ 조항 번호와 새 문장이 있는 요청만 의결된다 — ”검토 바람”은 영원히 검토된다
- ▶ 적용 시점이 P2 G2 전 — 다음 프로젝트의 착수 패키지에 들어가야 흡수다

개정 요청서는 교훈 등록부의 부속이 아니라 결과물이다 — 아카이브에 함께 들어가면 함께 잊힌다

편익 실현의 책무 분리 — Zwikael & Smyrk의 ITO, 측정 책임자 실명이 서명이다

ITO 모형(Zwikael & Smyrk)의 책무 분리와 편익 원장의 여섯 칸 — output 서명은 G4로 끝나고 outcome 서명은 2029-05까지 산다



출처: Zwikael & Smyrk(2011) ITO 모형: Day4 워크북 ④ 완성 예시본 항목 1(편익 6칸 — B-04 행)·항목 5(ITO 책무 분리 서명표 05-21)·항목 6(BR-04). 측정 책임자는 Day1 ① BC 54.

그림 5-2. Input → Transform → Output | Utilisation → Outcome과 책임 분리선. output 서명(P1 PM·이재현)은 G4 인수로 종결, outcome(오정근 5·한동석 1)·utilisation 서명은 2029-05까지 유효(BR-04) — 원장 6칸의 ⑤ 칸이 서명란
P1 PM은 폐기율을 내릴 수 없다 — PM이 outcome에 서명하면 없어진 조직이 책임을 지고, 그것은 아무도 지지 않는 것과 같다

B-ID	편익(측정식·리포트)	기준값 → 목표	측정 책임자	승인 / 귀속
B-04	폐기율 = 월 폐기 금액 ÷ 취급원가 (RPT-INV-05)	3.9%(2025) → 2.2%(M+24)	오정근 / 강현도	43 / 43
B-05	배달수수료 회피 = 전환 매출 × 12.8% (RPT-ORD-02)	앱 2.1% → 온라인 18%	오정근 / 재경팀장	37 / 18.6
B-07	직영 인건비율(분기)	21.4% → 20.1%	오정근 / 인사본부	38 / 38
B-02	재고 정확도, 두 분모 병기 (StRS-034)	A 91.3 → 98.5 / B 84.6 미설정	한동석 / 실사 담당	(B-04 기여)
B-08	가맹 발주 리드타임 (RPT-FRN-03)	38h → 12h · 첫 측정 13.6h	오정근 / 박준영	(B-03 기여)

- ▶ 6칸 = 측정식(코드 수준) · 기준값(값·시점·분모·출처) · 목표값 · 측정 시점 · 측정 책임자 실명 · 미달 시 조치
- ▶ 미달 시 조치는 "원인 분석"이 아니라 output / outcome / utilisation 세 갈래 중 하나로 분류 → 그 갈래의 소유자가 움직인다

원장 v1.0 2027-05-21 서명, 정보 관리자는 재무본부 — P1 종료 후에도 살아 있어야 하는 유일한 P1 문서다

분모 정치 — 91.3 vs 84.6, 승인된 목표는 승인된 분모로 판정한다

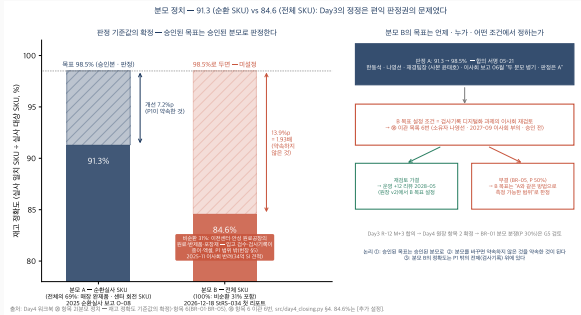


그림 5-3. A 순환실사 SKU(69%) 91.3 → 98.5(7.2%p) vs B 전체 SKU 84.6(13.9%p, 1.93배). 비순환 31%의 검사기록은 종이·엑셀 (2025-11 이사회 반려 34억) — 판정 A 서명 05-21, B 목표는 이관 6번 가결/부결(BR-05) 뒤 운영 +12에서 설정

Day3의 정정(R-12)은 실은 편익 판정권의 문제였다 — 누가 어느 분모로 98.5를 판정하는가를 서명으로 확정하지 않으면 G5는 협상이 된다

실패 원인 셋 (Ward & Daniel 2012)

- ▶ 소유자 부재 — ”회사”의 편익은 아무의 것도 아니다
- ▶ 측정 시점 부재 — M+24가 달력의 어느 날인가
- ▶ 기준값의 정치 — 사후에 정해진 기준값은 협상이 된다

온담 원장의 세 정치

- ▶ 분모 정치 — A 91.3 / B 84.6, 판정은 A
- ▶ 귀속 정치 — B-05 37 → 온담 18.6 + 가맹점주 18.4
- ▶ 측정 조직 소멸 — B-08 로그: P10이 만들고 P5가 읽고 영업본부가 해석

기준값은 프로젝트 전에, 측정 책임자는 프로젝트 중에, 판정은 프로젝트 후에 — 셋이 같은 문서에 있어야 한다

손익분기 66% · 62.1% · 78% — 그리고 M+12 / M+24 리뷰의 두 시계

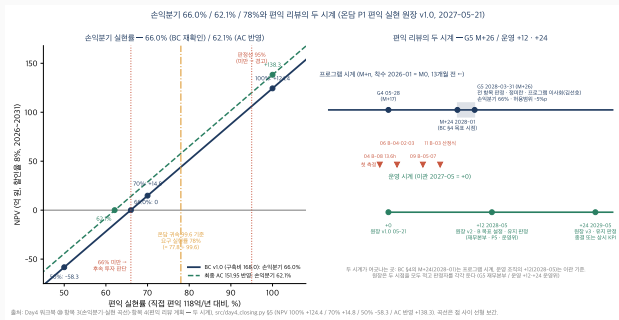


그림 5-4. NPV 대 실현률(50% -58.3 / 66% 0 / 70% +14.8 / 100% +124.4; AC 151.95 반영 시 손익분기 62.1%+138.3), 판정선 95%·66%, 온담 귀속 기준 78% + 프로그램 시계(M+24 2028-01·G5 2028-03-31)와 운영 시계(+12 2028-05+24 2029-05)

BC의 시계는 고치지 않는다 — 승인 문서를 사후에 고치는 것은 기준값을 고치는 것과 같다. 대신 운영 시계를 추가한다

ID	리스크	P	대응
BR-01	분모 분쟁 재점화(R-12 이관)	30%	05-21 합의문·이사회 보고에 "판정은 A" 명시
BR-02	외생변수 — 원재료가·이상 기후로 폐기율 왜곡	40%	수량 기준 병기, 원재료가 지수 통제
BR-03	B-05 귀속 분쟁 — 협의회가 18.4 억을 본사 편익으로 오해	25%	귀속 분리 명기·가맹 귀속 지표 공유
BR-04	측정 조직 소멸 — 로그·읽는 조직·해석 조직 셋 중 하나 변경	35%	로그 보존 3년·서명자 변경 시 재서명·정본 재무본부
BR-05	전제 미충족 — 검사기록 디지털화 부결 시 B 목표 불가	50%	이관 6번 부의안에 B-02·B-04 연결 명시

▶ Day1 프리모템 14번 "측정 책임자가 경기 탓이라 했다" → BR-02·BR-04로 대응된 것

편익 리스크는 프로젝트 리스크와 다르다 — 프로젝트는 끝났고, 리스크의 소유자는 원장에 서명한 사람들이다

성공(Cooke-Davies 2002)	판정	근거
프로젝트 관리 성공	허용범위 이내	재기준선 0 · 컷오버 2회 정시 · VAC -5.13(한도 내, PMB 대비 3.5% 초과) · FP 12,585 100% · 밀도 0.094
프로젝트 성공(편익)	판정 불가	첫 측정 하나(B-08 13.6h, 94%)뿐 — 판정은 G5 2028-03-31
지속적 성공	더 뒤	세 표준 개정(07·08·09월)이 P2·P5 착수 패키지에 들어갔는가

- ▶ ”온버짓”이라는 말을 세 층(승인·한도·PMB) 중 어느 것으로 쓰느냐에 따라 답이 다르다 — 이 교재는 그 말을 쓰지 않는다
- ▶ Flyvbjerg의 곱셈 — 원가·일정 두 인수는 확정, 편익 인수는 아직 곱해지지 않았다

종료 보고서의 편익 축 ”미판정 — ②⑩ 원장으로 이관”이 정직한 문장이다 — 원장·서명·두 시계·리스크는 장치이지 결과가 아니다

5교시 핵심 정리 — 교훈은 양식으로, 편익은 실명으로 남는다

- ▶ 교훈 실패는 흡수의 실패 — 시스템 층에 닿는 문은 적용 대상·소유자 칸, 형식은 개정 요청서
- ▶ 6칸이 다 차야 교훈, 원인에 사람이 있으면 교훈이 아니다 — 15건 → 3표준(07·08·09월)
- ▶ 편익 책무는 output(G4 종결) / outcome(오정근·한동석) / utilisation — 실명 칸이 서명
- ▶ 승인된 목표는 승인된 분모로 — A 91.3 → 98.5 판정, B 84.6은 전제 결정 뒤 운영 +12
- ▶ 손익분기 66.0 / 62.1 / 78% · 두 시계 · BR 5건 — P1은 관리 성공은 이루고 편익 성공은 미판정

프로젝트는 06-01에 없어진다 — 그 뒤에 남는 것은 개정된 양식 세 개와 서명된 원장 하나다

**6교시 (75분) — 실습 ② 종료 보고서·미해
결 이관·교훈·편익 원장**

6교시 — 이 교시에서 하는 것

- ▶ 5교시의 세 문서(⑮·⑯·⑰)를 **손으로** 쓴다 — 워크북 §3~5
- ▶ 세 과제, 한 실 — 이관 6번(나영선) → 교훈 적용 대상 → 원장 BR-05
- ▶ ⑮ 종료 보고서 최종 4축 + 이관 목록 5건 이상 (25분)
- ▶ ⑯ 교훈 5건 — 여섯 칸, 적용 대상·증빙까지 (20분)
- ▶ ⑰ 편익 원장 B-01~B-06 × 6칸, 측정 책임자 실명 (25분)

종료는 선언이 아니라 증명이다 — 세 문서의 모든 숫자·이름은 앞 문서의 어느 행에서 왔는지 추적된다

과제 ⑱ — 워크북 §3: 종료 보고서 최종 4축 + 이관 목록

- ▶ 시점 2027-05-28 G4 — 워크북 §3.7 기본 과제 상황(SAC 항목 7 미충족)
- ▶ 최종 4축 — 범위 FP 12,585 / 일정 G4 = 기준선 완료일 / 원가 AC 151.95 / 품질 SAC 11+1
- ▶ 원가는 3층을 다 적는다 — 168 승인 / 156 한도 / 146.82 PMB → 여유 4.05 · VAC -5.13
- ▶ 이관 목록 5건 이상 — 출처·소유자 실명·기한·승인/승인 전·수신 조직
- ▶ 현장 §14 ① 두 경로 중 택일 — "미해소 0" / "해소 기한·책임자 서명"

원가 한 층만 적으면 "절감"이 되고, 세 층을 적으면 "16.05 미사용·여유 4.05·초과 5.13"이 동시에 참이 된다

미해결 사항 이관 10건 — 출처에서 수신 조직까지



출처: Day4 워크북 ⑥ 항목 6(미해결 사항 이관 목록 — 내용-출처-소유자-기한-승인 여부-수신 열). 6번의 원문은 Day1 회사 정본 \$4.2-한장 \$5 제외 범위.

그림 4-4. 출처(SAC 조건부·CR 조건·SLA 강등·편익 전제) → 항목·소유자 실명·기한 → 수신 조직. 승인 6 실선·승인 전 4 파선. 6번(나영선·2027-09 이사회)이 ② BR-05로 이어진다

이관 목록에 "이 프로젝트의 편익이 실현되려면 이 프로젝트가 하지 않은 것"이 한 줄이라도 있는가


과제 ①9 — 워크북 §4: 교훈 5건, 여섯 칸

- ▶ 상황 · 원인 · 교훈 · **적용 대상** · 소유자 · **증빙** — 여섯 칸을 다 채운다
- ▶ 상황은 숫자로 — 12영업일 · 0.42억 · +38분 · D-2 발견
- ▶ 원인은 사람이 아니라 양식·규칙·구조 — ”그 칸이 없었다”
- ▶ 5건 중 잘된 것 1건 이상(L-08 동시 기록 · L-15 분리 컷오버 연결)
- ▶ 5건을 개정 요청 3건(규정·내부통제 지침·계약 문안)으로 묶는다

”적용 대상”이 없는 교훈은 감상이다 — 문서명과 칸까지 적히고 그 문서의 소유자가 접수해야 교훈이다

교훈이 사라지는 경로 — Syllk 6층과 여섯 칸

Syllk의 여섯 층과 교훈의 여섯 칸 — ”적용 대상·소유자” 칸이 시스템 층으로 가는 문이다

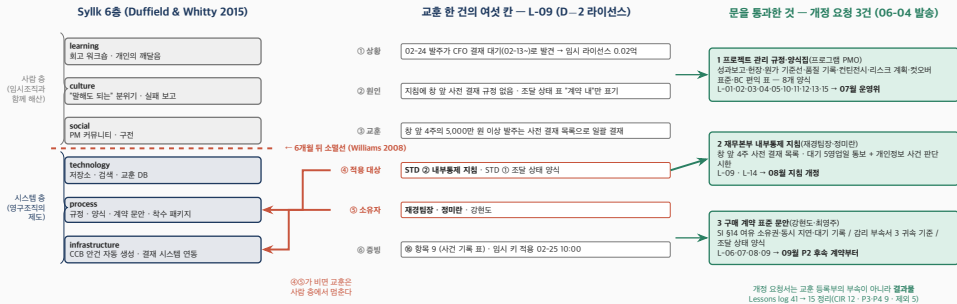

출처: Duffield & Whitty(2015) Syllk 6층; Williams(2008) — 절차로 흡수되지 않은 교훈의 소멸. 값은 Day4 워크북 ⑥ 완성 예시본 항목 1(L-09 행)·2(개정 요청 3건)·3(학습 패키지 양식). 6개월은 교재 5.1절의 표현.

그림 5-1. 사람 3층 / 시스템 3층, 6개월 소멸선. ④ 적용 대상·⑤ 소유자 칸이 process·infrastructure로 가는 문이다
— 개정 요청 3건(07·08·09월)이 그 문을 통과한다


교훈은 아카이브에서 죽는다 — 개정 요청서는 등록부의 부속이 아니라 결과물이다

- ▶ 6칸 — 측정식 · 기준값 · 목표값 · 측정 시점 · **측정 책임자 실명** · 미달 시 조치
- ▶ 측정식은 코드 수준 — 분자·분모·산출 시스템(RPT-FRN-03)·주기
- ▶ 기준값에는 반드시 분모와 측정 시점 — 91.3% (순환실사 SKU, 05-21)
- ▶ 미달 시 조치는 원인 분기 — output / outcome / utilisation
- ▶ 직접 편익 118억, 온담 귀속 99.6억 — 두 기준 실현률을 따로 적는다

프로젝트가 끝난 뒤 이 원장을 들고 있는 조직과 사람의 이름이 적혀 있는가 — 그것이 편익 원장의 첫 조건이다

ITO 사슬과 책무 분리 — ⑤ 칸은 서명란이다

ITO 모형(Zwikael & Smyrk)의 책무 분리와 편익 원장의 여섯 칸 — output 서명은 G4로 끝나고 outcome 서명은 2029-05까지 산다



출처: Zwikael & Smyrk(2011) ITO 모형; Day4 워크북 ⑤ 완성 예시본 항목 1(편익 6칸 — B-04 행)·항목 5(ITO 책무 분리 서명표 05-21)·항목 6(BR-04). 속성 책임자는 Day1 ① BC 54.

그림 5-2. Input → Transform → Output | Utilisation → Outcome. 서명자 3열 — output P1 PM·이재현 / utilisation 매장운영팀장·강현도·나영선·박준영 / outcome 오정근 5·한동석 1·재무분부 판정 — 과 원장 6칸(B-04 행)

output 소유자(PM)는 종료 후 편익 판정에서 빠진다 — 편익을 낸 사람이 편익을 만든 사람이면 판정이 아니다

작성 요령 ①②③ — 이관 한 줄 · 적용 대상 · 기준값 확정

요령	규칙	온담 P1의 한 줄
① 이관 한 줄의 5요소	출처 · 소유자 실명 · 기한 · 승인/승인 전 (누가·어느 회의체) · 수신 조직	6번: 편익 원장 B-02 전제 · 나영선 · 2027-09 이사회 · 승인 전 · 생산본부
② 교훈의 적용 대상	세 층 중 하나 이상 — 다음 프로젝트 양식 / 사내 표준 조항 / 계약 문안 · 문서명·칸까지	L-09: 내부통제 지침 ”컷오버 창 앞 4주 사전 결재 목록” 조항 신설 · 재경팀장
③ 기준값 확정	승인본이 전제한 분모로 판정 · 다른 분모는 병기 · 이유를 적는다	A 91.3%(순환실사 SKU, 승인본 전제) 확정 · B 84.6% 병기, 목표 M+12 설정

91.3인가 84.6인가 — 어느 쪽이든 값 옆에 ”왜 이 분모인가”를 적지 않으면 G5에서 판정권 다툼이 된다

분모 정치 — A 91.3 → 98.5 와 B 84.6, 판정과 목표는 다른 문서다

분모 정치 — 91.3 (순환 SKU) vs 84.6 (전체 SKU): Day3의 정정은 편의 판정권의 문제였다

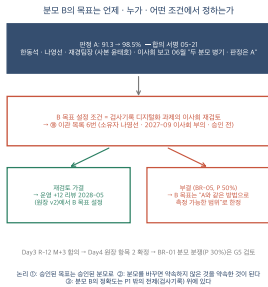
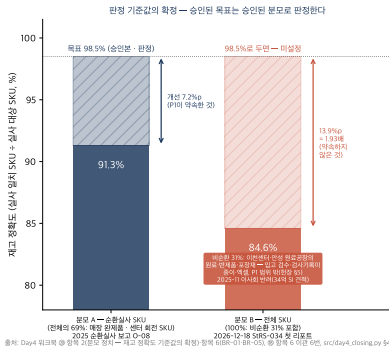


그림 5-3. A 91.3→98.5(7.2%p) vs B 84.6(13.9%p 필요, 1.93배). 비순환 SKU 31%(이천·안성 원료·반제품, 검사기록 34억 반려). 판정 A 서명 05-21 → B 목표 조건(이관 6번) → 가결/부결(BR-05) 분기

두 분모를 다 적고 판정 분모를 명시한다 — 하나를 지우는 순간 나머지 하나가 정치가 된다

흔한 오류 5

- ▶ 원가 실적을 한 층(168 승인)과만 비교 — ”절감 16.05”
- ▶ 이관 소유자가 부서명, 기한이 ”추후”, 승인 전을 승인처럼
- ▶ 교훈의 원인이 사람, 적용 대상이 ”전사”, 소유자가 PM
- ▶ 기준값에 분모·측정 시점 없음, 유리한 분모로 교체
- ▶ 측정 책임자가 ”영업본부” · 미달 시 조치가 ”원인 분석”

셋 중 둘 이상이 없으면 그 보고서는 종료를 선언한 문서이지 종료를 증명한 문서가 아니다

예시본·템플릿

- ▶ ⑱ §3.4 템플릿 · §3.5 예시본 · §3.6 해설
- ▶ ⑲ §4.4 템플릿 · §4.5 예시본 15건
- ▶ ⑳ §5.4 템플릿 · §5.5 예시본 · 그림 5-2·5-3

시간 배분 · 심화

- ▶ ⑱ 25 / ⑲ 20 / ⑳ 25 / 대조 5
- ▶ 심화(3~7년차) — 자기 회사 종료 보고서·교훈·편익 표를 §3.7·§4.7·§5.7 심화 과제로 센다

6교시 핵심 정리 — 프로젝트가 끝난 뒤에 남는 세 문서

- ▶ ⑱ 종료 보고서 — 모든 숫자는 성과보고·변경 로그·등록부의 행에서 온다
- ▶ 이관 목록 — 5요소가 다 있어야 종료와 함께 소멸하지 않는다
- ▶ ⑲ 교훈 — 상황은 숫자, 원인은 구조, 적용 대상은 문서명과 칸
- ▶ ⑳ 원장 — 6칸, 측정 책임자는 outcome 열의 실명, 판정 분모를 명시
- ▶ 세 문서는 한 실 — 이관 6번 → 개정 요청 ① → BR-05, 끊기면 편익은 승인 시점에만 존재한 숫자

끝났다고 선언한 사람·받았다고 서명한 사람·승인한 사람이 세 사람인가 — 그리고 3년 뒤 이 원장을 들고 있을 사람의 이름이 있는가

**마무리 (30분) — PM 트랙을 마치며 ·
Product 트랙 예고**

- ▶ 학술 배경 6갈래 — 표준이 ”하라”고만 말하는 곳의 ”왜”와 ”언제 틀리는가”
- ▶ 읽을 자료 — 필수 4 / 심화 8 / 참고 / 읽지 않아도 되는 것
- ▶ 4일 20종 산출물의 사슬을 거꾸로 — ㉔에서 ①로 (그림 6-1)
- ▶ 세 표준의 전환기 — PMBOK 8 · ITIL v5 · 개인정보 보호법 제21445호
- ▶ Day1~4 네 문장 · Product 트랙 예고 · 사후 읽기와 30일 과제

오늘의 한 문장 — 오픈은 이벤트가 아니라 이관이며, 이관은 받는 쪽이 서명해야 끝난다

문헌	이 교재가 빌린 것	흔한 오독
Zwikaël & Smyrk (2011)	ITO 모형 · output/outcome 책임 분리 · 프로젝트 소유자 → ⑩ ITO 서명표	"PM은 편익에 무관심해도 된다" — 아니다, utilisation이 가능한 output을 설계할 책임(두 분모 리포트 Must)
Ward & Daniel (2012)	편익 의존성 네트워크 · 편익 소유자 = 업무 변화 소유자 → 5.5절 세 실패 원인	편익 관리 = 종료 후 측정 — 아니다, 착수 때 네트워크를 그려 업무 변화 없는 편익을 미리 드러내는 것
Williams (2008) · Duffield & Whitty (2015)	교훈은 수집되나 적용되지 않는다는 실증 · Syllk 6층 → ⑨ "적용 대상·소유자" 칸	Syllk = 지식관리 도구 도입 논거 — 아니다, technology는 6층 중 하나, process·infrastructure 없으면 도구는 저장소

outcome 소유자가 없는 프로젝트는 시작하면 안 된다 — 저자들의 실제 주장이다

문헌	이 교재가 빌린 것	흔한 오독
Lundin & Söderholm (1995)	임시조직의 Transition · 제도화된 종료 → 종료 직전 이탈과 교훈 실패의 구조적 설명	종료를 "행사"로 읽는 것 — 처방은 종료의 제도화, 즉 오늘의 다섯 문서
Beyer 외, SRE (2016)	error budget = "안정과 속도의 환율" · SLI/SLO/SLA 구분 → 219.2분 · 릴리스 몫 87.7	"다운을 허용하는 면죄부" — 아니다, 릴리스 동결 규칙(policy)을 숫자로 갖는 것
Ford, Ford & D'Amelio (2008)	저항은 변화 설계에 관한 정보, 때로 추진자가 만든 것 → 3.9절 ADKAR 장벽 격자	저항 = 극복 대상 — 아니다, 가맹 K/A · 물류 A/D 장벽은 설계의 피드백

함께 읽을 것 — Accelerate(변경 실패율·복구 시간)는 환전의 입력, ADKAR·Kotter·Bridges는 저항의 진단 도구

구분	자료	왜 · 어느 부분	시간
필수	Day3 워크북 완성 예시본 5종	Day4 산출물의 입력 — EX-01 대안 3 · R-14 · 귀책 분해표 · 착시 5	60분
필수	PRINCE2 7 Closing a Project	5활동 · End Project Report · Follow-on action	40분
필수	SRE ch.3 · ch.4 (온라인 공개)	99.5% → 분 → 릴리스 환전의 원전	40분
필수	개인정보 보호법 제21445호 조문	'유출등' 정의 · 72시간 — 직접 읽고 온다	30분
심화	Zwikael & Smyrk · Ward & Daniel · Duffield & Whitty · Williams · Ford 외 · Humble & Farley ch.10 · Accelerate · ITIL Foundation v5	6.1~6.7절의 원전 — 회사 규정 개정 전에	25시간

읽지 않아도 되는 것 — ”종료 체크리스트 100가지”(항목 수가 아니라 세 칸이 문제다) · ITIL 판본 비교 블로그 · 편익 관리 SW 백서

4일 20종 산출물의 사슬을 거꾸로 — ㉔에서 ①로



그림 6-1. 편익 원장 6칸 → 편익 책무 분리(ITO) → 현장 §3 성공 기준 → BC §4 측정 책임자·분모·§6 손익분기 66%. 여섯 가
닥(측정 책임자·분모·손익분기·AC·지체상금 0·PoNR) — 고리가 비면 그 자리에서 숫자가 끊긴다

20종은 스무 개의 문서가 아니라 하나의 사슬이다 — Day1에 측정 책임자를 부서명으로 적었다면 오늘 ITO 서명표에는 서명할 사람이 없었다

표준	무엇이 바뀌었나	이 교재의 규율
PMBOK 8판 (PMI, 2025)	Focus Area · 성과영역 — 6판 번호와 병기	판본을 정직하게 말한다(각 X.2 대조표)
ITIL Version 5 (2026-02)	ITIL Value System · Lifecycle 8활동 — practice 명칭 유지	어휘를 왜 고정하는지 고지한다("ITIL 4가 최신" 금지)
개인정보 보호법 제21445호 (시행 2026-09-11)	'유출등'에 위조·변조·훼손 추가 · 72시간 통지·신고	조문은 단정, 적용은 비단정, 시한은 단정

회사 규정을 개정할 때의 순서

- ▶ ① 지금 계약서에 적힌 어휘 확인 → ② 바뀐 상위 구조 매핑 → ③ 법령의 시한을 절차에 박는다

어휘가 낡았다고 규정을 통째로 바꾸는 것과, 판본이 바뀐 줄 모르는 것은 같은 실수의 두 얼굴이다

Day	한 문장	오늘 어디에 남았나
Day1	숫자 없는 헌장은 소설이다	헌장 §3 성공 기준 → ⑳ ITO 서명표 · BC §6 66%
Day2	기준선은 협상된다	⑧ 여유 소유권 · ⑨ 145.80 → 146.82 · ⑩ R-14
Day3	편차는 결정 요청으로 끝난다	⑫ EX-01 스폰서 결정 → G4 = 기준선 완료일 → 지체상금 0
Day4	오픈은 이관이다	⑯ D+1 07:20 서명 · ⑰ SLA 3층 · ⑱ 이관 10건 · ㉑ 두 시계

네 문장은 하나다 — 결정되지 않은 것을 결정하고, 분해해 숫자로 만들고, 편차를 결정으로 되돌리고, 받는 쪽이 서명하게 한다

4일 동안 — 발주사 온담의 자리

- ▶ ”대기와 추가는 변경대가 대상”에 WBS 담당 열·RACI·동시 기록으로 답했다
- ▶ 검수 보류 회신 · 감리 귀속 이의 · 지체상금 0과 대기 비용 0.60을 같은 표로
- ▶ 서명한 SAC·SLA·원장 = 인도받은 것을 조직이 받아 쓰기 위한 문서

Day5~8 — 반대편에 선다

- ▶ 온담은 같은 회사로 다시 등장 — 이번에는 당신의 **고객**
- ▶ 당신은 한 스타트업의 프로젝트 책임자 — 온담을 **밖에서** 본다
- ▶ 종료 보고서를 읽을 수 없고, 이관 목록에 무엇이 있는지 모른다
- ▶ 세 본부장의 이음새 · CFO 결재 절차 · 부채비율 187%를 공급자 관점으로

발주자로 배운 것 — 편익의 분모 · 측정 책임자 실명 · 범위 밖 전제 · 승인 전 항목 · 반려된 견적 — 이 공급자로서 무엇을 만들어 팔 것인가의 재료가 된다

이관 목록의 한 줄이 출발점 — ”승인 전” 네 줄 중 어느 줄이 누군가의 사업이 되는가

#	내용	소유자	기한	무엇이 승인돼야
3	가맹 발주 마감 22:00 운용 전환 — 물류 야간조 편성과 함께 CAB 재상정	한동석	2027-09 CAB	야간조 편성안 · 3PL 시각 합의
6	이천센터·안성 검사기록은 P1 범위 밖(종이·엑셀). 98.5% 목표는 디지털화가 전제 — 2025-11 이사회 반려(34억) 재검토	나영선	2027-09 이사회	이사회 재상정
7	SAP ECC 2027-12 유지보수 종료 — 애드온 ·IF-SAP 8본 마이그레이션 계획(KE-04)	박세연	2027-08-31	별도 과제 예산
10	하자보수기 PMO 잔류 1명 — 유보 3.0 중 1.05 집행	프로그램 PMO장	2027-06-01 운영위	스폰서 결정

프로젝트가 끝난 뒤에도 남아 작동하는 문서는 그 프로젝트의 것만이 아니다 — 다음 프로젝트의, 다음 사람의 출발점이다. Day5에 만나자

- ▶ **사후 읽기(2주)** — PRINCE2 7 Closing a Project · SRE ch.3~4 · 개정법 조문(다시) · Duffield & Whitty
- ▶ **과제 ① 세 칸 O/X** — 원가는 어느 층과 비교됐나 / 이관 목록에 소유자 실명·승인 여부가 있나 / 측정 책임자가 실명인가
- ▶ **과제 ② 거꾸로 추적** — 그 보고서의 편익 한 줄을 BC·현장까지 거슬러 고리가 비는 지점 하나를 적는다
- ▶ **과제 ③ 한 장** — 비는 고리 하나를 채우는 개정 요청(교훈 등록부 ⑤ 소유자 · Syllk 층)을 A4 한 장으로
- ▶ **제출:** Day8 종료 전 · 형식은 워크북 §4·§5의 양식 그대로

항목의 수가 아니라 세 칸이 문제다 — 30일 뒤 당신 회사의 종료 보고서에 그 세 칸이 생기면 이 4일은 끝난 것이다
