


R2 지연 +10영업일의 귀책 분해 — 발주 7 + 동시 3 + 수행 3 — 회복 3 = 10 (임계경로 TF 0, 2026-09-30)

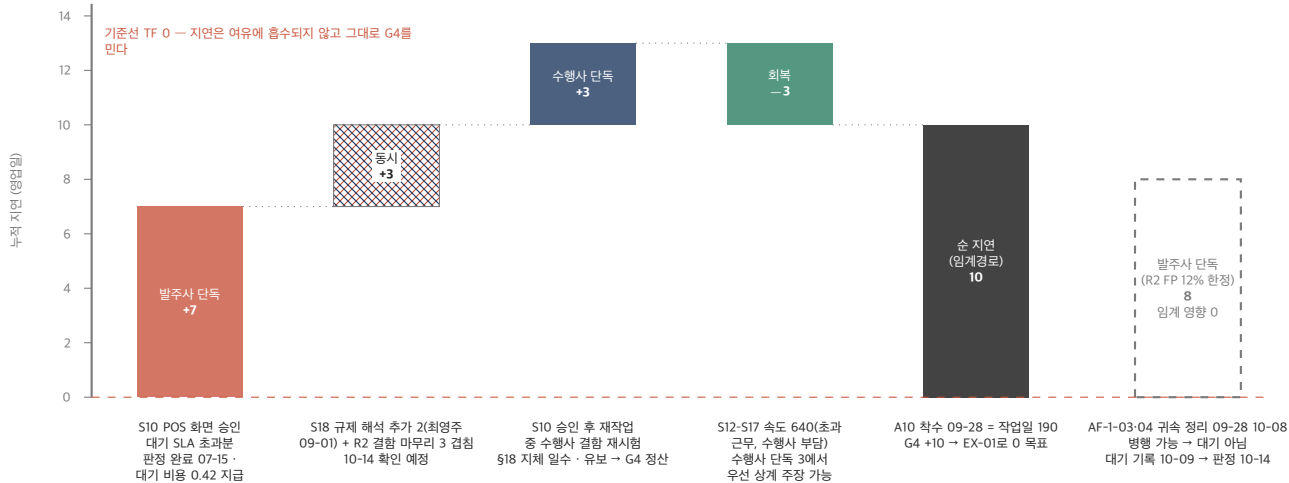

동시 지연 — SCL 프로토콜 2판 핵심 원칙 10

겹친 기간에 대해:

- 공기 연장(EOT) — 인정
- 연장 비용·대기 비용 — 불인정
- 지체상금 — 불인정

"진정한 동시성"만 — S18의 2일(발주)과 3일(수행)은 같은 3주 구간에서 실제로 겹쳤다(Day2 3.3절 정의). 변경협의체 07-15 합의 → \$14-\$18 해석 기준 → Day2 여유 소유권 문안 갱신(6월 12번).

지체상금은 산식이어야 감정이 아니다

수행사 단독 3일 × 1/1000 × 지연 부분 계약금(R2 FP 3,720 × 55만 원 = 20.46억) = 0.0614억(614만 원) [S18 요율·산정 기준 추가 설정]
회복 계획이 성공해 G4가 기준선과 같아지면 "지연"이 성립하지 않아 소멸 — 그것도 산식으로 말한다. EOT 청구 09-30 현재 없음(회복 계획 동의).

G4 정산 원칙. 최종 완료일 기준 순 지연 확정 → 귀책 분해표(매월 한 행씩 누적) 적용 → 동시 구간 상계 → 대기 비용 기지급분 정산. 지금 분해할 수 있는 이유는 각 구간의 회의록·통지·판정이 있기 때문이다 — G4에는 "복합 원인"이 된다.
