

범위 기술서와 WBS, WBS 사전

⑥ Scope Statement, WBS & WBS Dictionary

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
범위 기술서와 WBS, WBS 사전	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v0.9 / 초안 — 2026-03-27 (S6 종료), G1 승인 예정	P1 PM (발주사 IT본부)	정미란 CFO (G1 2026-04-30)

범위 기술서 (Scope Statement)

1. 문서 정보와 기준선 상태

프로젝트명·코드, 문서 버전, 상위 문서(현장 vN), 기준선 상태(초안 / G1 승인 / 변경 n차), 작성자·검토자·승인자, 관련 문서(RTM 버전, FP 기준선 확인서 번호). 기준선 상태 칸에는 다음 승인 시점을 함께 적는다. 범위 기술서 버전과 FP 기준선 버전이 따로 놓면 변경 시 어느 문서를 고쳤는지 아무도 모른다.

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 / ONE ONDAM P1	상위 문서	프로젝트 현장 v1.0 (2026-01-05)
버전 / 기준선 상태	v0.9 / 초안 — 설계 스프린트 S6 종료(2026-03-27) 시점, G1 승인 예정	관련 문서	RTM v0.9, FP 산정서 v0.9, FP 기준선 확인서 BL-01(G1 서명 예정)
작성자 / 검토자 / 승인자	P1 PM / 이재현 수행사 PM, 박세연 IT본부장, 오정근 영업본부장 / 정미란 CFO	승인 예정	G1 2026-04-30 (프로그램 이사회)

2. 포함 범위 — 산출물 단위

현장 §5의 포함 산출물을 산출물 단위로 다시 쓰되, 각 산출물에 “무엇이 포함되는가”를 3~6줄로 구체화한다. 각 줄이 WBS 레벨 3 작업패키지 하나 이상에 대응해야 한다. 현장 §13에서 “이연 가능”으로 표시된 것은 여기서도 “이연 가능(릴리스 Rn)”으로 표시. 현장 문장 복사(범위 기술서가 존재할 이유가 없다)도, SRS 570건 나열(RTM의 일)도 아니다 — 30~50줄이 적정.

산출물 ① 신규 클라우드 POS·매장 운영 시스템

- 판매·결제·반품·할인·멤버십 적립의 매장 거래 처리, 중앙 재고 실시간 연결(로컬 DB 폐지)
- 매장 운영: 개점·마감, 재고 실사 입력, 매장 발주 연계, 폐기 등록
- 결제 연동: 은행·PG·뱅 인터페이스 7본 재연결(문서 부재 2본 복원 포함)
- 직영 227점 단말 477대 신규 조달·설치, 가맹 388점 기존 단말에 SW 배포 패키지 제공
- 파일럿 12개점(P3 지점) 컷오버 전 배포, 615개 매장 펌웨어 일괄배포 패키지와 롤백 절차

산출물 ② 주문 허브(Order Hub)

- 자사오픈·배달3사·매장 POS·가맹 발주·B2B EDI 5개 채널의 주문을 하나의 주문 원장에 기록
- 배달3사 인터페이스 3본 재연결, 자사오픈 API 규격 제공(애플리케이션은 앱 벤더)
- B2B 거래처 EDI(편의점 3사·대형식품사 5사·원료유통 260개사) 주문 접수
- 옴니채널 기본 시나리오 2종: 앱 주문 매장 픽업, 매장 간 재고 이동 요청
- **이연 가능(릴리스 R5):** 매장 간 재고 이동 자동 제안, 픽업 예약 시간 지정, 주문 BI 리포트 2종 (현장 §13)

산출물 ③ 통합 재고 관리

- 매장·이천 물류센터·안성·이천 공장 출하 재고의 단일 재고 원장, 반영 지연 15분 이내
- 3PL 대성로지스 WMS 준실시간 연동 명세서와 P1측 API, 풀백 야간 배치 2회(21:00-03:00)
- P2 설비 인터페이스(15억, 별도 계약)의 P1측 데이터 규격과 수신 구현 — 설비측 구현·시험은 P2
- (주)온담푸드시스템 공장 출하 재고 연동(별도 법인 계약 구조 확정 후)
- 재고 정확도 리포트 — 순환실사 SKU 69%와 전체 SKU 100% 두 분모 병기(R-12)

산출물 ④ 가맹 발주 포털

- 발주·마감·출고 확인·배송 추적 단일 화면, 발주 리드타임 12시간 설계
- 전화·팩스·엑셀 메일 39% 흡수를 위한 엑셀 업로드·모바일 발주

- 388점 계정 발급·온보딩, 협의회 참여 프로토타입 시연(2026-05), 선행 릴리스(2026-Q4, O-02)
- 가맹 발주 웹 ↔ SAP 인터페이스 4본 대체(문서 부재 2본 복원 포함)

산출물 ⑤ 통합 계층·데이터 전환·공통 기반

- API 게이트웨이, 상품·고객 MDM, SAP 애드온(ECC 6.0 기준, 2027-12 이후 마이그레이션 고려 분리 구조)
- 인터페이스 47본 재구축·재연결, 설계문서 47본 전량(문서 부재 13본 복원)
- 데이터 전환: 1,842 테이블·7.4TB 중 5년 이내 이력 이관, 5년 초과분은 아카이브(신규 가정, \$5), 마스터 6종 정본(G2), 리허설 3회, 본 전환
- 공통 기반: 클라우드(선약정), DR·백업, 망분리·보안장비, APM·모니터링
- 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건 설계 반영, 전자금융 요건 반영

3. 제외 범위와 경계 조건

현장 §5 제외 항목을 담당과 함께 옮기고, 각 항목에 “P1이 그 항목과 맞닿는 지점에서 무엇까지는 한다”를 적는다. 경계 조건은 P1이 인도하는 것 / 상대가 인도하는 것 / 상대가 인도하지 않을 때의 폴백 세 칸. **폴백 칸이 비어 있는 경계 조건은 리스크 등록부에 위험으로 등록되어 있어야 한다.** 제외만 적고 경계에서 P1이 하는 일을 적지 않으면 “3PL 연동을 안 한다”와 “3PL 연동 명세를 쓴다”가 한 문서 안에서 충돌한다.

제외 항목	담당 (프로젝트·부서·실명)	P1이 여기까지는 함	P1이 이것은 안 함	폴백 (상대가 인도하지 않을 때) 또는 R-nn
SAP ECC 6.0 교체·업그레이드	IT본부 별도 과제(박세연)	애드온·API를 ECC 기준으로 구축, 마이그레이션 고려 분리 구조	ECC 자체 변경, S/4 전환	— (2027-12까지 ECC 유지)
이전 물류센터 설비·자동화·WMS	P2 (한동석, 타케다 PM)	재고 원장 기준 데이터 규격 T0(2026-04-24) 전 전달, P1측 수신 구현·통합시험	설비측 구현, 설비 시험 일정, WMS 자체	컷오버 물류 부분 2차 분리 — 프로그램 이사회 결정 (R-01)
3PL 대성로지스 계약 변경 협상	물류본부 (한동석)	준실시간 연동 명세서, 부하 산정서, P1측 API 구현	협상, 계약 변경 서명	야간 배치 2회 폴백, 재고 정확도 목표는 매장 재고 한정 (R-03)
매장 직원·가맹점주 교육, 슈퍼유저, 가맹 계약 부속서 개정	P3 (오정근)	UAT 참여자 선정 지원, 교육용 환경 제공, 데이터 용도 명세서	교육 실시, 388점 동의 협상	가맹 SW 배포 범위를 동의 매장으로 축소 (R-02)
개인정보 보호법 대응 완료 판정, 전자금융업 등록 신청, ISMS-P 취득	P4 (최영주)	P4가 확정한 아키텍처 요건 설계 반영, 142개 처리항목 설계 검증 자료	요건 해석, 규제기관 대응	규제 버퍼 22영업일 소진 시 P4 요건 흡수 — 흡수 결정은 프로그램 계층
운영 조직 편성, SLA 체결, 서비스데스크	P5 (박준영)	운영 이관 기술 문서(12종 중 시스템 기술 문서), SAC 초안 공동 작성	운영 절차 문서, 조직 편성	운영 절차 미완 시 기술 문서에 임시 운영 절차 부록 (R-11)
가맹점 POS 단말 하드웨어 교체	가맹 계약 협상 결과에 따름 (오정근)	388점 단말 기종 전수 조사(2026-04), 비호환 기종 목록·대응안	교체 비용 부담	비호환 매장은 컷오버 후 수기 병행 + 2차 배포 (R-13)
자사앱 UI/UX 개편	영업본부·앱 벤더 (오정근)	앱 주문 연동 API 규격 제공, 연동 시험 환경	앱 화면·기능 개편, 앱측 구현	앱측 미구현 시 앱 주문은 기존 경로 유지, B-05 지연 (R-08)

4. 산출물 인수 기준 (Acceptance Criteria)

현장 §6 주요 산출물 각각에 “무엇을 확인하면 인수인가”를 참·거짓으로 판정 가능한 문장 2~4개로. 인수자·인수 시점은 현장에서 가져오고, 여기서 새로 붙이는 것은 **판정 기준과 판정 방법**이다. 숫자는 현장 §3 성공 기준·§4 상위 요구를 인용(가용성 99.5%, 15분, 12시간). “정상 동작 확인”, “사용자 만족”은 판정 불가. 소스·형상 인수 기준(클린 빌드 재현)을 빠뜨리지 말 것.

산출물	인수 기준 (참·거짓 판정 가능, 2~4개)	판정 방법 (시험 ID·검수·감리·문서)	인수자	인수 시점
신규 클라우드 POS·매장 운영 시스템	① 직영 477대 설치·거래 처리 성공 100% ② 가맹 배포 패키지가 호환 기종 전 유형에서 설치·거래 성공 ③ 성수기 창 밖 배포 잠금 동작 ④ 롤백 리허설 2회 기록	통합시험 TC-POS-001~180, 설치 확인서, 롤백 리허설 기록 RH-01~02	오정근, 박세연	G3 2027-02-19, 컷오버
주문 허브	① 5개 채널 주문이 채널 식별자와 함께 단일 원장에 기록 ② 픽업·매장 간 이동 기본 시나리오 2종 UAT 통과 ③ 배달3사 3분·B2B EDI 접수 통합시험 통과	통합시험 TC-ORD-001~085, UAT-ORD-01~05	오정근	G3 (고도화 R5는 G4)
통합 재고 관리	① 3개 재고원 단일 원장 조회, 반영 지연 15분 이내 ② 3PL 준실시간 또는 폴백 자동 전환 시험 통과 ③ 재고 정확도 리포트 두 분포 병기 ④ P2 인터페이스 수신 시험 통과(설비측 MC 후)	통합시험 TC-INV-001~040, 성능시험	한동석, 박세연	G3
가맹 발주 포털	① 388점 계정 발급 100% ② 발주→출고 확정 12시간 설계 검증(시험 데이터) ③ 협의회 지정 점주 5명 사용성 검수 통과	UAT TC-FRN-001~060, 사용성 검수 조서	오정근, 서정필(검수 참여)	선행 릴리스 2026-Q4, G3
통합 계층·데이터 전환 결과	① API GW·MDM·SAP 애드온 가동, 인터페이스 47분 통합시험 통과 ② 전환 검증 6종(건수·합계·키 정합·참조 무결성·표본 대사·업무 검증) 통과 ③ 리허설 3회차 34시간 이내	통합시험 TC-INT-001~094, 전환 검증 보고서	박세연	리허설 3회차 2027-01-29 → 컷오버
인터페이스 설계문서 47본	① 47본 전량, 문서 부재 13분 포함 ② 표준 양식(연동 주체·주기·항목·오류 처리) 충족	감리 문서 검토	박세연	G2 2026-11-27
소스·형상 인수	① 발주사 저장소에서 클린 빌드 재현 100% ② 3자 컴포넌트 목록(SBOM)·라이선스 제출 ③ 빌드·배포 절차서	형상관리 담당 재현 시험	박세연, 발주사 형상관리 담당	G4 2027-05-29
운영 이관 기술 문서	① SAC 기술 항목 전부 대응 문서 존재 ② 장애 대응 절차 3건 이상 실제 수행 기록	SAC 점검표	박준영	G4

5. 범위 관련 가정과 제약

현장 §9의 가정·제약 중 범위에 직접 영향을 주는 것만 골라 옮기고, 작성 중 새로 발견한 가정은 “[신규]”로 표시해 현장 v1.1 수정 요청으로 잇는다. 가정에는 확인 시점·확인 책임자, 제약에는 출처를 붙인다. 범위와 무관한 현장 가정까지 전부 복사하지 말 것.

가정 [내용] (확인: 책임자, 시점) — 출처 / [신규] 표시

- 3PL 계약 변경이 2026-06-30까지 타결된다 (확인: 한동석, 미타결 시 폴백) — 현장 가정 1
- 가맹 부속서 개정이 2026-08-14까지 388점 동의를 확보한다 (확인: 오정근) — 현장 가정 2
- 앱 벤더가 P1 API 규격에 맞춰 2026-12까지 연동을 완료한다 (확인: 오정근·박세연) — 현장 가정 4
- P2 MC 2027-02-12 달성, 물류 인터페이스 통합시험 G3 전 5영업일 확보 (확인: 프로그램 PMO) — 현장 가정 5
- **[신규]** 파일럿 12개점은 컷오버 전(2027-01) OD-POS와 신 POS를 병행하며, 그 기간의 임시 재고 동기화 연동(1.1.7)이 필요하다 (확인: P3 PM·박세연, 2026-06) — 현장 v1.1 범위 수정 요청 대상
- **[신규]** 데이터 전환 대상 이력 7.4TB 중 5년 초과분(약 2.6TB 추정 [추가 설정])은 아카이브 저장소에 보관하고 신 플랫폼에 는 이관하지 않는다 (확인: 박세연·재경팀장 — 세무·감사 보존 요건, 2026-04) — 원가 기준선 조정 근거(⑨ 항목 3)

제약 [내용] (출처) — 현장 제약 n

- 컷오버 전까지 OD-POS 2.1·SAP ECC 6.0 병행 운영 (출처: IT본부) — 현장 제약 3
- (주)온담푸드시스템 별도 법인 — 공장 연동은 별도 계약·개인정보 처리 주체 (출처: 법무) — 현장 제약 7
- 수행사 계약 FP 12,400점 고정가, 요구사항 동결 월 1회, FP 누적 변동 $\pm 3\%$ 시 기준선 재확인 (출처: 계약서 부속서 1) — 현장 제약 8
- 대성로지스 WMS 커스터마이징 불가 (출처: 3PL 계약) — 현장 제약 5

6. 범위 변경 규칙

범위 기준선을 바꾸는 절차와 트리거. Day1 거버넌스(변경협의체 → CCB → 계약 변경)를 인용하되 범위 특유의 트리거 — 월 요구사항 동결, FP 누적 변동 $\pm 3\%$, 릴리스 이연 — 를 명시. 허용범위의 단위(건 / FP / %)는 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 범위 축과 같아야 한다. “변경관리 계획 참조”로 끝내지 말 것.

- 요구사항은 매월 마지막 수요일에 동결한다. 동결 2주 전 수요일에 접수를 마감하며(R-07 대응), 마감 후 접수분은 다음 달 동결로 넘긴다.
- MoSCoW 분류에서 Must는 릴리스별 FP의 60% 이하로 유지한다. 초과 시 Senior User(오정근)가 Should로 내릴 항목을 지정한다.
- 허용범위 내 변경(월 순변동 ± 35 건 이하, FP 누적 ± 372 점 이하)은 P1 PM이 승인하고 CCB에 사후 보고한다. 초과 시 CCB 승인, 변경협의체 합의 선행.
- FP 누적 변동이 $\pm 3\%$ (± 372 점)를 넘는 순간 기준선 재확인(P1 PM·이재현·형상관리 담당 3인 서명)을 실시한다. 분기 1회 정기 재확인도 별개다.
- 릴리스 이연(R5로 이연 가능 항목의 실제 이연 결정)은 현장 §13을 인용해 CCB가 승인한다. 이연 항목은 범위 기준선에서 빠지는 것이 아니라 인도 시점이 바뀌는 것이며, FP 기준선은 유지된다.
- 범위 기술서·WBS·RTM·FP 기준선 확인서는 하나의 범위 기준선이다. 어느 하나를 바꾸면 넷 모두의 버전이 올라간다.


WBS (Work Breakdown Structure)

7. WBS 구조 규칙 (레벨·코드·분해 기준)

레벨의 의미(L1 프로젝트 / L2 산출물 / L3 작업패키지), 코드 체계(1.1.1), 분해 기준(산출물 지향, 100% 규칙, 작업패키지 크기 상하한), 프로젝트 관리 작업의 위치를 5~7줄로. L2에 “프로젝트 관리” 노드를 반드시 둔다 — PMO·감리·통합시험·컷오버 관리가 갈 곳. 활동(“설계하기·개발하기·시험하기”)으로 분해하면 산출물 하나의 원가가 세 노드에 흩어지고 인수 기준을 붙일 곳이 없다.

- L1 = P1. L2 = 현장 §5 포함 5개 산출물(1.1~1.5) + 프로젝트 관리·통합 검증(1.6). L3 = 작업패키지 43개.
- 코드 1.n.m. 작업패키지 크기: 스프린트 1~6회 상당(원가 약 0.5~9억). 하한 미만은 상위 패키지에 흡수, 상한 초과는 분할.
- 분해 기준: 산출물 지향(명사), 100% 규칙(L2 합 = L1, L3 합 = L2), 상호 배타(같은 인도물이 두 패키지에 없다).
- 인프라(클라우드·DR·망분리)는 1.5 공통 기반에, 통합시험·성능·보안진단·감리·컷오버 관리는 1.6에 둔다. 컷오버 “매장·주문 1차 / 물류 2차” 분리 옵션(R-01)은 1.3.4와 1.6.9를 분리해 둬으로써 구조에 반영한다.
- 담당 열의 발주/수행 구분은 FP 12,400점의 안팎을 가른다. 발주 담당 패키지는 수행사 FP에 포함되지 않으며, 발주사 미결정 대기(R-05)는 이 패키지들의 일정 지연으로 나타난다.

레벨 1·2 트리 (L2 노드에 FP / 원가(억)를 적고 합계가 계획 원가와 같은지 확인)

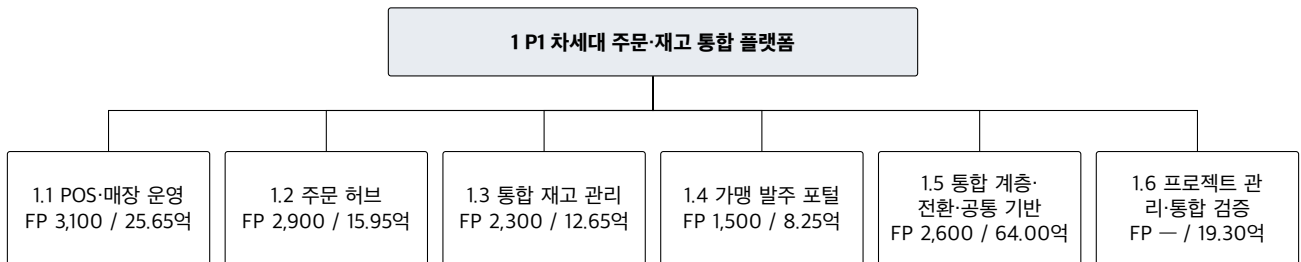

합계 FP 12,400 / 145.80억 = 계획 원가 (◎ 항목 2)

8. WBS 트리 — 레벨 2·3 목록

코드, 작업패키지명(명사 — “~규격서”, “~모듈”, “~패키지”), 대표 산출물, 담당(발주/수행/공동, 실명·팀), 릴리스·스프린트 위치, 인수자. 원가는 L2까지만(항목 9), L3 원가는 WBS 사전에. 담당 칸의 발주/수행 구분은 고정
가 계약에서 FP 밖의 패키지(조달·단말·정보 판정·협상 지원)를 드러낸다. 작업패키지가 100개를 넘으면 관리 불가, 10개 이하면 원가를 붙일 수 없다. 컷오버·안정화·이관·종료가 없는 WBS는 끝나지 않는다.

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
●			1	P1 차세대 주문·재고 통합 플랫폼				
	●		1.1	POS·매장 운영 시스템				
		●	1.1.1	POS 요구·화면 설계서	화면 정의서, 거래 시나리오	수행 POS팀 + 오정근(요구)	R0 S1-S6	오정근
		●	1.1.2	매장 거래 처리 모듈	판매·결제·반품·할인·멤버십	수행 POS팀	R1-R2 S7-S18	박세연
		●	1.1.3	매장 운영 모듈	개점·마감·실사·폐기·발주 연계	수행 POS팀	R2-R3 S13-S24	오정근
		●	1.1.4	결제·PG·벤 인터페이스 7본	인터페이스 7본, 문서 2본 복원	수행 인터페이스팀	R2 S13-S18	박세연
		●	1.1.5	직영 단말 477대 조달·설치	단말·주변기기, 설치 확인서	발주 (강현도 조달, 매장운영 설치)	2026-12~2027-02	오정근
		●	1.1.6	가맹 단말 호환성 조사·SW 배포 패키지	388점 기종 조사서, 비호환 목록, 배포 패키지	발주 (오정근 조사) + 수행 POS팀	조사 2026-04, 패키지 R4	오정근
		●	1.1.7	파일럿 12개점 배포·임시 연동	파일럿 배포 기록, 임시 재고 동기화	공동 (P3 PM, 수행 POS팀)	R4 S27-S28	오정근, P3 PM
		●	1.1.8	컷오버 펌웨어 일괄배포·롤백 패키지	배포 패키지, 롤백 절차서, 리허설 기록	수행 POS팀 + 발주 운영	R4 S29-S30	박세연, 박준영
	●		1.2	주문 허브				
		●	1.2.1	주문 원장 모델·채널 설계서	원장 모델, 채널별 매핑 규칙	수행 주문팀 + 오정근	R0 S1-S6	박세연
		●	1.2.2	주문 원장 코어 모듈	주문 원장, 상태 관리, 정합 검증	수행 주문팀	R3 S19-S24	오정근
		●	1.2.3	자사옴·배달3사 채널 연동	배달3사 3본 재연결, 앱 API 규격·연동	수행 인터페이스팀 (애플: 벤더)	R3 S19-S24	오정근, 박세연
		●	1.2.4	B2B EDI 채널 연동	편의점·식품사·원료유통 EDI 접수	수행 인터페이스팀	R4 S25-S26	조성태(공장), 오정근
		●	1.2.5	옴니채널 시나리오 (기본 2종 / 고도화 이연)	픽업·매장 간 이동 기본 / 자동 제안·예약·BI 2종	수행 주문팀	기본 R4 S25-S26 / 고도화 R5 S32-S34	오정근
	●		1.3	통합 재고 관리				
		●	1.3.1	재고 원장 모델·규격서 (P2·3PL 협상 지원 자료 포함)	원장 모델, P2 인터페이스 규격(TO 전), 3PL 부하 산정서	발주 (박세연, 한동석 협의) + 수행 재고팀	R0 S1-S6, T0 2026-04-24	박세연, 프로그램 PMO장
		●	1.3.2	재고 원장 코어 모듈	3개 재고원 단일 원장, 15분 반영	수행 재고팀	R2 S13-S18	한동석
		●	1.3.3	3PL WMS 준실시간 API·풀백	연동 명세서, P1측 API, 야간 배치 2회 풀백, 자동 전환	수행 인터페이스팀 (협상: 한동석)	R2 S13-S16	한동석, 박세연
		●	1.3.4	P2 설비 인터페이스 P1측 수신 구현·시험	수신 모듈, 통합시험 결과(MC 후)	수행 인터페이스팀 (설비측: P2)	R3 구현, 시험 2027-02-12~18	프로그램 PMO장
		●	1.3.5	공장 출하 재고 연동 (별도 법인)	온담푸드시스템 연동 2본, 계약·보안 정책 반영	수행 인터페이스팀 (계약: 최영주·조성태)	R3 S19-S24	조성태, 박세연
	●		1.4	가맹 발주 포털				
		●	1.4.1	포털 요구·UX 설계서 (협의회 참여)	화면 정의서, 점주 인터뷰 기록	수행 포털팀 + 오정근·서정필	R0 S1-S6	오정근
		●	1.4.2	발주·마감·출고 확인·배송 추적 모듈	포털 모듈, 엑셀 업로드·모바일	수행 포털팀	R1-R3 S7-S22	오정근
		●	1.4.3	프로토타입 시연·선행 릴리스	프로토타입(2026-05), 선행 릴리스(2026-Q4)	수행 포털팀 + 발주 매장운영	R1 S9, R3 S23-S24	오정근, 서정필
		●	1.4.4	388점 계정·온보딩	계정 발급, 온보딩 안내(교육은 P3)	발주 매장운영 + 수행 포털팀	R3-R4	오정근
	●		1.5	통합 계층·데이터 전환·공통 기반				
		●	1.5.1	아키텍처·비기능 설계서	아키텍처 정의서, 가용성 99.5%-망분리·규제 요건 매핑	수행 아키텍처 + 박세연·최영주	R0 S1-S6	박세연
		●	1.5.2	API 게이트웨이 구축	상용 API GW 설치·정책, 47본 라우팅	수행 통합팀 + SW 벤더	R1 S7-S12	박세연
		●	1.5.3	상품·고객 MDM 구축	MDM 설치, 마스터 모델, 정책 규칙	수행 통합팀 + SW 벤더	R1-R2 S7-S18	박세연
		●	1.5.4	SAP 애드온·SAP 인터페이스 15본	애드온, OD-POS↔SAP 11본·가맹발주↔SAP 4본 대체	수행 SAP팀	R2-R3 S13-S22	박세연
		●	1.5.5	인터페이스 47본 재구축·설계문서	47본 설계문서(13본 복원), 재연결	수행 인터페이스팀 + 박세연(복원 지식)	복원 S2-S6, 재구축 R1-R4	박세연
		●	1.5.6	클라우드·DR·망분리·APM 인프라	클라우드 환경, DR, 망분리·보안장비, APM	발주 (박세연, 강현도 조달) + 벤더	조달 2026-02-04, DR 2026-12~2027-01	박세연
		●	1.5.7	데이터 전환 설계·매핑 (1,842 테이블)	매핑 정의서, 전환 프로그램, 아카이브 정책	데이터 전환 용역사 + 박세연	2026-03-30~10-23	박세연
		●	1.5.8	마스터 6종 정제·정보 판정 (G2)	정제 결과, 정보 판정서, 동결 규칙	발주 (박세연 R, 감리 확인) + 용역사	2026-10-26~11-20 → G2	프로그램 이사회
		●	1.5.9	전환 리허설 1~3회차	리허설 결과 3건, 검증 6종 보고서	용역사 + 수행 + 발주 운영	2026-11-23~2027-01-22	박세연
		●	1.5.10	본 전환 실행	전환 완료 보고, 검증 6종	용역사 + 수행	컷오버 2027-02-26~28	박세연
	●		1.6	프로젝트 관리·통합 검증				

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
		●	1.6.1	기획·기준선 (G1)	범위·일정·원가 기준선, FP 확인서 BL-01	발주 P1 PM + 이재현	2026-03-30~04-24 → G1	프로그램 이사회
		●	1.6.2	PMO 운영·형상관리·품질보증	월 보고, 형상 저장소, 품질 지표	발주 P1 PMO 3명	상시	P1 PM
		●	1.6.3	요구사항 관리 (RTM·월 동결)	RTM, 동결 기록 12회, 기준선 재확인서	발주 PMO + 수행	상시	P1 PM, 오정근
		●	1.6.4	통합시험	TC 400건, 결과 보고	수행 시험팀 + 발주 검증	S25-S27 (2026-12-07~2027-01-15)	박세연
		●	1.6.5	성능·부하시험	부하시험 보고(피크 5,100 케이스/h 기준 재고 API)	3자 시험 + 수행	2027-01	박세연, 박준영
		●	1.6.6	보안취약점 진단	진단 보고 2회(규제 전·컷오버 전), High 0건	3자 진단	2026-08, 2027-01	최영주, 박세연
		●	1.6.7	UAT	UAT TC 360건, 종료 기준 판정	발주 현업 + 수행	S28-S30 (2027-01-18~02-18)	오정근
		●	1.6.8	외부 감리 대응 (G1·G2·G3·G4)	감리 지적·시정 기록	발주 PMO (정하늘 감리)	게이트별	P1 PM
		●	1.6.9	컷오버 계획·실행·안정화 (매장·주문 / 물류 분리 옵션)	컷오버 계획, go/no-go 자료, 하이퍼케어 보고	공동 (P1 PM, 이재현, 박준영)	G3 → 2027-02-26~28 → S31-S34	정미란(go/no-go)
		●	1.6.10	운영 이관 기술문서·소스 인수 (G4)	기술 문서, 클린 빌드 재현, SBOM	발주 (박세연, 형상 담당) + 수행	S35-S36	박준영, 박세연
		●	1.6.11	종료 (보고서·교훈)	종료 보고서, 교훈 기록	발주 P1 PM	G4	정미란

작업패키지 43개 = 발주 담당 10(1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.5.6, 1.5.8, 1.6.1~1.6.3, 1.6.8, 1.6.10) + 수행 담당 28 + 공동 5.

9. L2 원가·FP 배분

행 = L2, 열 = 원가 항목, 합계 행·열. SI는 FP 배분 × 단가, 나머지는 항목의 성격으로 배분한다. **합계가 원가 기준선(㉔)의 계획 원가와 정확히 같아야 한다** — 다르면 WBS 또는 원가 기준선 중 하나가 100% 규칙을 어긴 것이다. SI만 배분하고 라이선스·인프라·PMO를 “공동”으로 남기면 L2 합이 기준선과 맞지 않는다.

L2	FP	SI (FP × 단가)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계 (억)
1.1 POS·매장 운영	3,100	17.05	—	—	8.60	—	—	—	25.65
1.2 주문 허브	2,900	15.95	—	—	—	—	—	—	15.95
1.3 통합 재고	2,300	12.65	—	—	—	—	—	—	12.65
1.4 가맹 발주 포털	1,500	8.25	—	—	—	—	—	—	8.25
1.5 통합 계층·전환·공동 기반	2,600	14.30	19.40	20.90	—	9.40	—	—	64.00
1.6 프로젝트 관리·통합 검증	—	—	—	—	—	—	9.70	9.60	19.30
합계	12,400	68.20	19.40	20.90	8.60	9.40	9.70	9.60	145.80

SI 열 = FP × 55만 원. 상용SW 19.40·인프라 20.90·전환 9.40·PMO 9.60은 승인 내역(23.4 / 23.9 / 11.4 / 12.6)에서 조정된 기준선 값 — 조정 근거는 ㉔ 항목 3. 합계 145.80 = 계획 원가.

WBS 사전 (작업패키지 카드)

10. WBS 사전 — 작업패키지 카드

작업패키지마다 한 장. 코드·명칭 / 산출물(인도물 목록) / 인수 기준과 판정 방법 / 담당·인수자 / 선행·후행·외부 의존(상대 설명·기한) / 추정(값과 근거)를 같이: “FP 420 × 55만 원 = 2.31억, 근거: FP 산정서 v0.9 §3.3” / 관련 요구(RTM ID)·리스크(R-ID) / 가정. PRINCE2의 Product Description과 같은 항목. 43장을 다 쓰려다 아무것도 쓰지 않는다 — 외부 의존이 있는 것, 임계경로에 있는 것, 발주사 담당인 것부터.

카드 1.3.3 — 3PL WMS 준실시간 API·폴백

항목	내용
코드 / 명칭	1.3.3 / 3PL 대성로지스 WMS 준실시간 연동 API와 야간 배치 폴백
산출물 (인도물)	① 연동 명세서 v1.0(항목·주기·오류 처리·부하) ② 부하 산정서(한동석 협상용, 2026-03) ③ P1측 수신·송신 API ④ 야간 배치 2회(21:00~03:00) 폴백 모듈 ⑤ 준실시간→폴백 자동 전환 기능과 전환 시험 결과
인수 기준 / 판정 방법	① 준실시간 모드: 센터 입출고가 재고 원장에 15분 이내 반영(TC-INV-021~030) ② 폴백 모드: 배치 2회 자동 실행·실패 시 재시도·알림(TC-INV-031~036) ③ 모드 전환 시 재고 원장 정합 100%(TC-INV-037~040) ④ 부하 산정서에 대성 서면 최신 첨부 / 통합시험, 성능시험
담당 / 인수자	수행 인터페이스팀(리더: 한빛디지털 인터페이스 PL) + 발주 물류본부 센터운영 담당 / 한동석 물류본부장, 박세연 IT본부장
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.3.1(규격), 1.3.2(원장 코어) / 후행 1.6.4(통합시험), 1.6.5(성능) / 외부: 대성로지스 계약 변경 타결 — 한동석, 2026-06-30. 미타결 시 ④·⑤만 인도하고 ③은 명세·구현 완료 상태로 보관
추정 (값 + 근거)	FP 420 × 55만 원 = 2.31억 (근거: FP 산정서 v0.9 §3.3 — 인터페이스 5분 × 트랜잭션·데이터 기능) / 공수 4.2 인월 / 기간 40영업일 (S13-S16, 2026-06-22~08-14) / 발주사 공수 0.5 인월(부하 산정·검증)
관련 요구 / 리스크	StRS-031, 032, 034 (HR-01) / R-03 (소유자 한동석), R-12(정확도 분모)
가정	대성 WMS의 기존 EDI 형식이 준실시간 API에도 유지된다 — 아니면 매핑 재작업 FP +60 (확인: 수행 인터페이스 PL, 2026-04)

카드 1.5.8 — 마스터 6종 정제·정보 판정 (G2)

항목	내용
코드 / 명칭	1.5.8 / 마스터 데이터 6종(상품·고객·매장·거래처·가격·재고) 정제 및 정보 판정
산출물 (인도물)	① 정제 규칙서(중복·결측·코드 체계) ② 정제 결과 보고(6종 건수·중복률 전후) ③ 정보 판정서(G2 2026-11-27 프로그램 이사회) ④ 정본 이후 변경 동결 규칙(CCB 의결, R-10 회피) ⑤ 610개 종속 테이블 매핑 확정 목록
인수 기준 / 판정 방법	① 6종 중복률 0.5% 이하, 필수 항목 결측 0 ② 상품 코드 체계 확정서에 오정근·조성태·강현도 서명 ③ 감리(정하늘) 확인 의견 첨부 — 박세연은 ROI며 A가 아님(RACI 23행, 이해 충돌 기록) ④ 동결 규칙 CCB 의결서 / 감리 문서 검토, 정제 결과 표본 대사
담당 / 인수자	발주 IT본부(박세연 R) + 데이터 전환 용역사 + 현업 데이터 오너(상품: 오정근·조성태 / 거래처·가격: 강현도 / 매장: 매장운영 / 고객: 영업본부 CRM) / 프로그램 이사회(A)
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.5.7(매핑), 1.5.3(MDM) / 후행 1.5.9(리허설), 1.2.2~1.3.2(원장 코어의 마스터 참조) / 외부: 신규 브랜드·B2B 상품 코드 요구 — 영업본부, 2026-10까지 접수 마감
추정 (값 + 근거)	데이터 전환 용역 9.4억 중 2.6억 [추가 설정] / 발주 공수 3.0 인월(데이터 오너 검토) / 기간 20영업일 (2026-10-26~11-20), G2 여유 5영업일 / 비가격 — 판정 후 되돌림 3.8억·6주(R-10)
관련 요구 / 리스크	StRS-141, 161 (HR-07, HR-08), SyRS 데이터 요구 42건 / R-10 (소유자 박세연), R-06 (원 개발자 지식)
가정	온담푸드시스템 별도 법인의 상품 마스터가 그룹 코드 체계를 수용한다 (확인: 조성태, 2026-08)

카드 1.1.6 — 가맹 단말 호환성 조사·SW 배포 패키지

항목	내용
코드 / 명칭	1.1.6 / 가맹 388점 POS 단말 호환성 전수 조사와 가맹용 SW 배포 패키지
산출물 (인도물)	① 388점 단말 기종·OS·메모리 조사서(회수율 100%, 2026-04-30) ② 비호환 기종 목록과 매장 수, 대응안 3개(교체·임대·수기 병행) ③ 가맹용 SW 배포 패키지(기종별 2~3종) ④ 파일럿 12개점 중 구형 기종 매장 2개 이상 포함 배포 결과
인수 기준 / 판정 방법	① 조사 회수율 100%, 기종 분류 완료 ② 비호환 매장 비율 확정(10% 초과 시 R-13 트리거) ③ 배포 패키지가 호환 기종 전 유형에서 설치·거래 처리 성공(TC-POS-150~180) ④ 파일럿 구형 기종 배포 성공률 100% / 조사 보고, UAT, 파일럿 기록
담당 / 인수자	발주 영업본부 매장운영(조사, 오정근 A) + 수행 POS팀(패키지) / 오정근
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.1.1 / 후행 1.1.7(파일럿), 1.1.8(일괄배포) / 외부: 가맹 부속서 개정 388점 동의 — 오정근, 2026-08-14. 교체 비용 부담 결정은 P1 범위 밖(현장 \$5 제외)
추정 (값 + 근거)	FP 180 × 55만 원 = 0.99억(패키지) + 조사 비용 0.3억 [추가 설정, 발주 매장운영 출장·설문] / 발주 공수 2.0 인월 / 기간: 조사 40영업일(2026-03~04), 패키지 S25-S28
관련 요구 / 리스크	StRS-071, 091 (HR-03, HR-04) / R-02 (소유자 오정근), R-13 (소유자 P1 PM)
가정	2013년 이전 기종은 약 90대로 추정되며(프리모템 원문 11) 조사로 확정한다. 비호환 매장의 수기 병행은 최대 4주 (확인: 오정근, 2026-05)

나머지 40개 카드는 G1(2026-04-30)까지 같은 양식으로 작성하고 스프린트마다 갱신한다 (작성 순서: 외부 의존 → 임계경로 → 발주 담당).
