PM 트랙 Day 1

프로젝트 매니지먼트 일반론과 착수

PM 트랙 Day 1 — 오늘의 사례와 세 질문

- 프로젝트 매니지먼트 4일 특강 · 1일차
- 사례 회사: ㈜온담F&B홀딩스 ONE ONDAM 프로그램 **P1**「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」
- 승인 예산 **168억 원** · 2026-01-05 ~ 2027-05-29 · 하이브리드(스프린트 36회 + 게이트 G0~G5)

오늘의 세 질문 — 이것은 무엇인가 / 무엇을 따를 것인가 / 어떻게 시작할 것인가

오늘의 흐름

오전 — 이론 (제1~2장)

- **0교시** 20분 · 사례 브리핑 — 온담F&B와 P1, 책받침 한 장
- **1교시** 80분 · 용어 정리 · 프로젝트란 무엇인가 · 왜 실패하는가 — 제1장
- **2교시** 90분 · 표준의 지형 — PMBOK 6→7→8, PRINCE2, ISO, 테일러링 — 제2장

오후 — 착수 이론과 실습이 번갈아

- **3교시** 90분 · 착수 이론 — BC · 편익 소유 · 헌장 · 이해관계자 — 제3장 전반
- **4교시** 90분 · **실습** ① BC 요약 + 헌장 — 워크북 §1~2
- **5교시** 75분 · 거버넌스 · 권한 없는 PM · 프리모템 · 분야별 착수 — 제3장 후반
- **6교시** 75분 · **실습** ② 등록부 · RACI · 프리모템 — 워크북 §3~5
- **마무리** 20분 · 학술 배경 · 읽을 자료 · Day2 예고 — 제4~5장

오늘 만든 다섯 산출물이 Day2 계획 산출물의 입력이 된다

학습 목표 — 오늘이 끝나면

오전 이론

1. 프로젝트·프로그램·운영을 **돈과 권한의 언어**로 구분한다
2. CHAOS·Flyvbjerg 수치를 **왜 그대로 인용하면 안 되는지** 말한다
3. PMBOK 6→7→8 계보 — 사내 표준을 **재매핑 대장** 네 칸으로
4. 테일러링 기준 = **되돌림 비용** — P1과 P2에 다른 처방

오후 실습

5. BC 결함을 목록화하고 **편익 오너가 PM이 아닌 이유**를 설명한다
6. 헌장 15항목 · 이해관계자 3속성 7유형 · RACI · 프리모템을 온담 P1으로 **직접 작성**한다

자격시험 수업이 아니다 — 기초는 다루지 않고, 판단을 다룬다

0교시 (20분) — 사례 브리핑: 온담F&B홀딩스와 P1

사례를 어떻게 쓰는가 — 통독하지 않는다

- 사례 문서(25쪽)는 **사전**이다 — 소설처럼 읽고 외우는 문서가 아니다
- 교재의 온담 단락마다 ■ **사례 사실** 줄이 그 단락이 쓰는 사실과 출처(§·숫자 표 ID)를 먼저 준다
- 워크북의 산출물마다 ◆ **실습 입력 카드**가 필요한 정본 §·앞 산출물·추가 조건을 모아 준다
- 교재 절 첫머리의 ○ ● ⇒, 워크북 카드의 ※ ▷와 저녁 대조의 □ — 채우는 사람이 먼저 읽는 블록(학습안내 §0)
- 책상 위에는 **사례 한 장**(책받침) — 타임라인·인물 13명·숫자 12
- 오늘 20분 동안 그 한 장을 같이 읽는다 — 회사 / 왜 P1인가 / 날짜 / 사람

사례를 다 읽어 왔는지 묻지 않는다 — 다음 네 장을 보면 오늘 수업을 따라올 수 있다

온담F&B홀딩스 — 어떤 회사인가

규모와 돈

- 카페·베이커리·델리 3브랜드 **615개 매장**(직영 227 / 가맹 388) + B2B 원료 유통
- 2025 매출 **8,740억**, 영업이익 312억(**3.6%**) — 이익이 얇다
- 부채비율 **187%**, 사모펀드 350억 → **2027년 IPO** 조항

왜 P1인가

- 매장 시스템 **OD-POS 2.1**(2011 자체개발) 수명 종료, 원 개발자 1명 재직
- 인터페이스 47본 중 **13본 설계문서 없음**, 재고를 실시간으로 못 본다
- 두 번의 실패 — **2019 스마트오더 34억 중단**, **2022 WMS 12억 축소**

돈이 얇고 시계가 빠른 회사가 세 번째 시도를 한다 — 이사회는 "세 번째 실패는 없다"를 문서로 걸었다

P1 — 무엇을, 얼마에, 언제까지

범위 — 다섯 산출물


- ① 클라우드 POS·매장 운영 ② 주문 허브 ③ 통합 재고 ④ 가맹 발주 포털 ⑤ 통합 계층·데이터 전환(1,842 테이블·7.4TB)
- **제외**: SAP ECC 교체 · 물류 설비(P2) · 교육(P3) · 규제 등록(P4) · 운영 조직(P5)

돈과 시간

- 예산 **3층** — 승인 168.0 / 집행 한도 156.0 / 계획 원가 145.8
- SI 계약 68.2억 = **FP 12,400 × 55만 원** 고정가, 수행사 한빛디지털
- 2026-01-05 → 2027-05-29, 스프린트 36회 + 게이트 G0~G5 — **하이브리드**

P1은 프로그램 ONE ONDAM(428억, P1~P5)의 척추다 — 편익 214억은 P1 혼자 만들지 않는다

P1 타임라인 — 움직일 수 없는 날짜 셋

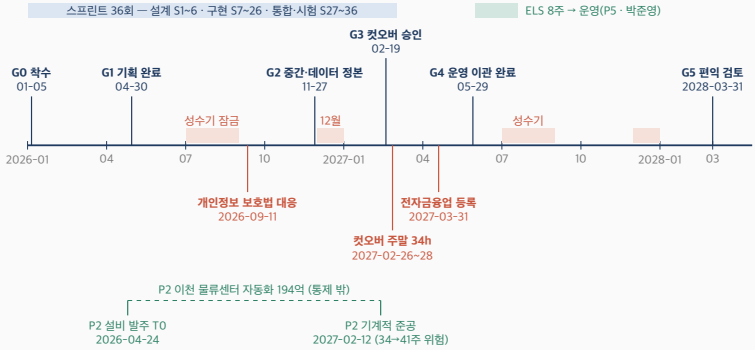

사례 §3.4·§3.5·§5.4. 붉은색 = 협상 불가능한 외부 기한(컷오버 창은 IPO 2027-3Q 예비심사에서 역산).

2026-09-11 · 2027-02-26~28 · 2027-03-31 — 이 셋은 협상 대상이 아니다. 컷오버 창은 IPO 예비심사에서 거꾸로 센 날짜다

사람 13명과 세 개의 시계

오늘 이름을 알아야 할 여덟

- **김선호** 대표 — 이사회 의장, "일정이 먼저다" · **정미란** CFO — 스폰서·CCB 위원장, "148억으로"
- **오정근** 영업본부장 — Senior User, "성수기 절대 금지" · **박세연** IT본부장 — Senior Supplier, OD-POS 원 설계자
- **한동석** 물류본부장 — 3PL 계약 소관 · **박준영** 서비스운영팀장 — SAC 판정권
- **서정필** 가맹점주협의회장 — 388점 서면 동의 · **이재현** 수행사 PM — "대기·추가는 변경대가"

세 개의 시계 (사례 §6.3)

- **대표** — IPO: 2027-3Q 예비심사 전 안정 가동 → "더 앞당기라"
- **CFO** — 부채비율 187 → 160%: 1차연도 176억을 **148억**으로
- **수행사·감리** — FP 12,400 안에서 손익률 6.5%: 당기면 변경대가, 줄이면 재협상

세 시계는 맞지 않는다 — PM이 맞추는 게 아니라 헌장의 우선순위 칸에 적어 스폰서가 결정하게 한다

1교시 (80분) — 프로젝트란 무엇인가, 왜 실패하는가

이 교시에서 배우는 것

- 이 과정에서 "PM"이 무엇을 뜻하는가 — 프로젝트 매니저 / PO / 프로덕트 매니저의 3중 충돌
- 프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영 — 세 표준의 정의를 나란히 놓으면 보이는 것 [§1.1]
- 프로젝트는 왜 실패하는가 — 통계를 그대로 믿으면 안 되는 이유 [§1.2]
- 프로젝트를 임시조직으로 본다는 것 [§1.3]
- 유형은 하나가 아니다 — NTCP 다이아몬드 · 분야별 되돌림 비용 [§1.4~1.5]

§1.2(실패 통계)가 가장 길다 — 경력자가 가장 많이 틀리는 지점

용어 정리 — 이 과정에서 "PM"은 프로젝트 매니저다

약칭	원어	책임지는 것	이 과정에서
PM	Project Manager	정해진 사양·일정·예산 안에서 **산출물(output)** 인도	**PM 트랙 4일 (오늘)**
PO	Product Owner (Scrum)	백로그 우선순위, 스프린트 단위 가치 판단	Product 트랙
프로덕트 매니저	Product Manager	제품의 존재 이유 — 시장·사용자·수명 전체의 **성과(outcome)**	Product 트랙 4일

- 명함이 아니라 **무엇에 책임지는가**로 구분한다
- 오늘 이후 "PM" = 온담 P1의 **발주사** 프로젝트 매니저(여러분)


output은 PM의 책임, outcome은 사업 오너의 책임 — 오늘 하루 반복되는 구분

프로젝트·프로그램·포트폴리오 — 세 표준의 정의

표준	프로젝트	프로그램	포트폴리오
ISO 21502:2020	합의된 목표를 위한 임시적 노력. 시작·끝이 정의됨	개별 관리로는 얻을 수 없는 **편익**을 위해 함께 관리	전략 목표를 위한 프로젝트·프로그램·**운영**의 집합
PMBOK 8판 (2025)	고유한 산출물을 위한 임시적 노력 + **가치** 인도	편익과 통제를 위해 조정 관리	전략 목표를 위한 그룹 관리
MSP 5판 (2020)	산출물(outputs)을 만드는 것	outputs → capabilities → outcomes → **benefits**	(MoP가 다룸)

- 공통 단어 셋: **임시적**(끝이 정의되어 있다) / **편익** / **전략·운영**

정의는 개념 논쟁이 아니다 — 프로젝트라 부르는 순간 예산·책임자·해산이 생긴다

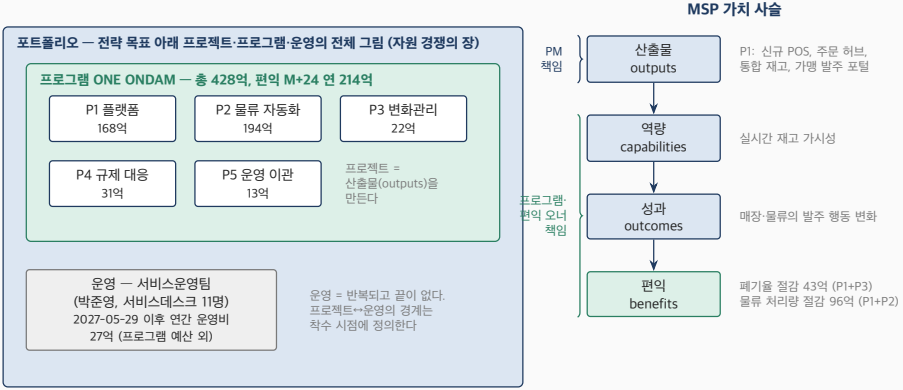

출처: ISO 21502:2020, PMBOK Guide 8판(PMI, 2025), MSP 5판(AXELOS, 2020)의 정의와 사례 문서 「머온담F&B홀딩스」를 바탕으로 재구성.

그림 1-1. 포트폴리오·프로그램·프로젝트·운영의 관계와 MSP 가치 사슬 (ONE ONDAM 428억 · P1~P5)

편익이 프로젝트 경계를 넘어 발생한다는 사실 자체가 프로그램의 존재 이유다

P1의 편익은 P1 혼자 만들지 못한다

- 폐기율 절감 **43억** = P1 실시간 재고(산출물) → 매장·물류의 발주 행동 변화(역량→성과) → 편익
- 물류 처리량 **96억** = P2 설비 + P1 재고 원장이 **함께** 작동해야 나온다
- P1의 산출물은 명확하다 — POS, 주문 허브, 통합 재고, 가맹 포털, 통합 계층·데이터 전환
- 운영과의 경계: P5 종료(2027-05-29) 이후는 서비스운영팀(박준영, 11명)의 것
- 연 운영비 27억은 428억 **밖**

프로젝트가 끝나는 지점과 운영이 시작되는 지점을 착수 시점에 정의하지 않으면 종료 때 반드시 다툰다

정의를 틀리는 두 방향 — 프로그램을 프로젝트로, 운영을 프로젝트로

프로그램을 프로젝트 도구로

- ”전사 혁신 과제”, ”DX TF”
- 편익 소유자 소멸
- 프로젝트 간 의존 미관리
- 종료 조건이 흐려진다

운영을 프로젝트로 포장

- 연례 업그레이드에 헌장·킥오프·종료 보고서
- 반복되고 끝이 없는 일은 **운영**
- 그것은 ITIL의 영역이다

여러분 회사에서 ”프로젝트”라 불리지만 정의상 프로그램이거나 운영인 것은?

프로젝트는 왜 실패하는가 — ”성공률 30%”를 믿으면 안 되는 이유


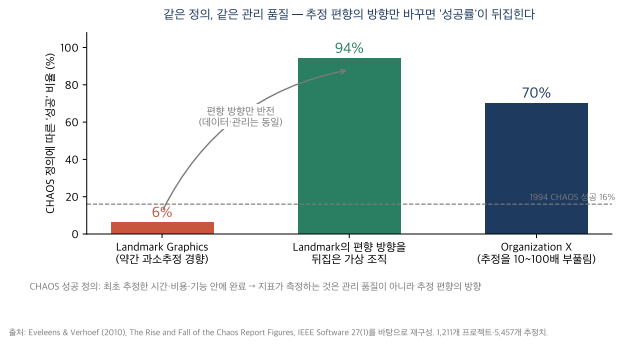


그림 1-2. CHAOS 성공 정의의 결함 — 6% / 94% / 70%

- Standish CHAOS(1994~): 성공 16% · challenged 53% — 30년간 업계 상식
- **Eveleens & Verhoef (2010)**: ”성공” = 최초 추정 안에 완료 → 추정 편향의 **방향**을 잴 뿐
- 추정을 부풀리는 조직 70% 성공 / 정확하되 약간 과소 6% / 편향만 뒤집으면 94%

결론은 ”프로젝트는 실패하지 않는다”가 아니다 — 이 숫자로는 아무것도 알 수 없다

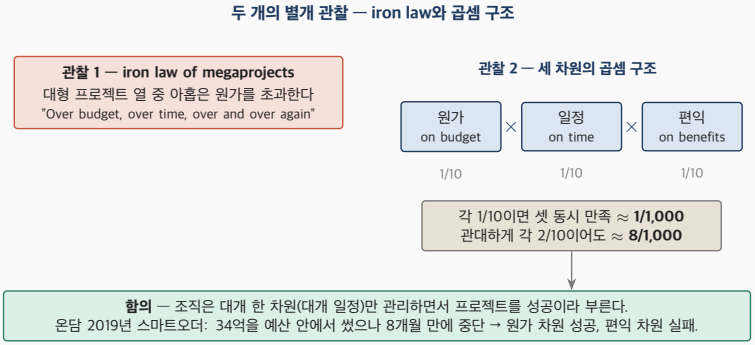


출처: Flyvbjerg (2014), What You Should Know About Megaprojects and Why, Project Management Journal 45(2)를 바탕으로 재구성.

그림 1-3. Flyvbjerg의 두 관찰 — iron law와 세 차원의 곱셈 구조 (1/1,000 · 8/1,000)

조직은 대개 한 차원만 관리하면서 성공이라 부른다 — 2019 스마트오더: 예산 안, 8개월 만에 중단

처방 — Reference Class Forecasting: 외부 분포 먼저, 내부 추정 나중

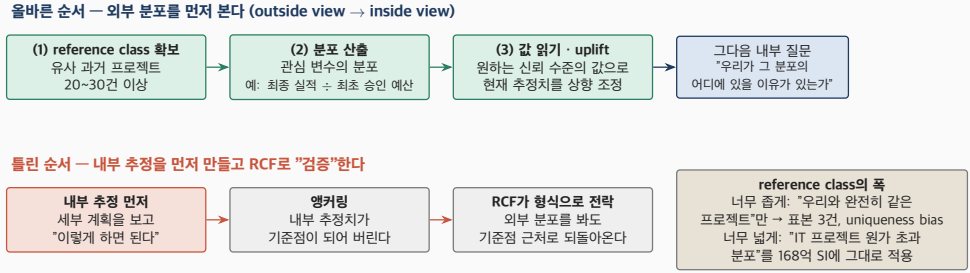

출처: Flyvbjerg (2014); Kahneman & Tversky (1979)의 outside view; 영국 재무부 Green Book·DfT 지침을 바탕으로 재구성.

그림 1-4. RCF 3단계 — ① 유사 과거 20~30건 → ② 실적÷최초 예산의 분포 → ③ uplift·상대 위험 판단

- 순서를 뒤집으면 **앵커링** / reference class를 너무 좁게 잡으면 **uniqueness bias**

IT 원가 초과는 멱함수 분포 — 평균에 맞춘 컨틴전시가 틀리는 이유 (Day2·Day3)

그러면 Flyvbjerg의 숫자는 믿어도 되는가 — 자기 조직의 base rate

- Flyvbjerg 표본은 교통·에너지·올림픽 중심. 168억 SI에 그대로 적용은 **class를 너무 넓게** 잡는 반대쪽 오류
- 배울 것은 숫자가 아니라 태도 — **남의 통계 대신 자기 조직의 base rate**
- 네 건은 class로는 적다. 그러나 "정보화 4건 중 2건 중단·축소"는 P1 리스크 등록부에 들어갈 base rate

연도	사업	규모	결과
2014	SAP 도입	74억	(실적 미기재)
2019	스마트오더	34억	**중단** (8개월)
2022	WMS 고도화	12억	**범위 63% 축소**
2025	검사기록 디지털화	34억	반려

오늘의 첫 실무 처방 — 제안서·임원 보고서에서 CHAOS 수치를 빼라

성공의 두 정의 — Cooke-Davies (2002)

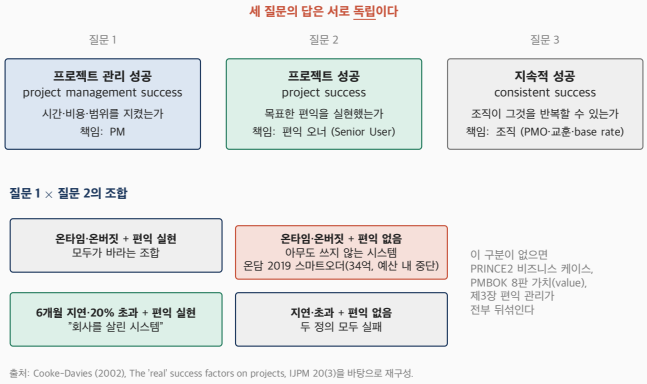


그림 1-6. 성공 세 정의와 2×2 조합 — 관리 성공은 G4(2027-05-29), 프로젝트 성공은 G5(2028-03-31)에 판정

세 답은 서로 독립이다 — 온타임·온버짓인데 아무도 안 쓰는 시스템 / 지연·초과인데 회사를 살린 시스템

프로젝트를 임시조직으로 본다는 것 — Lundin & Söderholm (1995)



출처: Lundin & Söderholm (1995), A theory of the temporary organization, Scandinavian Journal of Management 11(4)를 바탕으로 재구성.

그림 1-7. 임시조직 이론 — 4T · 4 행위 개념 · 실무 현상

라이프사이클 그림이 설명 못 하는 것 — 왜 프로젝트 안의 사람들이 그렇게 행동하는가

이 렌즈가 설명하는 네 가지 현상

실무자가 매일 겪는 것	설명하는 개념	온담에서
교훈(lessons learned)은 왜 항상 실패하는가	제도화된 종료 — 배울 조직이 종료와 함께 해체	스마트오더 종료 보고서의 중단 사유 세 줄
종료 직전에 왜 인력이 빠지는가	팀 — 끝이 보이면 다음 과업을 찾는 것이 정상	안정화 기간의 핵심 개발자 이탈
프로젝트는 왜 모조직과 싸우는가	계획된 고립 — 프로젝트의 고립은 운영의 부담	IT본부 47명 중 14명 투입, 33명이 6종·47본 운영
착수 결정은 왜 분석적이지 않은가	행위 기반 기업가정신	"615개 매장을 하나의 채널처럼"이 먼저

종료 이후 경로(P5, 다음 배치)를 착수 시점에 설계해야 인력 이탈을 막는다

어떤 프로젝트도 섬이 아니다 — Engwall (2003)

- 일정·예산·조직 구성·핵심 갈등은 착수 전에 **조직의 역사와 정치**로 이미 결정되어 있다
- 컷오버 2027-02 = 2019 사모펀드 계약의 IPO 조항
- 인터페이스 우선 = 2011 OD-POS를 박세연이 직접 만듦
- 가맹 경계 = 2019 스마트오더 중단 경험
- 처방: 새 프로젝트 첫 주에 **직전 프로젝트 두세 개의 종료 보고서**를 읽어라


킥오프 시점 PM의 진짜 일은 이미 결정된 것들을 목록화하는 것

프로젝트 유형은 하나가 아니다 — NTCP 다이아몬드 (Shenhar & Dvir, 2007)

축	질문	단계	이 축이 결정하는 것
Novelty	시장·사용자에게 얼마나 새로운가	derivative / platform / breakthrough (**3**)	요구사항 확정 시점, 시장 조사 신뢰도
Technology	기술이 얼마나 성숙한가	low / medium / high / super-high (**4**)	설계 동결 시점, 설계 반복 횟수
Complexity	범위·계층이 얼마나 넓은가	assembly / system / array (**3**)	조직·절차의 형식성, 하도급·인터페이스 관리
Pace	시간이 얼마나 결정적인가	regular / fast-competitive / time-critical / blitz (**4**)	의사결정 위임 수준, 상위 관리자 개입

네 축은 직교한다 — 합산해 "난이도 3.2등급"을 만드는 순간 모델은 무의미해진다

온담 P1을 NTCP로 진단하면 — "표준 SI 프로젝트"가 아니다

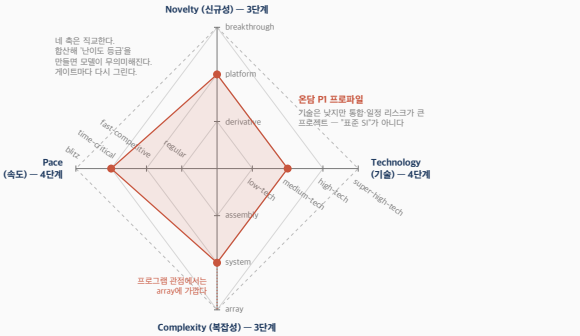

출처: Shenhar & Dvir (2007), Reinventing Project Management: The Diamond Approach, Harvard Business School Press를 바탕으로 재구성. P1 위치는 교재 1.4절의 예시 진단.

그림 1-8. NTCP 다이아몬드 — 온담 P1의 위치

- **N = platform** — 사용자 3,000명대의 업무 방식이 바뀐다
- **T = medium** — 기술은 성숙, **기존 기술의 미지**(문서 없는 13본, 7.4TB)가 크다
- **C = array에 가까운 system · P = time-critical** — IPO·규제 역산

기술 리스크보다 통합·일정 리스크에 자원 집중 — 같은 프로그램의 P2는 전혀 다른 프로파일

분야별 대조 — 같은 단어, 다른 리듬, 다른 되돌림 비용



출처: 교재 1.5절 분야별 대조표(SI·EPC·NPD·제약)와 Merrow(IPA), Cooper(Stage-Gate), AACE 추정 등급을 바탕으로 재구성. 구간 비율은 개념도이며 실측이 아니다.

그림 1-9. 분야별 되돌림 비용 시간축 대조 (SI · EPC · NPD · 제약)

되돌릴 수 있으면 실험하고 반복한다. 되돌릴 수 없으면 결정 전에 최대한 알아야 하므로 앞단에 시간을 쓴다

분야별 대조표 — 산출물 · 되돌림 비용 · 리듬 · 범위 확정 · 주된 실패

축	SI	건설·EPC	제조 NPD	제약 임상·규제
산출물	소프트웨어 — 수정 가능	물리 구조물	물리 제품 + 양산 공정	**승인** — 규제기관의 결정
되돌림 비용	낮음~중간 (전환·컷오버는 예외)	매우 높음 — 기초 타설 후 변경은 철거	높음 — 금형 후 재작업, 양산 후 리콜	극단적 — 제출 후 문서 잠김, 시계는 상대가
리듬을 정하는 것	요구사항 확정, 인터페이스 상대의 준비	자재 리드타임, 공정 순서, 인허가	금형·부품 리드타임, EVT/DVT/PVT	심사 일정, 추가자료 왕복 횟수
범위 확정 시점	늦다 — 계약 후에도 움직임	이르다 — 설계 성숙도(AACE Class)가 계약 유형 결정	게이트마다 단계적, Gate 1~2에서 kill	프로토콜 승인 시 사실상 고정
주된 실패	요구 팽창, 데이터 전환, 인터페이스 미확정	설계 미성숙 상태의 LSTK, 동시지연 클레임	이빨 없는 게이트(kill 0건), 금형 뒤 설계 변경	추가자료 0회 가정 위의 출시일 공표

가장 중요한 열은 되돌림 비용 — 이 표가 2교시 테일러링의 토대다

1교시 핵심 정리

1. 프로젝트는 **산출물**, 프로그램은 산출물이 역량·성과를 거쳐 **편익**이 되도록 함께 관리
2. CHAOS 성공률은 **추정 편향의 방향**을 측정한다 — KPI로 쓰면 부풀리기가 최적 행동
3. iron law와 3차원 곱셈은 별개. 처방은 RCF — **외부 분포 먼저**
4. 관리 성공(시간·비용·범위)과 프로젝트 성공(편익)은 **독립**
5. 임시조직론(4T + 4행위)이 교훈의 실패·종료 직전 이탈·모조직과의 긴장을 설명. 착수의 진짜 일은 **이미 결정된 것의 목록화**
6. NTCP(3/4/3/4)는 축별로 다른 처방. 합산하지 말고 게이트마다 다시 그린다
7. 분야 차이의 핵심 변수는 **되돌림 비용**

워크북 §1 "전략적 배경"과 심화 과제(과거 4건 base rate)에 쓰인다

2교시 (90분) — 표준의 지형: 무엇을 따를 것인가

이 교시에서 배우는 것

- PMBOK의 계보 — 6판, 7판, 그리고 8판의 부분 회귀 · 6 원칙과 7 성과영역 [§2.1~2.2]
- PRINCE2 7 — 프로젝트 보드, 예외 관리, 산출물 기반 계획 [§2.3]
- ISO 21502:2020 — 계약서가 인용하는 표준 · 애자일·SAFe·하이브리드의 위치 [§2.4~2.5]
- 테일러링 — 되돌림 비용, Boehm-Turner, Cynefin, TDR [§2.6]
- 자격 체계의 실효성 [§2.7]


이 교시의 실무 산출물은 재매핑 대장과 TDR이다

왜 계보를 알아야 하는가 — PMBOK은 참고서인데

- PMBOK Guide는 법도 계약 조건도 아니다. 그런데도 판본을 알아야 하는 이유 셋
- ① 사내 PMO 표준·양식·직무기술서가 인용하는 **조항 번호**가 살아 있는가, 죽어 있는가
- ② 계약서·RFP의 "PMBOK 준거" 문구 — 판본과 문서를 특정하지 않으면 **분쟁의 씨앗**
- ③ 표준을 만드는 조직이 5년 사이에 자기 구조를 **두 번 뒤집었다**는 사실 자체가 이 분야의 현재 상태

2021 삭제 → 2022 보완 별책 → 2025 회귀 — 세 줄을 하나의 이야기로

PMBOK 계보와 주변 표준 연표 1996~2026

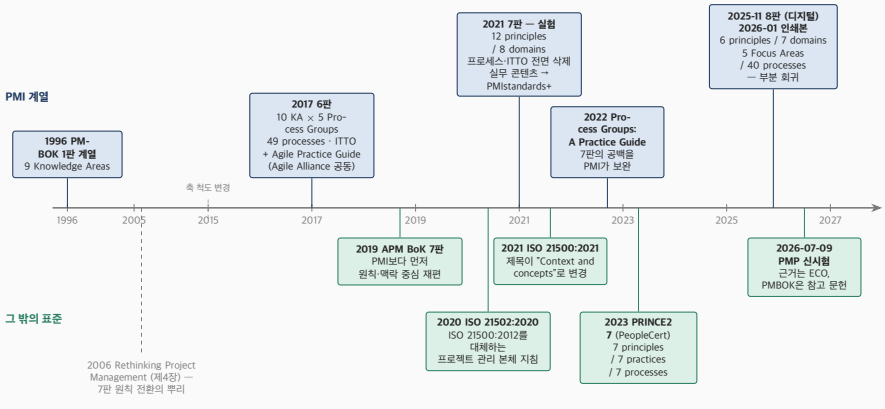

출처: 교재 2.1절 연표(PMI, ISO/TC 258, PeopleCert, APM 공개 정보)를 바탕으로 재구성. 연도 위치는 근사.

그림 2-1. 1996 9 KA → 2017 6판 49 프로세스 → 2021 7판 12 원칙 → 2025-11 8판 40 프로세스

APM BoK 7판(2019)이 PMI보다 먼저였고, 뿌리는 2006 Rethinking PM까지 올라간다

6판 (2017) — 아직 살아 있는 사내 표준의 원본

- 10 지식영역 × 5 프로세스 그룹 = **49 프로세스**, 각각 ITTO(Inputs / Tools & Techniques / Outputs)
- 한국 기업에 뿌리내린 이유 ① **감사 가능성** — 감사·감리·검수는 "이 문서가 있는가"를 판정할 문장을 요구한다
- 이유 ② **양식이 자산** — 수년간 축적된 산출물 서식. 원칙 12개로는 서식이 나오지 않는다
- 이 교재는 6판을 "폐기된 판"으로 다루지 않는다 — 한국 기업 문서체계의 **원본(source document)**

8판이 40 프로세스를 되살린 것은 "프로세스 없는 표준은 조직이 쓸 수 없다"는 실무 피드백의 결과

7판 (2021) 실험 → 8판 (2025) 부분 회귀

7판 — 12 원칙 / 8 성과영역, 프로세스 삭제

- 두 문서가 한 권 → "7판 준거"는 어느 문서인지 불명확
- 원칙 12개는 **감사할 수 없는 문장**
- 실무 콘텐츠는 PMIstandards+(구독형)로

8판 — 6 원칙 + 7 성과영역 + 5 Focus Areas·40 프로세스

- Focus Areas = Initiating / Planning / Executing / M&C / Closing — **5 Process Groups가 이름을 바꿔 돌아왔다**
- 실질 변경: **Integration → Governance**, **Cost → Finance**
- Quality는 QA→Governance / QC→Scope로 분산, Communications는 Stakeholders에 흡수

7판은 학술 논쟁의 20년 늦은 반영, 8판은 그것이 실무와 충돌한 뒤의 재타협

PMBOK 8판 구조 — 6 원칙 / 7 도메인 / 5 Focus Areas · 40 프로세스

6 core principles — 왜 (모든 도메인·프로세스를 관통)

총체적 관점 채택 Adopt a holistic view	가치 집중 Focus on value	품질 내재화 Embed quality	책임 있는 리더십 Be an account-able leader	지속가능성 통합 Integrate sus-tainability	권한 위임 문화 Build an empow-ered culture

5번은 8판 신설 (7판 대응물 없음)

7 performance domains — 무엇을 (6판 지식영역풍 이름으로 회귀)

Governance	Scope	Schedule	Finance	Stakeholders	Resources	Risk
← 6판 Integration	QC 흡수		← 6판 Cost	Communications 흡수	← 7판 Team	← 7판 Uncertainty

5 Focus Areas 안의 40 processes — 언제 (6판 5 Process Groups와 같은 이름, non-prescriptive)

Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing

현장 개발 · 이해관계자 식별 (2개)

세로 읽기: 원칙(왜) → 도메인(무엇을) → Focus Area의 프로세스(언제). 8판이 40개 프로세스를 되살린 것은 6판이 옳았다는 뜻이 아니라 "프로세스 없는 표준은 조직이 쓸 수 없다"는 실무 피드백의 결과다.

출처: PMBOK Guide 8판(PMI, 2025 디지털 / 2026-01 인쇄) 구조를 교재 2.1~2.2절에 따라 재구성. 원칙 영문은 출처에 따라 축약형·완전형이 혼재하므로 인쇄본 대조 필요.

그림 2-2. Governance · Scope · Schedule · Finance · Stakeholders · Resources · Risk

Governance가 첫 번째 도메인 — 실패의 가장 흔한 원인은 기술이 아니라 "누가 결정하는가"의 부재


한국 사내 표준은 6판에 머물러 있다 — 함의와 처방

- 여러분 다수는 **두 판본 뒤처진 사내 표준**으로 일하며 **한 판본 뒤처진 자격 지식**을 갖고 있다 — 정상 상태
- 함의 ①: "6판 4.6 Perform Integrated Change Control" 같은 조항 번호는 현행에 없다 → "현행 표준 준거" 요구에 방어 불가
- 처방은 재작성이 아니라 **재매핑 대장** 네 열

사내 문서·조항	6판 근거	8판 대응 위치	조치
통합변경통제 절차서	4.6	Governance 도메인	조항 번호만 교체, 절차 본문 유지
원가관리계획서	7.1	Finance 도메인	명칭 변경, 자금 조달·현금흐름 항목 신설 검토
품질보증 절차서	8.x	QA→Governance / QC→Scope	조직마다 결정 필요

함의 ② PMP 승진 요건의 형평 문제 · 함의 ③ 판본이 바뀌어도 살아남는 산출물

6판 10 지식영역 → 8판 7 도메인 재매핑

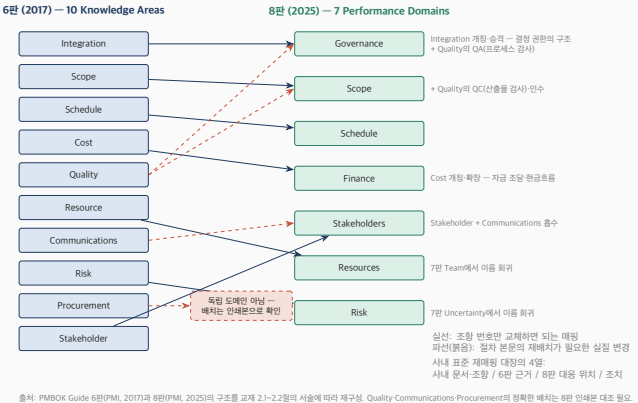

출처: PMBOK Guide 6판(PMI, 2017)과 8판(PMI, 2025)의 구조를 교재 2.1~2.2절의 서술에 따라 재구성. Quality·Communications·Procurement의 정확한 배치는 8판 인쇄본 대조 필요.

그림 2-3. 실선 = 이름만 바뀜 / 파선 = 분산·흡수 (Quality · Communications · Procurement)


재매핑 대장의 원본은 이 그림 — 조항 번호 교체로 끝나는 행과 끝나지 않는 행을 구분하라

PMBOK 8판의 6 core principles

원칙	7판에서	온담에서 보이는 모습
1 **총체적 관점** (holistic view)	#5 시스템 상호작용 + #9 복잡성	"P2가 늦으면 P1 컷오버가 밀린다"를 리스크 등록부에
2 **가치 집중** (focus on value)	#4 유지 + #3·#11·#12 흡수	편익 214억의 근거를 항목별로 묻는 CFO = 이 원칙의 실행
3 **품질 내재화** (embed quality)	#8 "Build" → "Embed"	사후 검사가 아니라 프로세스·산출물 안에. Quality 도메인 소멸과 짝
4 **책임 있는 리더십** (lead accountably)	#1 stewardship + #6 병합	CCB "반대의견 실명 기재" vs 2022 WMS 회의록의 빈 서명란
5 **지속가능성 통합**	**신설** — 대응물 없음	P2 물류 인력 246명 문제 = 사회적 지속가능성이 리스크로
6 **권한 위임 문화** (empowered teams)	#2 협력적 팀 환경의 진화	한국에서 이상과 현실의 거리가 가장 먼 원칙 → 5교시

원칙 6(권한 위임)은 PRINCE2의 Manage by Exception·허용범위로 제도화된다

PRINCE2 7 (2023) — 구조와 PMBOK과의 결정적 차이

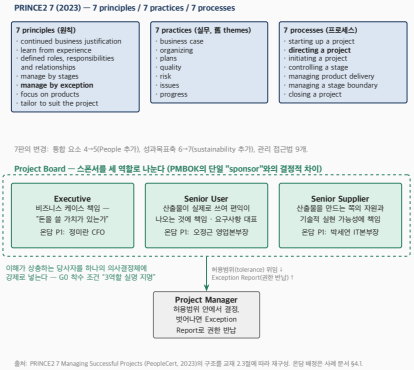

출처: PRINCE2 7 Managing Successful Projects (PeopleCert, 2023)의 구조를 교재 2.3절에 따라 재구성. 은당 배정은 사례 문서 §4.1.

- 7 principles 중 핵심: continued business justification · **manage by exception** · focus on products
- 7판 변경: 통합 요소 4→5(People), 성과목표축 6→7(sustainability)
- **PMBOK = "무엇을 알아야 하는가"의 지식체계 / PRINCE2 = "누가 무엇을 결정하는가"의 방법론**

그림 2-4. PRINCE2 7 삼중 구조 + Project Board

네 장치 — Project Board / Manage by Exception / Product-Based Planning / 살아 있는 Business Case

장치 ① Project Board 3역할 · ② Manage by Exception

역할	책임	온담 P1
Executive	비즈니스 케이스 — "돈을 쓸 가치가 있는가"	정미란 CFO
Senior User	산출물이 **사용되어 편익이 나오는 것**. 요구사항 대표, 편익 실현 책무	오정근 영업본부장
Senior Supplier	산출물을 만드는 쪽의 자원·기술적 실현 가능성	박세연 IT본부장

- 이해가 상충하는 당사자를 **강제로 한 의사결정체에** 넣는다
- MbE: 7 성과목표축 × 3계층의 **허용범위 격자** — 벗어날 것으로 **예측되는 순간** Exception Report

Exception Report는 문제 보고서가 아니라 권한 반납 문서 — PM의 자율성을 규정으로 방어하는 유일한 수단

Product-Based Planning — 활동이 아니라 산출물부터

- Project Product Description → PBS → Product Descriptions(**품질 기준·검수 방법·검수 책임자** 강제) → Product Flow Diagram
- 활동 중심 WBS("설계하기")는 검수 기준을 계획에서 누락시킨다 — 검수 분쟁의 원인 대부분

Business Case — 승인용 문서가 아니라 단계 경계마다 갱신

- 각 stage 경계에서 "계속할 이유가 아직 있는가"를 Board가 되묻는다
- 편익 검토는 종료 **이후**에 예약 — 온담 이사회 조건 3항과 G5(2028-03-31)


PBS 노드는 명사여야 하고, 명사가 아니면 검수할 수 없다 → Day2 WBS

ISO 21502:2020 — 계약서가 인용하는 표준

- 『Guidance on project management』, ISO/TC 258. **자격시험이 없다** → 교육시장에서 무명
- 글로벌 EPC·발주처 계약서와 RFP에서는 "PMBOK 준거"보다 자주 — **중립성**
- 구조: §4 맥락 → §5 전제 조건 → §6 통합 실무(**§6.2 pre-project** … **§6.9 post-project**) → §7 관리 실무 17종
- **ISO 21500의 함정**: 2021년판 제목은 "Context and concepts" → "ISO 21500에 따라 관리한다"는 **무의미한 문장**
- 지침은 **21502**, 용어는 **21506:2024**, 거버넌스는 **21505:2017**

계약에는 "ISO 21502:2020 §7 관리 실무에 따라"처럼 문서·연도·조항을 특정하라

표준 지형도 — 지식체계 / 방법론 × 거버넌스 층 / 인도 층

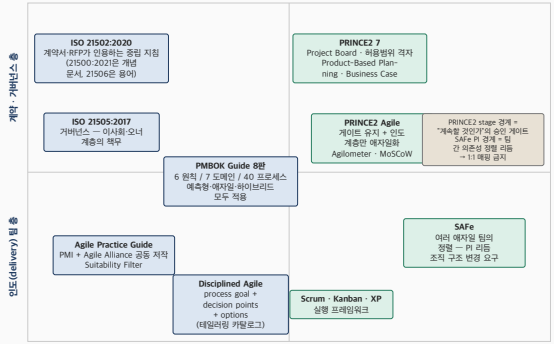

출처: 교재 2.1–2.5절의 서술을 바탕으로 재구성. 위치는 상대적 성격을 나타내는 개념도.

그림 2-5. PMBOK · PRINCE2 · ISO 21502/21505 · 애자일 프레임워크가 각각 어느 층에 있는가


같은 층에 있는 것끼리만 대체된다 — 애자일은 인도 층, PRINCE2는 거버넌스 층

애자일·SAFe·하이브리드의 위치 — 표준의 반대편이 아니다

- 애자일(Scrum, Kanban / SAFe, LeSS, DA)은 표준이 **개발 접근(development approach)**이라 부르는 것의 한 종류
- **Agile Practice Guide (2017)** — Agile Alliance 공동 저작. 실무 자산은 Suitability Filter
- **PRINCE2 Agile** — 게이트 거버넌스 유지, **인도 계층만 애자일화**. 시간·비용 고정, 범위는 MoSCoW
- **SAFe** — 한국 실패 원인은 Personnel·Culture 축 무시. **PI ≠ Stage** — 1:1 매핑하면 중단 결정 지점이 사라진다
- **온담 P1 하이브리드** — 스프린트 36회, 요구사항 월 1회 동결, FP 12,400점 고정가, 게이트 G0~G4

하이브리드 = 어느 결정을 언제까지 되돌릴 수 있게 남기고 언제 동결하는가의 설계

테일러링의 기준은 하나 — 되돌림 비용

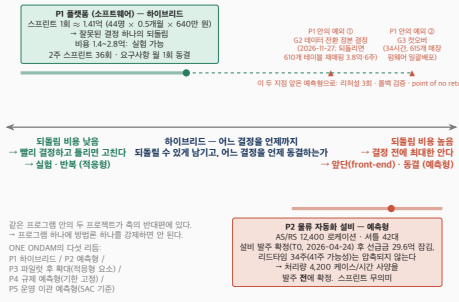

출처: 교재 2.6절 "되돌림 비용이 방법을 결정한다"의 서술과 사례 문서 수치를 바탕으로 재구성. 축 위 위치는 상대적 개념도.

그림 2-6. 되돌림 비용 축 위의 P1 vs P2

- **P1**: 스프린트 1회 ≈ 1.41억 — 잘못된 결정 하나 = 1.4~2.8억 → **실험 가능**
- **P2**: 설비 발주 후 선급금 **29.6억** 잠김, 리드타임 34주 → **예측형**, 앞단에 시간
- P1의 예외 — G2 전환 정본(3.8억·6주), G3 컷오버(34시간) 앞은 예측형

프로그램 하나에 방법론 하나를 강제하면 안 된다 — 다섯 프로젝트, 다섯 리듬

Boehm-Turner 5축 (2003) — 축이 갈리면 시스템을 쪼개라


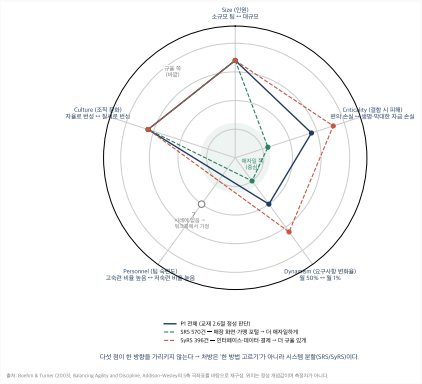


그림 2-7. 5축 극좌표 — P1 전체와 SRS/SyRS 분할

- P1: Size 82명 → 바깥 / Criticality 615개 매장 결제 / Dynamism 월 동결 → 중간 / Culture 질서 쪽
- 처방은 "한 방법을 골라라"가 아니라 **축이 갈리면 쪼개서 부분마다 다른 방법**
- 매장 화면·가맹 포털(SRS 570) → **더 애자일** / 인터페이스·데이터·결제(SyRS 396) → **더 규율**

한국에서 결정적인 축은 Personnel과 Culture — 프로세스만 이식하면 실패한다

Cynefin — 방법론 선택 도구가 아니다 (Snowden & Boone, 2007 HBR)

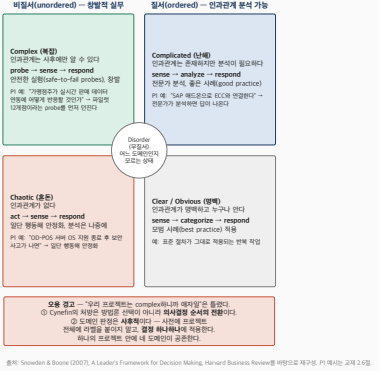

출처: Snowden & Boone (2007), A Leader's Framework for Decision Making, Harvard Business Review를 바탕으로 재구성. PI 예시는 교재 2.6절.

그림 2-8. 네 도메인과 의사결정 순서

- 오용 "complex하니까 애자일" — 처방은 **의사결정 양식의 전환**이고, **도메인 판정은 사후적**
- 프로젝트 전체가 아니라 **결정 하나하나**에 — SAP 애드온 = complicated / 가맹점주 반응 = complex → 파일럿 12개점 / OD-POS 보안 사고 = chaotic
- 시중의 Stacey matrix 2×2는 **Stacey의 원 도식이 아니라 후대 각색본** — "만든 사람이 버린 그림"이라고 말하지 말 것

하나의 프로젝트 안에 네 도메인이 공존한다 — 결정마다 도메인을 감각하라

테일러링을 문서로 남기기 — TDR 네 칸

- 세 도구는 **다른 질문**에 답한다: NTCP = 유형 / Boehm-Turner = 준비도 / Cynefin = 개별 결정 — 충돌 지점이 설계할 지점
- 근거 기록이 없으면 모든 생략이 감사에서 "표준 미준수" → 방어용 문서 양산 — **한국 조직에서 문서가 줄지 않는 진짜 메커니즘**

무엇을	왜	어떤 리스크를 수용하는가	누가 승인
스프린트 단위 상세 일정표 **생략**	월 동결·게이트로 통제	스프린트 내 지연 가시성 저하	스폰서
데이터 전환 리허설 3회 **추가**	2023 감사 지적 "형상관리 미비", G2 비가역성	시험 기간 압박	스폰서

생략 항목별로 행이 있어야 감사 조항에 대응된다 — 테일러링은 줄이는 것만이 아니다

자격 체계의 실효성 — 문을 여는 열쇠이지 판단을 대신하지 않는다

자격	기반 문서	실효
PMP (PMI)	**ECO** — PMBOK은 참고 문헌. 2026-07-09 신버전	한국 최고 인지도. 증명하는 것은 "지식과 경력 시간"이지 "상황 속 판단"이 아님
PMI-ACP	애자일 실무	
PRINCE2 7 F/P (PeopleCert)	PRINCE2 7 매뉴얼	한국 자격 가치 낮음. 해외 발주처·글로벌 본사 보고에서 "문서 이름 맞추는 능력"
SAFe SA/SSM/SPC	SAFe	전환 컨설팅 수임에 유리, 연 1회 갱신
IPMA A~D	**ICB4** 29 역량 요소	자격 실효는 낮으나 ICB4는 사내 PM 등급제·직무기술서의 원천

"PMP를 8판으로 다시 봐야 하나요?" → 아니오. 시험 근거는 ECO. 판본 논쟁은 사내 문서 체계의 문제

2교시 핵심 정리

1. PMBOK 6판(49 프로세스) → 7판(12원칙, 삭제) → 8판(6원칙/7도메인/40 프로세스, **부분 회귀**)
2. 사내 표준은 대부분 6판 — 처방은 **4열 재매핑 대장**. Integration→Governance, Cost→Finance
3. PRINCE2의 자산 = **3역할 / 허용범위 격자와 MbE / PBP / 갱신되는 BC**
4. 계약서는 ISO 21502 — "21500에 따라"는 틀린 문장. 용어는 21506
5. 애자일은 개발 접근의 한 종류. PRINCE2 Agile은 게이트 유지. Stage ≠ PI
6. 테일러링의 기준은 **되돌림 비용**. NTCP / Boehm-Turner / Cynefin은 다른 질문. 결과는 **TDR 네 칸**
7. PMP의 근거는 ECO. 자격은 문을 여는 열쇠

점심시간에 워크북 §0.3 온담 한 페이지 요약과 §1.5·§2.5 완성 예시본을 훑어 올 것

3교시 (90분) — 착수 이론: 비즈니스 케이스 · 편익의 소유 · 헌장 · 이해관계자

이 교시에서 배우는 것

- 착수 이전 — 비즈니스 케이스와 편익의 소유권 [§3.1]: 이미 결정된 것들 / BC의 항목 / Zwikael & Smyrk의 ITO / Ward & Daniel의 BDN
- 프로젝트 헌장 — 항목별 의미와 한국 기업에서의 실질화 [§3.2]
- 이해관계자 — 식별·분석·참여 계획 [§3.3]: Power/Interest의 한계 / Mitchell-Agle-Wood 현저성 모델 / 한국 특유의 이해관계자
- 4교시 실습 ①(비즈니스 케이스 요약 + 헌장)의 이론 부분

오전보다 온담 숫자가 훨씬 많이 나온다 — 워크북 §0.3 한 페이지 요약을 펼쳐 놓고 듣는다

착수의 첫 번째 일은 검증이다 — 표준이 "착수 전"을 수용하는 방식

- ISO 21502 **§6.2 pre-project activities** / PRINCE2 **Starting Up a Project**가 Initiating 앞에
- PMBOK 8판 Initiating은 프로세스 둘뿐(헌장 개발, 이해관계자 식별) — 입력인 BC·편익 관리 계획은 **프로젝트 바깥**에서 온다
- P1 PM이 받는 것: 이사회 부의안(2025-12) + 편익 표(연 214억) + 프로그램 관리 규정 + 승인 조건 5개항
- 착수의 첫 번째 일은 새로 만드는 것이 아니라 **이미 만들어진 BC의 숫자와 가정을 검증하는 것**

읽지 않고 헌장을 쓰는 것은 남이 정한 목표를 자기가 정한 것처럼 서명하는 일

비즈니스 케이스를 온담 P1로 채우면

항목	무엇을 적는가	온담 P1에서
문제 / 기회	무엇이 잘못되어 얼마의 비용을 만드는가. 숫자로	OD-POS OS 지원 종료(2024-07), 문서 부재 인터페이스 13본. 폐기율 3.9% = 연 **98.7억**(2,530억 × 3.9%), 결품률 4.7%, 가맹 발주 리드타임 38시간
대안	do-nothing / do-minimum / 제안안 / 그 밖	(a) 현행 유지 — SAP ECC 2027-12 종료 시 이중 위기 (b) 부분 개선 (c) 통합 플랫폼(P1) (d) 상용 패키지 — **검토 기록 없음**
편익	기준값·목표값·측정 방법·시점·**측정 책임자**	B-01~B-08, M+24 연 214억. 측정 책임자 "프로그램 착수 후 지정 예정" — **결함 ①**
비용	프로젝트 + 운영 = TCO	P1 168억 + 나머지 260억. 연 운영비 27억(3년 81억)이 편익에서 **미차감** — **결함 ②**
리스크	편익이 안 나올 주요 이유	과거 2건 중단·축소, P2 리드타임, 3PL WMS 개방, 가맹 부속서 388점 서면 동의, 규제 기한
권고	어느 대안을 왜. 승인 조건	이사회 원칙 승인 + 5개 조건


표를 채우면서 알게 되는 것 — 온담 BC는 존재하지만 완결되어 있지 않다

온담 비즈니스 케이스의 결함 — PM이 고칠 것이 아니라 목록으로 만들 것

- B-03 결품률: "기회손실, 미산정" / B-02 재고 정확도 91.3%: 분모가 **순환실사 대상 SKU 69%**뿐
- B-06 물류 처리량 96억: 이사회 자료에 **분모가 없고**, 노조는 "인원 절반이라는 뜻이냐", 한동석은 "4,200은 현장 숫자가 아니다"
- 편익 합계 214억에서 연 운영비 27억 미차감 → 정직한 숫자는 **187억**
- 측정 책임자 "추후 지정" — 그것은 지정하지 않겠다는 뜻
- CFO: "근거가 없는 항목은 승인하지 않겠다" / 내부감사: "편익 산정 근거를 문서로 제출하라"

PM의 착수 시점 일은 결함을 고치는 것(권한 밖)이 아니라 목록으로 만들어 스폰서에게 결정을 요구하는 것

편익은 누가 소유하는가 — Zwikael & Smyrk의 ITO 모델 (2011)



온담 P1의 편익 오너 (교재 3.1절)
· 폐기율 절감 43억 → 영업본부장 오정근 (구매·매장 운영 책임, Senior User) — P1 PM이 아니다
· 물류 처리량 절감 96억 → 물류본부장 한동석
· 매장 인건비율 38억 → 영업본부
· 측정 시점 G5(2028-03-31)는 프로젝트 종료 후 → 측정 책임자는 반드시 **상설 조직의 실명**. 부서명을 쓰면 6개월 안에 유령이 된다

한국 기업에서 가장 자주 잘못 설계되는 지점 — benefit owner를 PM-PMO장으로 지정. PM은 통제 불가능한 것에 책임을 지게 되고, 범위 방어와 책임 회피가 합리적 행동이 된다. 편익 오너의 이름이 없는 편익은 착수 시점에 이미 실현되지 않기로 결정된 편익이다.


출처: Zwikael & Smyrk (2011), Project Management for the Creation of Organisational Value, Springer의 ITO 모델을 바탕으로 재구성.

그림 3-1. Input → Output(PM) → Outcome(사업 오너) — 책임의 분리선

- **산출물** = PM의 책임 / **활용·성과** = 사업 오너의 책임
- PM에게 매출·절감 목표를 주면 **범위 방어와 책임 회피가 합리적 행동**이 된다
- 온담: 폐기율 43억의 오너는 **오정근**(Senior User), 물류 96억은 **한동석**, 인건비율 38억은 영업본부

편익 측정 시점(G5 2028-03-31)에 프로젝트 조직은 없다 → 측정 책임자는 상설 조직의 실명

편익 실현은 왜 대부분 실패하는가 — Ward & Daniel의 BDN

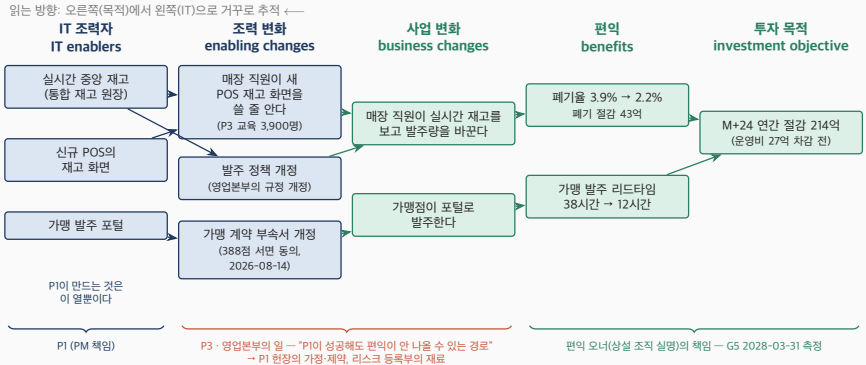

출처: Ward & Daniel (2012), Benefits Management, 2nd ed., Wiley의 Benefits Dependency Network를 온담 편익 표(B-04 폐기율, B-08 가맹 발주 리드타임)에 적용해 재구성. 예시이며 워크북에서 다시 그린다.

그림 3-2. 온담 편익의 Benefits Dependency Network — IT 조력자 → 조력 변화 → 사업 변화 → 편익

P1이 만드는 것은 맨 왼쪽뿐 — "P1이 성공해도 편익이 안 나올 경로"가 착수 시점에 보여야 한다

프로젝트 헌장은 권한 문서다

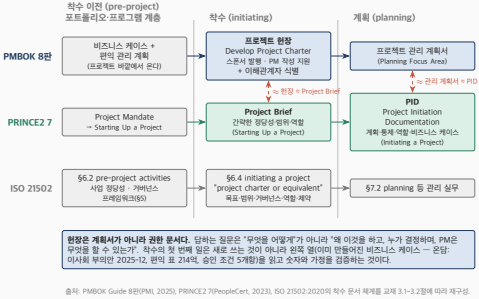


그림 3-3. 착수 문서 흐름 — BC → 헌장 → 계획서

- 헌장 = 프로젝트의 존재를 공식화하고 **PM에게 조직 자원을 쓸 권한을 부여**하는 문서
- 답하는 질문은 "무엇을 어떻게"가 아니라 **"왜 하고, 누가 결정하며, PM은 무엇을 할 수 있는가"**
- PMBOK 헌장 ≈ PRINCE2 **Project Brief**(→ PID) ≈ ISO 21502 §6.4 "charter or equivalent"

워크북 헌장 = Project Brief에 PID의 핵심(권한·허용범위·완료 기준)을 얹은 15개 항목

목적 — 3~5문장, 반드시 숫자

- 흔한 오류: **솔루션을 목적으로** — "차세대 플랫폼을 구축한다"는 목적이 아니다
- 온담: "패치가 중단된 시스템으로 615개 매장의 결제를 처리하고, 연 98.7억어치가 폐기되며, 2027 IPO 전에 벗어나야 한다" — **프로젝트가 없어져도 남는 문장**

성공 기준 — 두 층으로 분리

- 프로젝트 관리 성공(PM 책임): 2027-05-29까지 156억 한도 내 다섯 산출물 인도, SAC 충족
- 프로젝트 성공(편익 오너 책임): M+24 폐기율 2.2%, 결품률 1.5%, 리드타임 12h — **측정 책임자 실명**

흔한 오류 — 편익 목표를 PM의 성공 기준에 넣는 것

헌장 항목 ② 범위 / 제외 범위 — 무엇을 만들지 않는가

- 무엇을 만드는가보다 **무엇을 만들지 않는가**가 더 중요 — 제외 범위 없는 헌장은 범위 팽창의 초대장
- P1 제외: SAP ECC 교체 / 이천 설비·WMS(P2) / 교육·가맹 계약 개정(P3) / 규제 등록 자체(P4) / 운영 조직(P5)
- 각 제외 항목에 **"그러면 누가 하는가"**를 붙인다
- 흔한 오류: "기타 협의된 사항"처럼 모호하게

제외 범위는 포함 범위와 같은 무게, 같은 분량으로

예산 요약 — 하나의 숫자가 아니라 층

승인 예산	집행 한도	계획 원가	PM 통제 컨틴전시	관리예비비 (스폰서)
168.0억	156.0억	145.8억	10.2억	12.0억

가정 = 참이라고 믿고 계획하지만 확인되지 않은 것 / 제약 = 바꿀 수 없는 것

- 제약: 컷오버 창 2027-02-26~28, 규제 기한 2개, 집행 한도, FP 12,400점 계약
- 가정: P2 인터페이스 준비 / 대성로지스 준실시간 API 합의 / 가맹 부속서 2026-08-14 / 박세연의 13본 분석 시간

가정은 리스크 등록부의 첫 번째 원천 — 가정이 틀리면 그것이 리스크

헌장 항목 ④ 거버넌스와 PM 권한 — 헌장의 심장

- 스폰서(정미란), 운영위 구성·주기(월 1회), 에스컬레이션 경로
- 변경 통제 경로: CCB 월 셋째 목요일 / 변경협의체 격주 수요일
- **PM이 스스로 결정할 수 있는 범위**: 원가 +6%(10.08억), 일정 +15영업일, 범위 ±35건, 컨틴전시 10.2억
- 흔한 오류: "PM은 프로젝트를 총괄한다" 한 줄

리스크(5~10개, 프리모템 결과) · 이해관계자 요약 · 승인 — 서명 없는 헌장은 헌장이 아니다

한국 기업에서 헌장이 형식화되는 네 가지 이유 → 실질화하는 다섯 가지 방법

왜 형식이 되는가


1. 결정이 헌장 **밖에서** 이미 내려졌다 — 부의안·품의서의 사본
2. PM 권한 항목을 채울 권한이 PM에게 없다 — 전결 5억과 안 맞는다
3. 스폰서가 헌장을 읽지 않는다 — 대리 서명, 전자결재 자동 승인
4. 헌장이 계약서와 충돌한다 — SI의 진짜 범위 문서는 계약서

어떻게 살리는가 — 스폰서에게 결정을 요구

1. 헌장을 **결정 요청서**로 — 우선순위·허용범위·편익 오너·미확정 가정을 빈칸으로
2. **가정·제약 목록을 가장 긴 항목으로**
3. PM 권한을 **위임전결규정과 대조**
4. **과거 실패에 대한 답**을 넣는다 — 승인 조건 5항
5. **게이트마다 다시 연다** — G1·G2·G3

여러분의 마지막 헌장에는 여덟 가지 오류 중 몇 개가 해당하는가

이해관계자 — Mitchell-Agle-Wood 현저성 모델 (1997, AMR): 3속성 7유형

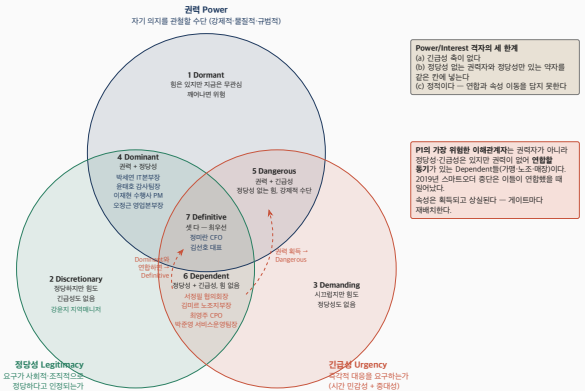

Power/Interest 격자의 세 한계
(a) 긴급성 축이 없다
(b) 정당성 없는 권력자와 정당성만 있는 약자를 같은 칸에 넣는다
(c) 정적이다 — 연합과 속성 이동을 담지 못한다

P의 가장 위험한 이해관계자는 권력자가 아니라 정당성 긴급성은 있지만 권력이 없어 **연합할 동기**가 있는 Dependent들(가령 노조·재단)이다. 2019년 스마트오더 중단은 이들이 연합했을 때 일어났다.
속성은 획득되고 상실된다 — 게이트마다 재베치한다.

출처: Mitchell, Agle & Wood (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience. Academy of Management Review 22(4)를 바탕으로 재구성. 온담 인물 배치는 교재 3.3절의 예시 판단이며 워크북에서 다시 한다.

그림 3-4. 권력 · 정당성 · 긴급성의 벤 다이어그램 7유형 + 온담 인물 (G0 예시 판단)

Power/Interest 격자의 세 한계 — 긴급성 축 없음 / 권력자와 약자를 같은 칸에 / 정적

온담의 이해관계자를 이 모델로 읽기 — 가장 위험한 사람은 권력자가 아니다

권력이 있는 쪽

- **정미란 CFO** — P+L+U, Definitive
- **김선호 대표** — Definitive, 일상은 Dormant처럼 → 게이트에서 깨어난다
- **오정근** Dominant → 가맹 반발 시 Definitive
- **박세연** Dominant — 권력의 원천은 직위가 아니라 **지식**(유일한 해독자)

권력이 없는 쪽 — 연합할 동기

- **서정필 협의회장** — L+U, Dependent. 388점 서면 동의 거부라는 집합적 권력 → 오정근과 연합 시 Definitive
- **김미르 노조 지부장** — Dependent → **Dangerous** 가능
- **최영주 CPO** — Dependent, 박세연이 움직여야
- **강윤지 지역매니저** — Discretionary → 슈퍼유저 124명 대표가 되면 활용률 좌우

속성은 고정되어 있지 않다 — 2019년의 실패는 정당성·긴급성만 있는 이들이 연합했을 때 일어났다

한국 조직 특유의 이해관계자 넷 + 참여 계획

서구 문헌에 잘 안 나오지만 한국에서 결정적인

- **노동조합** — 인력 효율이 편익로 명시된 프로그램에서 착수부터 Definitive에 가깝다
- **가맹점주협의회** — 데이터와 단말은 가맹점주 소유. "우리 시스템"의 절반은 본사 것이 아니다
- **감사실 / 준법** — "어떤 문서가 있으면 지적하지 않을 것인가"를 착수에 묻는다
- **그룹 지주사 / 별도 법인** — 계약 주체 둘, 개인정보 처리자 둘, 보안 정책 둘

참여 계획 — 분석은 대응이 있어야 의미가 있다

- 현재 참여 수준 → 목표 수준 → 간극을 메울 **행동** (unaware / resistant / neutral / supportive / leading)
- 서정필: "발주 포털은 환영, 데이터·단말은 저항" → 한 사람을 두 행으로. 행동은 **오정근을 통해**, 2026-08-14 이전

행동에 이름과 날짜가 없는 참여 계획은 계획이 아니다

3교시 핵심 정리

1. 착수의 첫 번째 일은 **이미 만들어진 BC의 숫자와 가정을 검증**하고 결함을 목록으로 만들어 스폰서에게 결정을 요구하는 것
2. **산출물은 PM의 책임, 활용·성과는 사업 오너의 책임**(ITO). 편익 오너는 **상설 조직의 실명**
3. 편익은 기술이 아니라 조직 변화에서 나온다(BDN) — P1이 성공해도 편익이 안 나올 경로가 착수 시점에 보여야 한다
4. 헌장은 계획서가 아니라 **권한 문서** — 제외 범위·예산 층·가정·PM 권한을 채우고, 스폰서가 결정할 빈칸을 남긴다
5. 3속성·7유형으로 보면 P1의 가장 위험한 이해관계자는 권력자가 아니라 **연합할 동기가 있는 Dependent들**

다음 교시는 바로 실습 ① — 워크북 §1·§2와 온담 정본을 준비한다

4교시 (90분) — 실습 ①: 온담 P1 비즈니스 케이스 요약 + 프로젝트 헌장

이 교시에서 하는 것

- **산출물 ① 비즈니스 케이스 요약** — 워크북 §1, 약 35분. P1 몫만 발라내고 각 숫자의 **분모와 책임자**를 확인한 두 쪽
- **산출물 ② 프로젝트 헌장** — 워크북 §2, 약 50분. 15개 항목 중 **목적·성공 기준·범위/제외·예산 층·가정/제약·PM 권한·우선순위·완료 기준**
- 진행: 과제 지시 → 작성 요령 → 흔한 오류 점검 → 완성 예시본과 대조
- 준비물: 워크북 §0.3 온담 한 페이지 요약, §1.4·§2.4 빈 템플릿, §1.5·§2.5 완성 예시본
- 3~7년차: 각 절의 **심화 과제**(자기 회사 프로젝트로 같은 문서)를 병행

예시본은 ”정답”이 아니라 ”판단의 흔적이 보이는 문서”다

산출물 ① 비즈니스 케이스 요약 — 과제 지시

- **과제**: 워크북 §1.4 빈 템플릿 9개 항목 중 **항목 2(전략적 배경) · 4(편익) · 6(재무 평가) · 9(편익 책임자)**를 온담 P1로 채우라
- ⇒ 어디에 쓰나: 항목 4 편익 표 → ② 헌장 항목 3 성공 기준의 인용 원본
- ▷ 어디서 찾나: 정본 §5.5 편익 표 · §3.3 예산 내역 · §2.4 이사회 승인 조건
- 나머지 항목은 §1.5 예시본을 읽고 확인
- 왜 PM이 다시 쓰는가: 승인 문서의 숫자를 PM이 검산하지 않으면 그 숫자는 나중에 **PM의 약속**이 된다 — 214억 안의 "물류 96억"은 P2 설비의 숫자
- BC는 게이트마다 갱신되는 살아 있는 문서 — 갱신 기준선이 없으면 중단 결정을 못 내리는 좀비

시간이 부족하면 항목 4(편익)와 9(책임자)만 — 이 둘이 헌장 성공 기준의 입력이다

항목 2 전략적 배경 — "왜 지금인가"

- 3~5문단, 문단마다 숫자 하나 이상. 현재 상태를 측정값으로(폐기율 3.9%), **분모**를 밝히고(취급원가 2,530억)
- 온담의 세 압력 — 기술 부채 한계 / IPO 시계 / 규제 시행일 + 두 번의 실패 이력. **do-nothing을 한 문단 이상**

항목 3 대안 검토 — 최소 셋 + 기각된 대안 하나

- ① 현행 유지 ② do-minimum(OS 마이그레이션 + 인터페이스 문서화, 약 18억) ③ 상용 리테일 패키지 — 기각 ④ 제안안 168억
- 기각 사유 한 줄이라도 반드시 — "가맹·B2B·직영 세 모델을 한 패키지가 못 다루고 SAP 병행 요건 미충족"

do-nothing = "OS 지원 종료 상태로 615개 매장 결제를 계속 처리한다"

작성 요령 ② — 편익 · 비용 · 재무 평가 · 편익 책임자 (항목 4~6, 9)

- **항목 4 편익** — 기준값·목표값·시점·금액·**산출 분모·측정 책임자**. P1 직접(43+37+38 = **118억**)과 P2 의존(물류 96억)을 **분리**
- **항목 5 비용** — 구축 8항목과 운영(연 27억 × 3년 = 81억) 구분, 3층(168.0 / 156.0 / 145.8) 정의, 5년 TCO 한 줄
- **항목 6 재무 평가** — 회수기간 약 3.4년 / NPV(8%, 5년) 약 +134억 / 민감도 70%: +16, 50%: −63 / **손익분기 편익 실현률 약 66%**
- **항목 9 편익 책임자** — 직책과 실명: 폐기율·결품률·인건비율 오정근 / 재고 정확도 한동석 / 검토 시점은 종료 후(M+12, G5)

PM은 한 명도 없다 — G5에 PM은 그 자리에 없다. 이 표의 서명이 현장 서명보다 어렵고, 그래서 더 중요하다

산출물 ① 흔한 오류 점검

- 원본 승인 문서(2025-12 이사회 부의안)를 적지 않아 요약본이 독립 문서처럼 돌아다닌다
- 솔루션을 배경으로("클라우드 POS가 필요하다") / 형용사만 있고 숫자가 없다("노후화가 심각하다")
- 제안안 하나만 적고 "대안 없음" / 214억을 그대로 옮기고 분모를 확인하지 않았다 / 측정 책임자 "추후 지정"
- 편익 100% 실현 전제로 IRR 40% / 할인율이 없다 / 리스크 칸에 "일정 지연" 같은 일반론
- 이사회 승인 조건 5개를 빠뜨렸다 / 다음 갱신 시점(G1 2026-04-30)이 없다

점검 질문 — 편익 표 모든 행에 분모와 실명이 있는가 / 손익분기 실현률을 한 문장으로 말할 수 있는가

산출물 ① 예시본 참조 — 워크북 §1.5~1.6

- 왜 P1 편익을 **118억**으로 한정했는가
- 왜 do-minimum을 G1까지 **폴백**으로 남겼는가 — 예산 삭감이 곧 중단이 된 2019년의 결말
- 왜 손익분기 **66%**를 굳이 계산했는가
- 왜 재고 정확도 분모 문제를 별도 항목으로 뺐는가

완성 예시 PDF: 템플릿/PM_Day1/01_비즈니스케이스요약_완성예시.pdf

산출물 ② 프로젝트 헌장 — 과제 지시

- **과제**: 워크북 §2.4 빈 템플릿 15개 항목 중 **2(목적) · 3(성공 기준) · 5(범위/제외) · 8(예산) · 9(가정/제약) · 12(거버넌스·PM 권한) · 13(우선순위) · 14(완료 기준)**. 나머지 7개는 §2.5 예시본으로 확인
- ⇒ 어디에 쓰나: 항목 5 범위 포함 다섯 → Day2 ⑥ WBS 레벨 2
- ▷ 어디서 찾나: 정본 §3.2 범위 · §3.3 예산 3층 · §3.5 제약 · §5.4 날짜 표
- 헌장이 답하는 질문은 여섯 개뿐: **왜 / 무엇이 성공 / 어디까지 / 누가 결정 / PM은 무엇을 혼자 결정 / 언제 끝**
- 없을 때 터지는 것: **범위 경계 분쟁**(가맹 단말 교체 비용) / **PM 권한의 공백**(전결 5억 vs 10.08억) / **성공 기준 부재**(2019 "중단"이 실패인지 손절인지 판정 불가)

가장 중요한 칸은 "무엇을 만드는가"가 아니라 "무엇을 만들지 않는가"와 "누가 무엇을 결정하는가"

작성 요령 ③ — 목적 · 성공 기준 · 범위/제외 (워크북 §2.3 항목 2·3·5)

- **항목 2 목적** — 3~5문장, 숫자 필수, 편익 문서 ID 인용. 오류: "플랫폼을 구축한다"(수단) / 프로그램 전체의 목적을 그대로(P1 ≠ ONE ONDAM)
- **항목 3 성공 기준** — 표: 지표 / 목표값 / **판정 시점** / **판정자**. 관리 성공(G4): +15영업일·+6% 이내, RTM 100%, 결함밀도 0.4건/FP, SAC 0건 / 프로젝트 성공(G5): §1 편익 표 인용
- **항목 5 범위** — 제외를 포함과 **같은 무게**로, 각 제외에 "그러면 누가 하는가". 제외에 **가맹점 단말 하드웨어 교체** 추가
- 경계 조건: 가맹 단말은 기존 HW에 SW 배포까지 / 3PL WMS 연동 명세는 작성하되 계약 변경 협상은 물류본부

오류 — "기타 부대 업무 일체": 수행사는 무한 범위로, 발주사는 무상 서비스로 읽는다

작성 요령 ④ — 예산 · 가정/제약 · PM 권한 · 우선순위 · 완료 기준 (항목 8·9·12·13·14)

- **8 예산** — 3층 표 + 컨틴전시(PM 10.2억, 단 5,000만 원 이상 단일 건은 CFO 결재)와 관리예비비(스폰서 12.0억) 구분
- **9 가정/제약** — 가정에 **확인 시점·책임자**(3PL 2026-06 한동석 / 부속서 2026-08-14 오정근 / 겸임 투입률 50% 박세연), 제약에 **출처**
- **12 PM 권한** — 허용범위 표 + 에스컬레이션 3단계 + **"PM은 이 범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다"** + 전결 충돌 처리
- **13 우선순위** — 고정 / 조정 가능 / 수용. **스폰서가 결정**. 예시본: 컷오버 창 고정, 원가 한도 내 고정, **범위(옴니채널 고도화)를 조정 변수로**
- **14 완료 기준** — 정상 종료(G4 SAC 0건, 판정 박준영·승인 정미란) + **조기 종료 조건**(손익분기 66% 미달 전망 / 컷오버 창 2회 이탈)

세 개를 다 고정하면 조정 변수는 품질뿐 = 결함을 운영으로 넘긴다는 뜻

산출물 ② 흔한 오류 점검 — 헌장의 여덟 가지 오류 + 넷

- 킥오프 발표 자료로 대체 / 목적 칸에 솔루션 / 제외 범위 비움 / 예산을 한 숫자로
- PM 권한을 "총괄"로 / 편익 목표를 PM 성공 기준에 / 가정을 안 적음 / 스폰서가 읽지 않은 헌장에 서명
- 승인자 칸에 "경영진"·"운영위원회" — 위원회는 서명하지 않는다
- 우선순위를 전부 "고정"으로 — 희망이지 우선순위가 아님 / 종료 조건이 없어 무한 하자보수
- Senior User 서명 없이 나중에 "우리는 동의한 적 없다"

점검 — PM이 스폰서에게 묻지 않고 결정할 수 있는 금액과 기간을 한 문장으로 말할 수 있는가

산출물 ② 예시본 참조 — 워크북 §2.5~2.6

- 왜 제외 범위에 **가맹점 단말 HW**를 굵게 / 왜 성공 기준을 **두 층**으로
- 왜 우선순위에서 **범위**를 조정 변수로 / 왜 **"초과가 예상되는 시점"**이라고 썼는가
- 왜 허용범위 10.08억과 전결 5억의 **충돌을 현장에** 적었는가
- 왜 조기 종료 조건에 **손실 확정 절차**까지 넣었는가

완성 예시 PDF: 템플릿/PM_Day1/02_프로젝트헌장_완성예시.pdf

4교시 정리 — 두 문서에서 반복된 규칙

1. **숫자에는 값·단위·출처·분모** — 214억이 아니라 "P1 직접 118억(43+37+38), 분모 취급원가 2,530억, 운영비 27억 미차감"
2. **사람은 부서명이 아니라 직책·실명**, 편익 책임자는 PM이 아니다 — G5에 PM은 그 자리에 없다
3. 헌장은 채워 넣는 문서가 아니라 **스폰서에게 결정을 요구하는 문서** — 우선순위·허용범위·편익 오너·미확정 가정
4. **PM이 통제하지 못하는 것을 문서로 남기는 것**(가정·제약·제외 범위)이 PM의 권한을 지키는 방법
5. BC의 66%와 헌장의 조기 종료 조건은 한 줄로 이어진다 — 오늘 쓴 것은 G1(2026-04-30)에 v1.0→v1.1로 확정되는 **초안**

5교시가 설명하는 것 — "방금 쓴 PM 권한 칸이 왜 그렇게 쓰기 어려웠는가"


5교시 (75분) — 거버넌스 · 권한 없는 PM · 프리모템 · 분야별 착수 노하우

이 교시에서 배우는 것

- 거버넌스 — 스폰서·운영위원회·PMO·PM의 권한 구조 [§3.4]: Manage by Exception과 허용범위 격자 / "권한 없는 PM"이 한국에서 왜 일반적이며 어떻게 일하는가
- 초기 리스크와 프리모템 [§3.5]: 착수 시점 리스크의 세 원천 / 계획 오류와 외부 시각 / Gary Klein의 프리모템
- 분야별 착수 노하우 — SI, 건설·EPC, 제조 NPD, 제약 [§3.6]
- 6교시 실습 ②(이해관계자 등록부·RACI·프리모템)의 이론 부분

4교시에서 헌장 항목 12를 쓰며 막혔던 지점 — "PM 권한을 무엇으로 채우나" — 이 §3.4의 출발점

거버넌스 — 조직도가 아니라 결정의 흐름

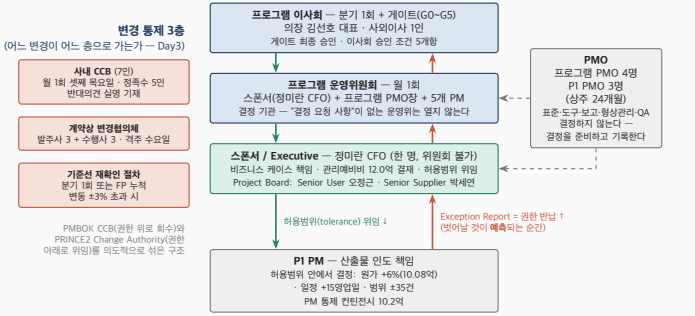

거버넌스는 조직도가 아니라 결정의 흐름이다 — 어떤 종류의 결정이 어디서 얼마 안에 내려지는가. 이 그림의 화살표(위임 ↓ / 예외 ↑)가 상자보다 중요하다. 검증 두 가지: ① 원가 허용범위 10.08억 vs 본부장 위임전결 한도 5억 — 사내 규정과 맞는가 ② 편익 −5%p 허용범위(≈10.7억) — Business Case의 편익 민감도와 맞는가

출처: 사례 문서 『하온담F&B홀딩스』 §4.1·§5.6과 PRINCE2 7의 Manage by Exception을 교재 3.4절에 따라 재구성.

그림 3-5. 온담 P1 거버넌스 — 결정의 흐름(위임↓ / 예외↑)과 변경 통제 3층

어떤 종류의 결정이 어디서 얼마 안에 내려지는지가 그려져야 한다 — 조직도 그리기가 아니다

거버넌스 구성 요소 — 원칙과 온담 P1

구성 요소	원칙	온담 P1
스폰서 (Executive)	자원을 대고 BC에 책임. **한 명**. 위원회는 스폰서가 될 수 없다	정미란 CFO — 프로그램 스폰서 겸임(P1 별도 스폰서 없음)
운영위원회	스폰서가 의장인 결정 기관. **"결정 요청 사항"이 없는 운영위는 열지 않는 편이 낫다**	프로그램 운영위(월 1회) + 프로그램 이사회(분기 + 게이트, 의장 김선호)
PMO	표준·도구·보고·형상관리·QA 지원. **PMO는 결정하지 않는다 — 결정을 준비하고 기록한다**	프로그램 PMO 4 + P1 PMO 3(상주 24개월, 12.6억) + P2 PMO 2
PM	산출물 인도, 허용범위 안에서 결정, 벗어나면 에스컬레이션	
변경 통제 기구	권한 회수(CCB)와 권한 위임(Change Authority)을 구분	**3층** — 사내 CCB(7인, 정족수 5, 반대의견 실명) / 변경협의체(3+3) / 기준선 재확인(분기 또는 FP ±3%)

PMO가 결정하기 시작하면 스폰서가 결정하지 않게 된다

Manage by Exception — 허용범위 격자 (온담 초안, 사례 §5.6)

팀 리더 · 수행사 PL　**P1 PM — 이 열 안에서는 묻지 않고 결정**　스폰서 · 프로그램 운영위

성과목표축 \ 계층	작업패키지 work package	프로젝트 (P1) project	프로그램 programme
원가 (cost)	+2%	**+6%** (10.08억)	+12%
일정 (time)	+5영업일	**+15영업일**	+30영업일
범위 (scope)	±1%	**±3%** (±35건)	±6%
품질 (quality)	결함밀도 0.13건/FP	**0.4건/FP**	0.8건/FP
리스크 (risk)	EMV 2.7억	**EMV 8억**	EMV 16억
편익 (benefits)	−1.7%p	**−5%p**	−10%p
안전·지속가능성	0	**0**	0

검증 ① 사내 규정과 맞는가
원가 허용범위 10.08억 > 본부장 위임전결 한도 5억 → 불일치. 현장에 적고 스폰서가 결정

검증 ② Business Case의 편익 민감도와 맞는가
편익 −5%p ≈ 2.4억의 약 10.7억이 사라져도 프로젝트 계층에서 처리된다는 뜻 — CFO "근거 없는 편익은 승인 않겠다" 상황에서 적절한가

허용범위를 전 프로젝트 공통 "±10%"로 박으면 격자는 장식이 된다 — 편익 민감도에서 역산한다

벗어날 것이 예측되면 → Exception Report로 권한을 오른쪽 계층에 반납

→ 스폰서에게 반납 (실제로 벗어난 후가 아니라 **예측되는 순간**)

→ 프로그램 이사회

출처: PRINCE2 7의 7 성과목표축 × 3 계층 허용범위 격자에 사례 문서 §5.6의 온담 허용범위 초안을 대입해 재구성.

그림 3-6. 허용범위 격자 7축 × 3계층 (온담 초안 수치)

- P1 PM은 원가 10.08억 · 일정 15영업일 · 범위 ±35건 안에서 **스폰서에게 묻지 않고 결정**한다
- 검증 ① **사내 규정** — 원가 10.08억은 본부장 위임전결 5억을 초과
- 검증 ② **BC 편익 민감도** — 편익 −5%p = 약 10.7억이 사라져도 프로젝트 계층에서 처리한다는 뜻

벗어날 것이 예측되는 순간(실제로 벗어난 후가 아니라) Exception Report

”권한 없는 PM”이 한국에서 왜 일반적인가

- 예산 집행권은 재경과 본부장에게, 인사권은 부서장에게, 계약 변경권은 구매·법무에게, 요구사항 확정권은 현업 임원에게 — PM에게 남는 것은 **일정표와 회의 소집권**
- 개인의 문제가 아니라 **구조의 문제** — 이유 셋
- ① **매트릭스 조직에서 기능 부서의 권한이 프로젝트의 권한보다 세다** — 임시조직에 권한을 주면 영구조직이 잃는다
- ② **위임전결규정이 직위 기준이지 역할 기준이 아니다** — ”본부장 5억”은 있어도 ”PM 10억”은 없다
- ③ **스폰서가 권한을 위임하지 않고 보고를 요구한다** — 허용범위가 없으니 모든 결정이 보고 대상

보고가 많으니 PM은 결정하는 사람이 아니라 보고하는 사람이 된다

권한 없는 PM이 일하는 세 가지 방법

- ① **허용범위를 문서로 획득한다** — "PM은 총괄한다"가 아니라 "PM은 원가 10.08억, 일정 15영업일, 범위 ±35건 안에서 결정한다"를 **스폰서 서명**으로
- ② **결정을 결정권자에게 가져간다 — 선택지 + 권고 + 기한을 붙여서** — 스폰서는 결정하거나 결정하지 않은 책임을 진다. 어느 쪽이든 **기록된다**
- ③ **에스컬레이션을 BATNA로 쓰지 않는다** — 한 번 쓰면 관계 자본이 소진되고, 임원이 PM 편을 들지 않으면 공개적으로 무너진다
- 영향력의 실체는 **상대의 BATNA** — 박세연이 인터페이스 분석에 시간을 내지 않으면 그가 잃는 것은 "우리 손으로 운영할 수 있는 시스템"이라는 그 자신의 목표

"권고는 (b). 결정 기한은 2026-06-30, 그 이후는 (a)만 남는다"

착수 시점의 리스크는 어디서 나오는가 — 세 원천

원천	질문	온담 P1
가정에서	헌장의 가정 각 항목 — "이 가정이 틀리면 무엇이 일어나는가"	"대성로지스가 준실시간 API에 합의한다"가 틀리면 → 센터 재고가 야간 배치로 남고 → 재고 정확도 98.5%가 구조적으로 불가능 → B-02·B-03·B-04가 흔들린다. **2022년에 정확히 이것이 일어났다**
구조에서	임시조직론·Engwall의 "이미 결정된 것들"	통제 밖 의존(P2, 3PL, 규제, 노조) / 과거 실패의 반복 패턴 / 이해관계자 연합 가능성 / **핵심 인물 의존**(박세연 — OD-POS 원 개발자 3명 중 재직 1명)
base rate에서	1교시 §1.2 reference class	정보화 사업 4건 중 2건 중단·축소 / IT 원가 초과의 멱함수 분포 — "이 프로젝트는 다르다"는 믿음에 대한 외부 시각

아직 WBS도 일정도 없다 — 착수 시점 리스크는 활동 단위가 아니라 가정·구조·base rate 단위

계획 오류(planning fallacy)와 외부 시각

- Kahneman & Tversky(1979): 사람들은 과제 완료 시간을 체계적으로 과소추정한다
- Buehler, Griffin & Ross(1994): **자기 과거 실적 정보를 주어도 예측이 개선되지 않는다**
- **내부 시각**: 세부 계획을 보고 "이렇게 하면 된다" / **외부 시각**: 유사 프로젝트들의 한 사례로 보고 "그 부류는 대개 이렇게 되었다"
- Lovallo & Kahneman(2003, HBR)이 경영 언어로, Flyvbjerg의 RCF가 절차로
- "17개월·156억이 맞는가"보다 먼저 — **"비슷한 회사가 비슷한 재구축을 했을 때 대개 얼마나 초과했는가"**

그 데이터가 없다면 — 대개 없다 — "데이터가 없다"는 사실 자체가 첫 번째 리스크

프리모템 — Gary Klein (2007, HBR, 2페이지)

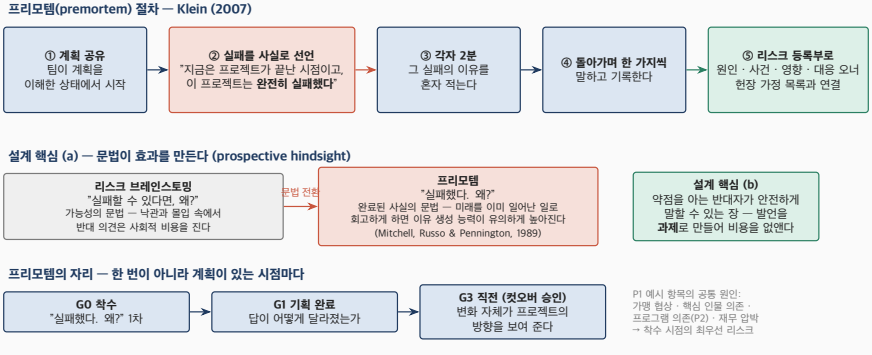


그림 3-7. 프리모템 절차와 "실패했다"의 문법 — prospective hindsight (Mitchell, Russo & Pennington, 1989)

"지금은 프로젝트가 끝난 시점이고, 완전히 실패했다. 각자 2분 동안 그 실패의 이유를 적으라"

P1에서 나올 법한 실패 이유 — 여러 항목이 같은 원인을 가리킨다

- 가맹 388점 중 140점이 새 POS 배포 거부, 두 시스템 병행
- G2 정본 결정이 박세연 한 사람에게 걸려 두 달 지연
- P2 41주로 물류 인터페이스 시험이 컷오버 후로
- CFO 148억 축소로 전환 용역 11.4억이 2027년으로, 리허설 3회→1회 / 수행사 대기 시간 변경대가 청구
- 오픈 첫 달 615개 매장 콜이 서비스데스크 11명에게, SAC 미충족으로 인수 거부

공통 원인(가맹 협상 · 핵심 인물 · 프로그램 의존 · 재무 압박)이 최우선 리스크

분야별 착수 노하우 ① — SI: 계약 이후에 착수하는 프로젝트

- 착수 시점에 이미 계약이 있다 — SI PM의 일은 헌장을 쓰는 것이 아니라 **계약 문서를 읽고 헌장으로 번역하는 것**
- ① **세 문서의 우선순위**: 계약서 > 과업지시서 > 제안서. 제안서는 **"단방향 확대 문서"** — "무상 3개월 안정화", "AI 자동 분류"가 그대로 과업이 된다
- ② **규모 기준선**: FP 12,400점 × 55만 원 = 68.2억. FP는 측정치가 아니라 **협상 인공물** — G1 "FP 기준선 확인서 서명"
- ③ **인터페이스 상대의 소유자**: 47본 중 문서 부재 13본, 3PL WMS, 은행·PG 7본 — **"누가 상대 쪽을 준비하는가"의 이름**
- **공공 vs 민간**: 과업심의위원회·감리 의무·분리발주는 **공공 발주에만**. 온담 같은 민간에는 없다 → 계약서로 직접 만든다

SI는 컷오버 주말에 죽지 않는다 — 진짜 사인은 데이터 정제 착수 지연과 인터페이스 상대 미확정

건설·EPC — 발주 방식과 계약 유형이 리스크를 결정

- **설계 성숙도**: AACE Class 5 ~ 1. 어느 Class에서 계약하느냐가 신뢰 구간을 정한다
- Class 4 이하에서 경쟁입찰 **LSTK**는 리스크 이전이 아니라 프리미엄·변경 청구·클레임으로 되돌아온다 — 온담 P2가 정확히 이 검토 대상
- **기록 규율**(SCL Protocol): 지연 청구의 승패는 **사건 당시 생성된 기록**

제조 NPD — Stage-Gate의 Gate 1~2

- **게이트는 회의가 아니라 투자 결정** — Go / Kill / Hold / Recycle. 자원 약정 없는 게이트 = "이빨 없는 게이트"
- **Must-meet / Should-meet** 이원 기준 — "3.8점이니 통과"는 규제 불가 항목이 점수에 가려진 것
- **Kill이 0건인 게이트 프로세스는 고장난 것**

온담에 던질 질문 — G1에서 P1을 중단할 수 있는가, 기준은, 중단 결정자는 착수 결정자와 다른가

분야별 착수 노하우 ③ — 제약·규제: 규제 게이트의 비가역성

- 착수는 규제 경로 결정에서 시작: IND → 임상 → NDA / 510(k) · De Novo · PMA / SW 의료기기는 IEC 62304 등급. 경로가 정해지면 게이트는 협상 불가
- (a) **제출 순간 문서 세트가 잠긴다** (b) **심사 시계는 제출자가 통제 못 한다** (c) **추가자료 요구는 시계를 멈추고 재개 시점을 상대가 정한다** → float가 성립하지 않는다
- 착수 오류: **추가자료 라운드 0회로 가정**한 뒤 출시일 공표. 처방: 라운드 수를 같은 경로의 과거 제출 건(reference class)에서 분포로
- "규제가 애자일을 막는다"는 통념은 틀렸다 — GAMP 5 2판, FDA CSA. 개발 리듬과 산출물 베이스라인을 분리
- 온담 P4: 개인정보 보호법 개정 대응(2026-09-11), 전자금융업 등록(심사 2027-03-31), ISMS-P(2027-06)

최영주: "시행일은 협상 대상이 아니다" — 규제 해석을 착수 시점에 서면으로 받아 두라

네 분야가 착수에서 공유하는 네 질문

1. **무엇이 이미 결정되어 있는가** — 계약, 설계 성숙도, 규제 경로, 게이트 기준
2. **어느 결정이 되돌릴 수 없는가** — FP 기준선, 설비 발주, 금형, 규제 제출
3. **누가 그 결정을 소유하는가**
4. **그것을 문서로 남겼는가**

헌장은 이 네 질문의 답을 적는 곳이다

5교시 핵심 정리

1. 거버넌스는 조직도가 아니라 **결정의 흐름**. 허용범위 격자(7축 × 3계층)가 PM이 권한을 얻는 유일한 표준 근거 경로 — 전결 규정과 편익 민감도 양쪽으로 검증
2. 권한 없는 PM은 구조의 문제. 처방 셋 — **허용범위를 서명으로 획득 / 선택지·권고·기한과 함께 결정을 가져간다 / 에스컬레이션을 BATNA로 쓰지 않는다**
3. 착수 시점 리스크는 **가정·구조·base rate**에서 나온다. 자기 과거 실적을 알아도 예측은 개선되지 않는다 → outside view
4. 프리모템(Klein, 2007)은 **"실패했다. 왜"**의 문법으로 반대자의 발언을 과제로 만든다. 게이트마다 반복하고 헌장·리스크 등록부에 연결
5. SI는 **계약 이후 착수** / EPC는 **설계 성숙도 × 계약 유형** / NPD는 **kill 0건이면 고장** / 제약은 **규제 게이트의 비가역성**

6교시는 바로 실습 ② — 4교시에 쓴 헌장 초안을 꺼내 놓는다. §3~5는 헌장을 고치는 문서들이다

6교시 (75분) — 실습 ②: 이해관계자 등록부 · 거버넌스·RACI · 프리모템

이 교시에서 하는 것

- **산출물 ③ 이해관계자 등록부와 현저성 분석** — 워크북 §3, 약 25분
- **산출물 ④ 거버넌스 구조와 RACI 초안** — 워크북 §4, 약 20분
- **산출물 ⑤ 프리모템 기록과 초기 리스크 목록** — 워크북 §5, 약 25분. 조별로 실제로 실시한다
- 세 문서는 4교시 헌장을 **고치는** 문서 — 등록부가 항목 11을, RACI가 항목 12를, 프리모템이 항목 9·10을 되먹인다
- 준비물: 워크북 §3.4·§4.4·§5.4 빈 템플릿, §3.5·§4.5·§5.5 완성 예시본, 4교시 헌장 초안

75분에 세 산출물 — 각 산출물은 핵심 항목만 채우고 나머지는 예시본 대조와 사후 과제

산출물 ③ 이해관계자 등록부 — 과제 지시

- **과제**: 워크북 §3.4 템플릿으로 8명 등록 — **정미란·오정근·박세연·한동석·서정필·김미르·최영주·박준영**
- ⇒ 어디에 쓰나: 항목 6 관계 소유자 → ④ RACI 그 행의 A
- ▷ 어디서 찾나: 정본 §4.2 등장인물 표 · §4.3 이음새 · §6.1~6.4 긴장
- 각 행에 항목 3(기대·우려·KPI), 4(P/L/U 3속성과 7유형), 5(태도 현재→목표), 6(관여 전략·**관계 소유자**). 그다음 **현저성 분석 요약표**
- 등록부의 가치는 명단이 아니라 **분석 열**에 있다 — 어떤 힘, 쓸 정당성, 지금 움직이려 하는가. 그리고 그 셋은 **바뀐다**
- 없을 때 터지는 것: **보이지 않던 사람이 결정적 순간에 나타난다**(김미르) / **같은 직책을 같은 방식으로 대한다**(오정근과 한동석)

"요구할 정당성은 없지만 멈출 힘이 있는 사람"을 찾아 적는 것이 등록부의 절반

작성 요령 ⑤ — 3속성 판정 · 태도 · 관계 소유자 (워크북 §3.3 항목 3~6)

- **항목 3 기대·우려** — **그 사람의 말로**. 박세연의 우려: 벤더 종속, 그리고 **자신이 만든 OD-POS와 문서 없는 13본이 "실패"로 서술되는 것** — 공식 입장에 없지만 등록부에는 있어야
- **항목 4 3속성·유형** — **판정 시점(G0)**을 적고 바뀔 시점과 방향을 비고에. 서정필 L+U 의존 → 2026-08 협상에서 거부권이 실질 권력 → 확정 / **김미르 P+U 위험**
- **항목 5 태도** — 무인지/저항/중립/지지/주도, "현재 → 목표". **저항은 정보다** — 오정근의 저항은 2019년의 경험
- **항목 6 관여 전략·관계 소유자** — 외부 협상 상대의 소유자는 PM이 아니라 소관 임원: 서정필 → **오정근** / 김미르 → **한동석** / 윤태호 → P1 PM

오류 — 직급으로 권력 판정(나영선의 P1 권력은 CCB 표 하나) / 긴급성 무시 / 한 번 판정하고 갱신 안 함

산출물 ③ 흔한 오류 점검

- 부서명만 적고 사람을 안 적었다(”영업본부”) — 부서는 우려를 갖지 않는다 / 임원만 적고 실무 접점자(구매팀장, 재경팀장, 지역매니저)를 뺐다
- ”영향받는 자”(매장 직원, 물류 현장)를 뺐다 — 요구하지 않지만 결과를 매일 겪는다
- PM의 추측을 그 사람의 기대로 / 우려를 안 적음 / 모두에게 ”프로젝트 성공”
- 모두 ”지지” / 목표를 모두 ”주도” / 저항을 개인의 결함으로
- 전략 칸에 ”정기 보고”만 / 관계 소유자를 안 적어 PM이 노조 협상까지 / 착수 시 한 번 쓰고 끝

점검 — 부서명만 있는 행이 있는가 / 관계 소유자가 전부 PM인가 / ”우려” 칸이 ”기대” 칸과 다른가

산출물 ③ 예시본 참조 — 워크북 §3.5~3.6 (25행 + 요약표 + 속성 변화 예측)

- 왜 김미르를 **"위험"**으로 판정했는가 — 정당한 경로가 없는 권력은 비공식 경로로 행사된다. 대응은 설득이 아니라 **정당성 경로를 만들어 주는 것**
- 왜 박세연의 "우려" 칸에 공식 입장에 없는 것을 적었는가
- 왜 관계 소유자가 PM이 아닌 행이 열 개 가까이 되는가
- 왜 사모펀드와 규제기관처럼 접촉하지 않는 이해관계자를 넣었는가 — 등록부는 접촉 명단이 아니라 **힘의 지도**
- 왜 정하늘 감리원의 목표 태도가 중립→중립인가 — 감리는 독립성이 가치

완성 예시 PDF: 템플릿/PM_Day1/03_이해관계자등록부_완성예시.pdf

산출물 ④ 거버넌스 구조와 RACI — 과제 지시 + 작성 요령

- **과제**: 워크북 §4.4 템플릿의 **항목 2(3역할과 핵심 직위)**와 **항목 5(RACI)** 10행. 항목 1·3·4는 §4.5 예시본으로 확인
- ⇒ 어디에 쓰나: 항목 5 RACI 예비비 행 → Day2 ⑨ 예비비 결재선
- ▷ 어디서 찾나: 정본 §4.1 거버넌스 구조 · §3.5 전결 한도 · §5.6 허용범위 초안
- **RACI 규칙 셋**: 행마다 A는 정확히 한 명 / R은 여럿 가능하나 조정자 필요 / C가 많으면 느려지고 I가 많으면 아무도 안 읽는다. **행은 활동이 아니라 결정과 산출물**
- **항목 2 3역할** — Executive 정미란 / Senior User 오정근 / Senior Supplier **박세연**(수행사 이재현은 그 아래의 공급자)
- **항목 5 RACI** — 결정 행과 산출물 행 구분. **통제 밖 결정(3PL 협상, 가맹 배포 범위, P2 규격)의 A가 P1 밖의 임원임을 명시**
- "컨틴전시 집행" 행: **A = P1 PM, C = 재경팀장, I = 정미란·윤태호** — 2020 감사 지적에 대한 답은 사전 승인이 아니라 **사후 투명성**

한국 SI에서 가장 흔한 혼동 — 수행사 PM을 Senior Supplier로 적어 발주사 IT의 기술 승인 권한이 사라지는 것

산출물 ④ 흔한 오류 점검

- 회의체 이름만 적고 권한을 안 적음 / 정족수·반대의견 기록 방식이 없어 "전원 찬성"만 남음 / 사내 CCB와 변경협의체의 선후 관계를 안 적음
- 경로는 있는데 시한이 없다 / "필요 시 보고"(필요는 항상 사후에 판정된다) / 수행사의 에스컬레이션 경로를 뺐다
- 모든 프로젝트에 같은 ±10% — 허용범위는 BC 편익 민감도(손익분기 66%)에서 역산 / 작업패키지 계층을 비워 수행사에 재량이 없다
- **A가 둘 이상인 행(공동 책임 = 무책임)** / PM이 모든 행의 A / 활동("주간 회의")을 행으로
- 위원회와 개인이 섞인 열에서 위원회 안의 누가 A인지 불명확

점검 — 모든 행에 A가 정확히 한 명인가 / 확인하지 않은 A는 A가 아니다

- **왜 P1 PM이 A인 행이 26개 중 8개뿐인가** — 착수·기획 결정 26개 중 18개의 최종 책임은 PM 밖에 있다(3PL 한동석, 가맹 배포 오정근, 아키텍처 박세연, 규제 해석 최영주, 기준선 이사회)
- 왜 컨틴전시 집행의 A를 PM으로 두고 CCB를 I로
- 왜 가맹 SW 배포 범위(A 오정근)에 CCB·정미란을 C로 — C를 빼면 배포 범위가 조용히 줄고 P1은 G2에서 발견
- 왜 CCB와 변경협의체 순서를 문장으로 못박았는가
- 왜 박세연의 이해 충돌(교체 대상 시스템의 설계자가 아키텍처 승인자)을 표에 기록했는가 — 정본 판정에서 그는 R이지 A가 아니고 감리 확인 병행

이 표를 스폰서에게 보여 주는 이유 — A인 사람들이 자기가 A라는 것을 알게 하기 위해서

산출물 ⑤ 프리모템 — 과제 지시 (조별로 실제로 실시한다)

- **과제**: 조별로 프리모템을 실시하고 §5.4 템플릿의 항목 2(실패 선언문) · 3(원문) · 4(군집화) · 5(초기 리스크 3행) · 6(즉시 조치)
- ⇒ 어디에 쓰나: 항목 5 초기 리스크 → Day2 ⑩ 등록부 정량화의 대상
- ▷ 어디서 찾나: 정본 §6.5 두 번의 실패 · §6.4 통제 밖의 것 · §3.5 제약
- ① 진행자가 **실패 선언문**을 읽는다 — 과거형, 날짜·숫자 포함. F1 "2027-08, 컷오버 창을 놓쳐 IPO 예비심사 서류에 '구축 중'으로 기재되었다"
- ② 각자 **2분간 개별 작성** — "무엇이 일어났다"의 과거형. "~할 것 같다"는 다시 쓰게 한다
- ③ 돌아가며 한 가지씩, **편집 없이** 번호를 붙여 기록. 중복도 그대로(중복 횟수가 우선순위 정보)
- ④ 원인별로 군집화, 언급 수 + 1인 3표로 순위. 군집명은 범주("일정")가 아니라 **원인**("가맹 부속서 협상 지연")

브레인스토밍은 "요구사항 변경"을, 프리모템은 "협의회가 2026-08 부속서 서명을 거부했고 우리는 이미 가맹 SW를 개발 중이었다"를 낸다

작성 요령 ⑥ — 리스크 서술 3부 · 소유자 · 즉시 조치 (워크북 §5.3 항목 5~6)

- **항목 5** — 군집을 리스크 서술로: **원인** → **사건** → **영향**. 원인은 **현재 사실**, 사건은 **불확실한 미래**, 영향은 **목표에의 결과**. **기회 1~2건 포함**
- R-01: "P2 벤더가 리드타임 34→41주 가능성을 통지한 상태다 → MC가 2027-02-12를 넘긴다 → 물류 통합시험을 G3 전에 못 하고 컷오버를 분리하거나 창을 놓친다"
- 원인 → **트리거**, 사건 → **근접성**, 영향 → **대응 방향**. Day2 정량화는 확률을 사건에, 금액을 영향에
- 소유자는 원인에 가장 가까이 있고 대응 자원을 가진 사람 — **PM이 아닌 경우가 많다**. 예시본 13개 위협 중 PM 소유는 3개
- **항목 6 즉시 조치** — 리스크 대응 계획을 기다리지 않고 **지금 바꿔야 하는 것**: 헌장 가정·제외 범위 수정, 등록부 추가, RACI 행 추가. 각 줄에 "어느 문서의 어느 항목을" + 담당·기한

오류 — 원인과 사건을 섞음("P2 지연 리스크") / 이미 발생한 이슈를 리스크로 / 기회를 안 적음

- 실패 선언문을 조건문으로(”만약 ~한다면”) — 그러면 브레인스토밍 / 실패의 모습이 추상적(”잘 안 됐다”) / 한 종류의 실패만 제시
- PM 혼자 쓴다(PM의 걱정 목록) / 임원이 참석해 발언 위축 / 운영·현업이 없어 기술 리스크만
- 수집 단계에서 토론이 시작되어 사유가 걸러진다 / PM이 ”그건 이미 대응 중”이라며 삭제 / 원문을 곧바로 범주로 뭉갬
- 군집을 너무 크게(”외부 요인”) / 득표만 보고 언급 수 적은 치명적 사유(원 개발자 1명 이탈)를 탈락시킴
- 리스크 목록이 일반론 / 소유자 전부 PM / 이미 발생한 이슈를 리스크로 / 결과를 헌장에 연결 안 함


점검 — 소유자 열에서 PM이 절반을 넘는가: 넘는다면 통제 밖 리스크를 PM이 떠안고 있거나 아직 못 찾은 것

산출물 ⑤ 예시본 참조 — 워크북 §5.5~5.6

- 예시본 구성: 세션 정보, 실패 선언문 F1~F3, 원문 15개, 군집 12개, 리스크 R-01~R-13 + O-01·O-02, 즉시 조치 7건
- 왜 실패 선언문을 **세 개**로 — F1만 주면 사유가 전부 일정으로 쏠린다. F2(제때 끝나도 편익 실패), F3(통제 밖의 것이 결합해 중단) = Flyvbjerg의 세 성공은 별개
- 왜 리스크 서술을 세 부분으로 강제했는가 / 왜 소유자에 PM이 세 번밖에 없는가(RACI 8/26과 같은 그림)
- 왜 기회를 넣었는가 / 왜 "즉시 조치"에서 헌장을 고쳤는가

완성 예시 PDF: 템플릿/PM_Day1/05_프리모템리스크_완성예시.pdf

다섯 문서의 상호 관계 — 순서대로 쓰지만 순서대로 완성되지 않는다

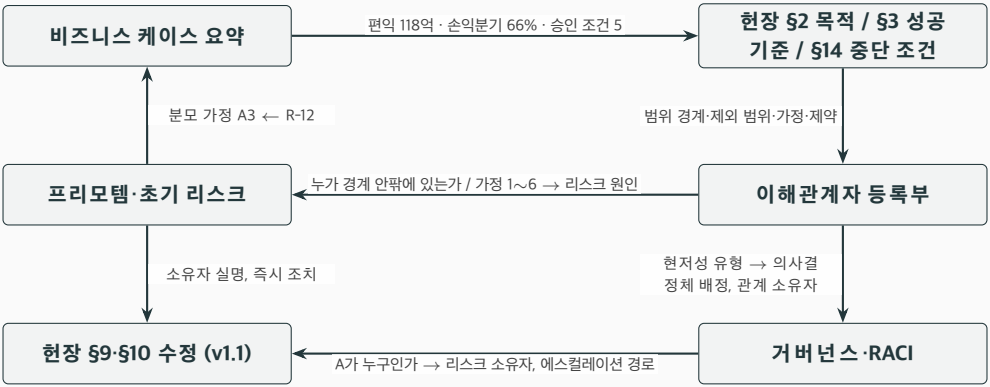

따로 쓰면 각 문서는 다른 문서가 이미 의심한 것을 계속 참이라고 말한다

6교시 정리 — 세 문서에서 반복된 규칙

1. **사람은 부서명이 아니라 직책·실명**이며, 책임(관계 소유자, RACI의 A, 리스크 소유자)은 대부분 **PM 밖**에 있다 — 관계 소유자 10행, A 8/26, 리스크 소유자 3/13
2. **PM이 통제하지 못하는 것을 문서로 남기는 것**이 PM의 권한을 지키는 방법
3. 가장 위험한 이해관계자는 권력자가 아니라 **정당성 경로가 없는 권력(위험)**과 **연합할 동기가 있는 의존** — 대응은 정당성 경로 제공과 후원자 연결
4. 프리모템은 **"실패했다. 왜"**의 문법이고, 완료 조건은 리스크 목록이 아니라 **헌장·등록부·RACI의 수정**
5. Day2로: 헌장 §5·§6 → WBS / §4·§13 → RTM·MoSCoW / §7·§9 → 일정 기준선 / BC §5·헌장 §8 → 원가 기준선 / 리스크 13+2건·허용범위·66% → 정량화

"내가 통제하지 못하는 것이 내 일정을 결정한다는 사실을 문서로 남기지 않은 PM은 지연이 발생했을 때 설명할 근거가 없다"


마무리 (20분) — 학술 배경 깊이 읽기 · 읽을 자료 · Day2 예고

이 블록에서 배우는 것

- 오늘 인용한 학술 문헌 네 갈래를 **왜 그런가 / 언제 틀리는가**의 관점에서 다시 본다 [교재 제4장]
- Rethinking Project Management의 다섯 방향 / Morris의 front-end / Flyvbjerg의 착각과 기만 / Staw의 몰입 상승
- 읽을 자료 — 필수 · 30일 · 90일 · 참고 [제5장]
- 오늘 만든 산출물 다섯 가지와 사후 읽기 과제
- Day2 예고 — 계획: 범위·일정·원가 기준선

표준이 "이렇게 하라"고만 말하는 지점에서 학술 문헌은 "왜"와 "언제 틀리는가"를 말한다 — 그것을 아는 사람만이 테일러링할 수 있다

Rethinking Project Management (2006) — 다섯 방향이 이 교재의 뼈대다

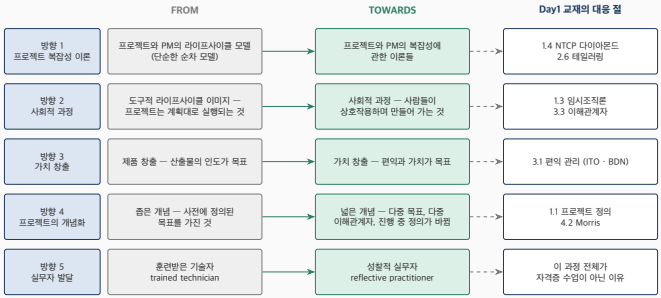

출처: Winter, Smith, Morris & Cicmil (2006), Directions for future research in project management, IJPM 24(8), Table 1을 바탕으로 재구성.

그림 4-1. 다섯 방향 FROM → TOWARDS + Day1 대응 절 (Winter, Smith, Morris & Cicmil, IJPM 24(8))

표준 변경을 뉴스가 아니라 사조로 — 7판은 이 논문의 15년 늦은 반영, 8판은 학술과 실무의 재타협

Morris — ”project management”에서 ”the management of projects”로

- 전자는 실행 통제(계획·감시·변경 통제), 후자는 프로젝트가 정의되는 **앞단(front-end)**, 기술, 상업, 정치까지 — 성패는 대부분 앞단에서 결정되는데 **BOK는 실행만 다룬다**
- **Samset & Volden(2016)의 역설**: **정보의 가치가 가장 큰 시점에 예산·권한·데이터가 가장 적다**
- Flyvbjerg의 break-fix model — 앞단이 부실하면 실행에서 반복적 파손과 수리, 그 수리 비용이 원가 초과의 실체
- 한국 조직에서 PM은 품의서 결재 뒤에 지명된다 — 그래도 둘은 할 수 있다: ① 앞단의 결정을 목록화해 가정·리스크를 헌장에 ② 종료 보고서에 ”앞단의 X가 실행 중 Y의 원인”을 기록
- 오독: front-end를 ”기획 문서 강화”로 — 요점은 문서량이 아니라 의사결정 권한과 **대안 유지** / ”착수 지연”으로 — 처방은 think slow, **act fast**


”착수 시점에 잘못 적힌 것은 계획 시점에 고쳐지지 않는다” — 오늘 헌장의 가정 목록을 길게 쓰라고 한 이유

Flyvbjerg — 착각(delusion)과 기만(deception), 그리고 think slow, act fast

- Flyvbjerg, Garbuio & Lovallo(2009): **Delusion** — 낙관 편향·계획 오류 → 처방은 outside view·RCF / **Deception** — 전략적 왜곡 → 처방은 **인센티브·책임·리스크 자본 구조의 설계**
- 2021 PMJ 「Top Ten Behavioral Biases」 1위는 **strategic misrepresentation** — 편향 교육으로 정치 문제를 풀려는 헛수고
- 「Survival of the Unfittest」 — 선정되는 것은 **서류상 가장 좋아 보이는 프로젝트** = 원가 최소·편익 최대로 추정한 프로젝트
- 온담 물류 96억의 분모 부재 — 착각인가 기만인가? **알 수 없고 알 필요도 없다. 처방이 같다** — 분모·측정 방법·오너 실명 없는 항목은 합계에서 제외
- **Think slow, act fast**(2023) — 학습곡선은 **반복 가능한 동일 단위**에서: 매장 배포는 모듈화(파일럿 12개점→확대), 전환 7.4TB·컷오버 34시간은 bespoke → 리스크 집중

CFO의 "근거 없는 항목은 승인 안 함"이 정확히 Flyvbjerg의 제도 처방이다

Staw — 몰입의 상승(escalation of commitment)과 결정자의 분리

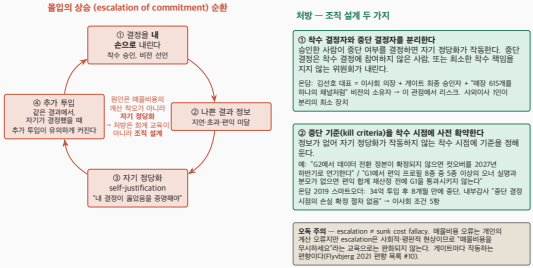

출처: Staw (1976), Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action, Organizational Behavior and Human Performance 16(1)를 바탕으로 재구성.

그림 4-2. 몰입의 상승 순환과 두 가지 조직 설계 처방

- Staw(1976): **같은 나쁜 결과에서, 그 결정을 자기가 내렸을 때 추가 투입이 유의하게 커진다** — 원인은 **자기 정당화**
- 처방 ① **착수 결정자와 중단 결정자를 분리** — 김선호 대표가 의장·게이트 승인자·비전 소유자. 사외이사 1인이 최소 장치
- 처방 ② **중단 기준(kill criteria)을 착수 시점에 사전 확약** — 이사회 조건 5항의 핵심

escalation은 매몰비용 계산 착오가 아니라 사회적·평판적 현상 — 게이트마다 작동한다

필수 (과정 전, 총 90분) — 사례 회사 문서 §1~3·§5 / Klein(2007) 2페이지 / 교재 §2.1 연표 ·§2.2 표 / Cooke-Davies(2002) 6페이지

30일 안에	왜
Flyvbjerg & Gardner, 『프로젝트 설계자』(2024)	"우리 회사 base rate은 어디서 구하나"로 남은 질문. 8시간
Winter et al.(2006), IJPM 24(8)	다섯 방향 — 표준 변경을 사조로
Lundin & Söderholm(1995) / Engwall(2003)	4T·4행위 / 착수의 진짜 일이 "이미 결정된 것의 목록화"인 이유
Zwikael & Smyrk(2011) ITO 장	워크북 편익 프로필 "오너 실명" 칸의 이론 원전
Eveleens & Verhoef(2010) 7페이지	제안서에서 CHAOS 수치를 빼야 하는 이유를 데이터로
Mitchell, Agle & Wood(1997) 7유형 정의 절	워크북 §3 분류 근거

읽지 않아도 되는 것 — CHAOS 원문 / Stacey matrix 2차 자료 / "PMBOK 7판 요약" 류 시중 교재(현행은 8판)

오늘 만든 산출물 다섯 가지

#	산출물	워크북	PRINCE2 7 대응	상태
①	비즈니스 케이스 요약	§1	Outline Business Case (Project Brief 내)	v0.9 — G1(2026-04-30)에 v1.0 확정
②	프로젝트 헌장	§2	Project Brief → PID(핵심부)	v1.0 — 프리모템 반영 후 v1.1
③	이해관계자 등록부 + 현저성 분석	§3	Communication management approach의 분석부	G0 판정 — G1·2026-08·G2·G3 갱신
④	거버넌스 구조 + RACI 초안	§4	PM team structure, Role descriptions	허용범위 3층은 Day2 확정
⑤	프리모템 기록 + 초기 리스크 목록	§5	Risk register(초기), Risk management approach(초안)	13+2건 정성 — Day2에서 확률·영향·EMV

- 다섯 문서 모두 **"결정되지 않은 것을 결정하는 문서"** — Day2 이후의 문서는 Day1에서 결정된 것을 분해하고 측정한다

헌장의 한 줄이 모호하면 WBS 열 개가 모호해진다 — 완성하지 못한 항목은 예시본과 대조해 채우고 내일 가져오라

사후 읽기 과제 (Day2까지)

읽기 (총 1시간 안)

- Klein(2007) 「Performing a Project Premortem」 2페이지 — 왜 "실패했다"인지 원문에서
- Cooke-Davies(2002) 6페이지 — 헌장 항목 3의 두 층이 왜 분리되어야 하는지
- 교재 §3.2 "항목별 의미"와 §3.4 "권한 없는 PM" — 오늘 쓴 헌장 항목 12를 다시 읽으며

쓰기 (심화 과제, 3~7년차 — 하나만)

- §1.7 최근 승인 문서의 편익 표를 항목 4 형식으로 — 분모 없는 항목·부서명 책임자·남의 편익의 개수
- §2.7 자기 회사 헌장에 **항목 12와 14**가 없다면 그 둘만 써서 스폰서에게 보여 줄 초안
- §4.7 운영위 명단에 3역할 배정 — 배정 안 되는 인물 수와 빈 역할
- §5.7 실패 선언문 세 개(일정·편익·중단), 각 5개 사유 — 현재 등록부에 없는 것의 개수

생각해 볼 질문 — 제1장 3 / 제2장 3 / 제3장 1 중 하나씩 골라 답을 적어 오라. Day2 첫 10분에 두세 명이 말한다

Day2 예고 — 계획: 범위 · 일정 · 원가 기준선

Day2 산출물	Day1에서 받는 입력
⑥ 범위 기술서와 WBS	헌장 §5 범위, §6 산출물 — 포함 5개 산출물이 WBS 레벨 2. **PBS 노드는 명사**
⑦ 요구사항 추적표(RTM) 골격	헌장 §4 상위 요구사항(요구 제공자), §13 우선순위 → MoSCoW
⑧ 일정 기준선	헌장 §7 마일스톤(외부 고정), §9 제약 → 컷오버·규제에서 역산한 주공정, G3 합류 버퍼 15영업일
⑨ 원가 기준선과 예비비 구조	BC §5·3층 예산, 헌장 §8, RACI 19·20행 → 145.8 / 컨틴전시 10.2 / 관리예비비 12.0. R-04 시나리오별 축소안
⑩ 리스크 등록부 정량화 + 허용범위 격자	초기 리스크 13+2건, 허용범위 초안, 손익분기 66% → 확률·영향·EMV, EMV 합계 vs 8억, 편익 −5%p의 타당성 역산

- 다시 만나는 Day1 개념: **RCF / 멱함수 분포 / 되돌림 비용 / Product-Based Planning / 허용범위 격자**

Day3 실행·통제(3층 변경 통제의 비용, Kreiner의 표류 역설) · Day4 종료·이관(판본이 바뀌어도 살아남는 산출물, ITIL)
